

RELATÓRIO SEMANAL

31.Jan.22

VISÃO EXECUTIVA

FASES 1.1 E 1.2

31/Jan/22

		Acumulado dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	
INFRA	GIRED (Infra) - Fase 1.1 + 1.2	204	11			215
	Programado	204	21	0	0	225
	Pendência Pós TA Assinado (PPTA)	5	0	0	0	5
	Realizado (Infra)	196	14	0	0	210
RF	GIRED (RF) - Fase 1.1 + 1.2	24	35	92	32	183
	Programado	25	35	92	55	207
	Pendência Pós TA Assinado (PPTA)	0	0	4	1	5
	Realizado (RF)	25	16	0	0	41

	INFRA				RF				TOTAL
	Realizado	Programada	PPTA	Com pendência	Realizado	Programadas	PPTA	Pendência ou sem L20	
CE	47	1	0	0	20	25	0	3	48
PI	16	0	0	1	6	10	0	1	17
RN	27	2	0	3	11	18	0	3	32
PB	69	6	1	19	4	65	1	25	94
MA	51	6	4	10	0	48	4	19	67
TOTAL	210	15	5	33	41	166	5	51	258

Nota: a programação de RF não considera o status dos canais da TV Câmara.

VISÃO EXECUTIVA

FASES 1.3 E 1.4 – INFRAESTRUTURA

31/Jan/22

		Acumulado Dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total
Municípios com entidade elegível qualificada	Previsto	431	221	140											792
	Real	574	175												749
Fase 1.3	Previsto	281	41												322
	Real	311	1												312
Fase 1.4	Previsto	150	180	140											470
	Real	263	174												437
T.A. assinado	Previsto	200	220	232	140										792
	Real	420	252												672
Fase 1.3	Previsto	200	70	52											322
	Real	275	29												304
Fase 1.4	Previsto	0	150	180	140										470
	Real	145	223												368
Município com infra programável (TA-A & s/ P1-P6 & s/P2-P5 se especial)	Previsto	150	50	120	217	205	50								792
	Real	243	387												630
Fase 1.3	Previsto	150	50	70	52										322
	Real	243	38												281
Fase 1.4	Previsto	0	0	50	165	205	50								470
	Real	0	349												349
Infra concluída (TA + premissas)	Previsto				100	140	140	140	140	140	140	140	160	140	1.380
	Real														
Fase 1.3	Previsto				60	90	90	90							330
	Real														
Fase 1.4	Previsto				40	50	50	50	50	50	50	50	50		440
	Real														

		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total
Todos os canais dos municípios em TV-C2 (municípios com infra planejada para conclusão)	Previsto		100	140	140	140	50	50	50	50	50			770
	Real	0												0
Fase 1.3	Previsto		60	90	90	90								330
	Real	0												0
Fase 1.4	Previsto		40	50	50	50	50	50	50	50	50			440
	Real	0												0
Todos os canais dos municípios em TV-L20 (municípios com infra concluída)	Previsto			100	140	140	140	50	50	50	50	50		770
	Real	0												0
Fase 1.3	Previsto			60	90	90	90							330
	Real	0												0
Fase 1.4	Previsto			40	50	50	50	50	50	50	50	50		440
	Real	0												0
Entrega (Infra + RF)	Previsto				100	140	140	140	50	50	50	50	50	770
	Real	0												0
Fase 1.3	Previsto				60	90	90	90						330
	Real	0												0
Fase 1.4	Previsto				40	50	50	50	50	50	50	50	50	440
	Real	0												0

ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

31/Jan/22

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

CEARÁ

48 municípios

INFRA			
Realizado	Programada	PPTA	Com pendência
47	1	0	0

RF			
Realizado	Programadas	PPTA	Pendência ou sem L20
20	25	0	3

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Abaiara	Realizado	11-nov-21	Sim	Realizado	2-dez-21
Aiuaba	Realizado	31-out-21	Sim	Realizado	6-dez-21
Alcântaras	Realizado	24-out-21	Sim	--	5-fev-22
Altaneira	Realizado	28-nov-21	Sim	Realizado	16-jan-22
Antonina do Norte	Realizado	10-nov-21	Sim	--	6-fev-22
Araripe	Realizado	31-out-21	Sim	Realizado	28-jan-22
Aratuba	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	27-jan-22
Arneiroz	Realizado	5-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Assaré	Realizado	8-nov-21		--	5-fev-22
Baixio	Realizado	8-nov-21		--	28-fev-22
Capistrano	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	26-jan-22
Catarina	Realizado	11-nov-21		--	9-fev-22
Chaval	Realizado	15-out-21	Sim	--	6-fev-22
Choró	Realizado	30-jan-22		--	28-fev-22
Farias Brito	Realizado	4-nov-21	Sim	Realizado	20-jan-22
Fortim	Realizado	27-out-21	Sim	Realizado	8-dez-21
General Sampaio	Realizado	10-nov-21	Sim	--	31-jan-22
Granjeiro	Realizado	8-nov-21	Sim	Realizado	14-jan-22
Guaraciaba do Norte	Realizado	8-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Hidrolândia	Realizado	30-jan-22		--	28-fev-22
Ibiapina	Realizado	23-out-21	Sim	Realizado	15-dez-21
Independência	Realizado	20-out-21	Sim	--	14-fev-22
Ipaumirim	Realizado	18-out-21		--	28-fev-22
Itaíçaba	Realizado	24-out-21	Sim	Realizado	7-dez-21
Itapiúna	Realizado	12-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Itatira	Realizado	21-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Jaguaretama	Realizado	17-out-21	Sim	--	13-fev-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Jaguaribara	Realizado	5-nov-21	Sim	Realizado	14-dez-21
Jati	Realizado	11-nov-21		Realizado	21-jan-22
Lavras da Mangabeira	Realizado	9-nov-21	Sim	Realizado	3-dez-21
Meruoca	Realizado	27-nov-21	Sim	S/P	P6 / FR
Mulungu	Realizado	25-out-21	Sim	Realizado	29-jan-22
Nova Russas	Realizado	23-out-21	Sim	S/P	P2 / P6 / FR
Novo Oriente	Realizado	5-nov-21	Sim	--	15-fev-22
Ocara	Realizado	12-nov-21		--	25-jan-22
Orós	Realizado	22-out-21		--	12-fev-22
Pacujá	Realizado	30-out-21		--	7-fev-22
Parambu	Realizado	12-nov-21	Sim	--	16-fev-22
Pedra Branca	--	31-jan-22		S/P	FR
Penaforte	Realizado	16-out-21	Sim	Realizado	30-nov-21
Pereiro	Realizado	15-out-21	Sim	Realizado	4-dez-21
Poranga	Realizado	22-out-21	Sim	--	9-fev-22
Porteiras	Realizado	22-out-21	Sim	Realizado	28-nov-21
Potengi	Realizado	29-out-21	Sim	--	31-jan-22
Saboeiro	Realizado	25-out-21	Sim	--	31-jan-22
Santana do Cariri	Realizado	5-nov-21		Realizado	29-jan-22
São Luís do Curu	Realizado	12-nov-21		--	28-fev-22
Umari	Realizado	18-out-21	Sim	Realizado	17-dez-21

ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

31/Jan/22

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

PIAUÍ

17 municípios



INFRA			
Realizado	Programada	PPTA	Com pendência
16	0	0	1

RF			
Realizado	Programadas	PPTA	Pendência ou sem L20
6	10	0	1

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Alto Longá	Realizado	23-out-21	Sim	--	30-jan-22
Avelino Lopes	Realizado	25-out-21	Sim	--	6-fev-22
Barro Duro	Realizado	22-out-21	Sim	Realizado	28-jan-22
Benedictinos	Realizado	23-out-21	Sim	Realizado	17-dez-21
Bertolândia	Realizado	14-nov-21	Sim	--	12-fev-22
Capitão de Campos	Realizado	4-nov-21	Sim	Realizado	14-dez-21
Flores do Piauí	Realizado	21-out-21	Sim	--	7-fev-22
Fronteiras	Realizado	8-nov-21	Sim	--	15-fev-22
Gilbués	Realizado	19-out-21	Sim	Realizado	9-dez-21
Inhuma	S/P	P1		S/P	FR
Manoel Emídio	Realizado	17-nov-21	Sim	--	13-fev-22
Pedro II	Realizado	28-out-21	Sim	--	28-fev-22
Pio IX	Realizado	10-nov-21	Sim	--	14-fev-22
Porto	Realizado	4-nov-21	Sim	Realizado	26-jan-22
Santa Filomena	Realizado	19-out-21	Sim	Realizado	10-dez-21
Simplicio Mendes	Realizado	11-nov-21	Sim	--	31-jan-22
Várzea Grande	Realizado	8-nov-21	Sim	--	31-jan-22

ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

31/Jan/22

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

RIO GRANDE DO NORTE

32 municípios

INFRA			
Realizado	Programada	PPTA	Com pendência
27	2	0	3

RF			
Realizado	Programadas	PPTA	Pendência ou sem L20
11	18	0	3

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Alexandria	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	14-dez-21
Almino Afonso	--	14-jan-22		--	28-fev-22
Angicos	Realizado	27-out-21	Sim	--	6-fev-22
Augusto Severo	Realizado	29-out-21	Sim	--	9-fev-22
Baía Formosa	Realizado	12-nov-21	Sim	Realizado	18-dez-21
Barcelona	Realizado	12-nov-21		Realizado	16-jan-22
Bento Fernandes	Realizado	16-nov-21	Sim	Realizado	8-dez-21
Caiçara do Rio do Vento	Realizado	15-nov-21	Sim	--	31-jan-22
Canguaretama	Realizado	6-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Coronel João Pessoa	Realizado	31-out-21	Sim	Realizado	15-dez-21
Doutor Severiano	Realizado	29-out-21	Sim	--	14-fev-22
Frutuoso Gomes	S/P	P1		S/P	FR
Governador Dix-Sept Rosado	Realizado	31-out-21	Sim	--	28-fev-22
Guamaré	Realizado	4-dez-21		--	28-fev-22
Itaú	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Lagoa de Velhos	Realizado	17-nov-21	Sim	--	31-jan-22
Lagoa Nova	S/P	P1		S/P	FR
Montanhas	--	31-jan-22		--	28-fev-22
Pedra Preta	Realizado	12-nov-21		--	31-jan-22
Pedra Preta	Realizado	12-nov-21		--	31-jan-22
Pedro Avelino	Realizado	25-out-21	Sim	--	28-fev-22
Pedro Velho	Realizado	12-nov-21	Sim	--	7-fev-22
Portalegre	Realizado	31-out-21	Sim	--	13-fev-22
Rafael Fernandes	Realizado	11-nov-21	Sim	--	31-jan-22
Rafael Godeiro	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	15-dez-21

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Santo Antônio	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	17-dez-21
São Bento do Trairi	Realizado	25-nov-21	Sim	Realizado	10-dez-21
São João do Sabugi	Realizado	11-nov-21	Sim	--	15-fev-22
Serra Negra do Norte	Realizado	12-nov-21	Sim	Realizado	11-dez-21
Serrinha	Realizado	11-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Tenente Ananias	Realizado	2-mai-21	Sim	Realizado	7-mai-21
Touros	Realizado	9-nov-21	Sim	Realizado	26-nov-21
Umarizal	Realizado	30-out-21		--	28-fev-22

ENTREGAS | FASE 1.2 (1/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

PARAÍBA (1/2)

94 municípios

INFRA			
Realizado	Programada	PPTA	Com pendência
69	6	1	19

RF			
Realizado	Programadas	PPTA	Pendência ou sem L20
4	65	1	25

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Água Branca	Realizado	29-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Aguiar	Realizado	25-nov-21	Sim	Realizado	27-jan-22
Alagoa Grande	Realizado	10-dez-21		--	28-fev-22
Alagoíinha	Realizado	21-nov-21		--	31-mar-22
Alcantil	Realizado	12-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Algodão de Jandaíra	Realizado	6-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Araruna	Realizado	19-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Areia	S/P	P2 / P3 / P6		S/P	P2 / P3 / P6 / FR
Aroeiras	Realizado	22-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Bananeiras	S/P	P1		S/P	P3 / FR
Barra de Santa Rosa	Realizado	1-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Barra de Santana	Realizado	19-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Belém	S/P	P1		S/P	FR
Boa Ventura	Realizado	15-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Bonito de Santa Fé	S/P	P1		S/P	FR
Brejo do Cruz	Realizado	4-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Caaporã	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Cacimba de Dentro	S/P	P1		S/P	FR
Camalaú	Realizado	15-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Casserengue	S/P	P1		S/P	FR
Catingueira	Realizado	9-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Conceição	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Condado	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Coremas	Realizado	9-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Cubati	Realizado	9-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Curral Velho	Realizado	30-nov-21	Sim	--	20-jan-22
Dona Inês	Realizado	8-dez-21	Sim	--	31-mar-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Duas Estradas	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Fagundes	PPTA	15-nov-21	Sim	PPTA	31-mar-22
Frei Martinho	Realizado	30-nov-21	Sim	--	14-jan-22
Gado Bravo	Realizado	1-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Gurinhém	Realizado	26-nov-21	Sim	S/P	P3 / FR
Gurjão	Realizado	5-dez-21	Sim	Realizado	26-jan-22
Igaracy	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Imaculada	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Ingã	Realizado	19-nov-21		--	31-mar-22
Itabaiana	--	31-jan-22		--	31-mar-22
Itatuba	Realizado	29-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Jericó	S/P	P1		S/P	FR
Juarez Távora	Realizado	20-nov-21	Sim	S/P	FR
Juazeirinho	Realizado	1-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Junco do Seridó	Realizado	25-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Juru	Realizado	27-dez-21		--	31-mar-22
Lagoa	Realizado	19-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Lagoa de Dentro	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Livramento	S/P	P1		S/P	FR
Logradouro	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Malta	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Mataraca	Realizado	4-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Matinhas	Realizado	4-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Monte Horebe	Realizado	10-dez-21	Sim	--	17-jan-22
Ouro Velho	Realizado	29-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Paulista	Realizado	15-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Piancó	Realizado	19-dez-21	Sim	--	31-mar-22

S/P - Sem previsão; E/P - Em programação; FQ - Fluxo qualificador; FR - Fluxo regulatório; P1 - Pendência do município; P2/P3/P4/P5 - pendência de canal; PPTA - Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.2 (2/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

PARAÍBA (2/2)

94 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Picuí	--	28-jan-22		--	31-mar-22
Pilar	S/P	P1		S/P	FR
Pilões	Realizado	22-nov-21	Sim	Realizado	29-jan-22
Pitimbu	Realizado	27-jan-22		--	31-mar-22
Pocinhos	Realizado	4-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Prata	Realizado	29-nov-21	Sim	--	21-jan-22
Princesa Isabel	Realizado	22-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Queimadas	--	31-jan-22		S/P	P2 / P3 / FR
Remígio	Realizado	12-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Riachão	Realizado	21-nov-21		S/P	FR
Riacho dos Cavalos	Realizado	19-dez-21		--	31-mar-22
Rio Tinto	Realizado	3-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Salgadinho	Realizado	18-nov-21	Sim	--	14-jan-22
Salgado de São Félix	Realizado	12-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Santa Cruz	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Santa Luzia	--	28-jan-22		--	31-mar-22
Santa Teresinha	Realizado	21-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Santana de Mangueira	Realizado	25-nov-21	Sim	--	19-jan-22
Santo André	Realizado	29-nov-21	Sim	--	31-mar-22
São Bentinho	Realizado	12-dez-21	Sim	--	31-mar-22
São Bento	Realizado	27-jan-22		--	31-mar-22
São Francisco	Realizado	10-dez-21		--	14-jan-22
São José da Lagoa Tapada	Realizado	21-nov-21	Sim	--	31-mar-22
São José de Piranhas	S/P	P1		S/P	P2 / FR
São José do Brejo do Cruz	Realizado	4-dez-21		--	31-mar-22
São José dos Ramos	S/P	P1		S/P	P2 / P4 / FR
São Mamede	Realizado	19-dez-21	Sim	--	31-mar-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
São Sebastião do Umbuzeir	Realizado	7-dez-21	Sim	--	22-jan-22
São Vicente do Seridó	Realizado	27-nov-21	Sim	--	31/03/22
Serra Branca	Realizado	28-jan-22		--	31/03/22
Serra Grande	S/P	P1		S/P	FR
Serraria	Realizado	29-nov-21	Sim	--	31/03/22
Sertãozinho	S/P	P1		S/P	FR
Soledade	Realizado	1-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Sumé	--	28-jan-22		S/P	FR
Tacima	Realizado	20-nov-21	Sim	--	31/03/22
Taperoã	Realizado	5-dez-21	Sim	--	31/03/22
Teixeira	Realizado	27-jan-22	Sim	--	31/03/22
Uiraúna	Realizado	10-dez-21	Sim	--	31/03/22
Vista Serrana	Realizado	7-dez-21	Sim	Realizado	28-jan-22

S/P - Sem previsão; E/P - Em programação; FQ - Fluxo qualificador; FR - Fluxo regulatório; P1 - Pendência do município; P2/P3/P4/P5 - pendência de canal; PPTA - Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.2 (3/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

MARANHÃO (1/2)

67 municípios

INFRA			
Realizado	Programada	PPTA	Com pendência
51	6	4	10

RF			
Realizado	Programadas	PPTA	Pendência ou sem L20
0	48	4	19

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Altamira do Maranhão	Realizado	18-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Alto Parnaíba	--	24-nov-21	--	--	28/02/22
Anajatuba	Realizado	19-dez-21	Sim	S/P	P2 / P6 / FR
Araguanã	Realizado	13-dez-21	Sim	--	28/02/22
Arari	Realizado	19-dez-21		S/P	FR
Axixá	Realizado	18-dez-21		--	28/02/22
Barão de Grajaú	Realizado	8-dez-21	Sim	--	28/02/22
Barreirinhas	S/P	P1		S/P	P3 / FR
Bequimão	Realizado	16-dez-21	Sim	--	28/02/22
Buritcupu	PPTA	25-nov-21		PPTA	28/02/22
Cajapió	Realizado	13-dez-21		--	28/02/22
Campestre do Maranhão	Realizado	19-dez-21	Sim	--	28/02/22
Cedral	Realizado	18-nov-21	Sim	--	28/02/22
Centro do Guilherme	Realizado	28-nov-21	Sim	--	28/02/22
Coelho Neto	Realizado	29-dez-21	Sim	--	28/02/22
Conceição do Lago-Açu	PPTA	6-dez-21		PPTA	28/02/22
Cururupu	Realizado	29-nov-21	Sim	--	28/02/22
Gonçalves Dias	S/P	P1		S/P	FR
Governador Archer	Realizado	7-dez-21	Sim	S/P	FR
Governador Luiz Rocha	PPTA	7-dez-21		PPTA	28/02/22
Guimarães	Realizado	12-dez-21	Sim	--	28/02/22
Humberto de Campos	Realizado	14-nov-21	Sim	--	28/02/22
Itapecuru Mirim	Realizado	19-dez-21	Sim	--	28/02/22
Joselândia	Realizado	26-dez-21		S/P	P3 / FR
Lago do Junco	Realizado	6-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Lago dos Rodrigues	Realizado	18-dez-21		--	28-fev-22
Lagoa Grande do Maranhão	Realizado	19-dez-21		--	28/02/22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Lima Campos	Realizado	19-dez-21		--	28-fev-22
Magalhães de Almeida	S/P	P1		S/P	FR
Marajá do Sena	S/P	P1		S/P	FR
Maranhãozinho	Realizado	18-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Mata Roma	S/P	P1		S/P	FR
Mirador	S/P	P1		S/P	FR
Miranda do Norte	Realizado	28-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Mirinzal	Realizado	24-jan-22		--	28-fev-22
Montes Altos	Realizado	26-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Morros	PPTA	20-dez-21		PPTA	28-fev-22
Nina Rodrigues	Realizado	18-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Nova Olinda do Maranhão	Realizado	12-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Olinda Nova do Maranhão	Realizado	16-dez-21		S/P	FR
Palmeirândia	Realizado	25-nov-21		--	28-fev-22
Passagem Franca	--	21-dez-21	Sim	S/P	P2 / FR
Paulo Ramos	Realizado	9-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Peri Mirim	Realizado	27-nov-21		--	28-fev-22
Presidente Dutra	Realizado	7-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Presidente Juscelino	Realizado	21-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Presidente Vargas	Realizado	18-dez-21		--	28-fev-22
Primeira Cruz	Realizado	18-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Santa Luzia	Realizado	19-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Santo Antônio dos Lopes	Realizado	20-jan-22		S/P	P3 / FR
São Benedito do Rio Preto	Realizado	27-nov-21	Sim	--	28-fev-22
São Domingos do Maranhão	Realizado	20-jan-22	Sim	S/P	P3 / FR
São João Batista	Realizado	28-nov-21	Sim	--	28-fev-22
São João do Carú	Realizado	25-jan-22	Sim	--	28-fev-22

S/P - Sem previsão; E/P - Em programação; FQ - Fluxo qualificatório; FR - Fluxo regulatório; P1 - Pendência do município; P2/P3/P4/P5 - pendência de canal; PPTA - Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.2 (4/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

MARANHÃO (2/2)

67 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
	S/P	P1		S/P	FR
São João dos Patos	S/P	P1		S/P	FR
São José dos Basílios	Realizado	7-dez-21		--	28-fev-22
São Vicente Ferrer	Realizado	28-jan-22		--	28-fev-22
Satubinha	Realizado	26-jan-22		--	28-fev-22
Timbiras	Realizado	28-jan-22		--	28-fev-22
Tutóia	S/P	P1		S/P	FR
Vitória do Mearim	S/P	P2 / P3 / P6		S/P	P2 / P3 / P6 / FR
Amapá do Maranhão	Realizado	19-dez-21		--	28-fev-22
Graça Aranha	S/P	P1		S/P	FR
Junco do Maranhão	Realizado	9-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Luís Domingues	Realizado	21-nov-21		--	28-fev-22
Presidente Médici	Realizado	26-nov-21	Sim	--	08/02/22
Tufilândia	Realizado	20-jan-22		--	28-fev-22

ENTREGAS | FASE 1.3

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

PERNANBUCO (1/3)

124 municípios

INFRA			
Realizado	Programada	PPTA	Com pendência
0	104	0	0

RF		
Realizado	Programadas	Pendência ou sem L20
0	0	0

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Afrânio	mai-22		
Agrestina	abr-22		
Água Preta	abr-22		
Águas Belas	mai-22		
Alagoinha	mai-22		
Aliança	abr-22		
Altinho	mai-22		
Amaraji	abr-22		
Angelim	abr-22		
Araripina	mai-22		
Barra de Guabiraba	abr-22		
Barreiros			
Belém de Maria	abr-22		
Belém do São Francisco	mai-22		
Betânia	mai-22		
Bodocó	mai-22		
Bom Conselho			
Bonito	abr-22		
Brejão	mai-22		
Brejinho	mai-22		
Brejo da Madre de Deus			
Buíque	mai-22		
Cabrobó	mai-22		
Cachoeirinha	abr-22		
Caetés	mai-22		
Calçado	abr-22		
Camocim de São Félix	abr-22		

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Canhotinho	abr-22		
Capoeiras	mai-22		
Carnaíba	mai-22		
Carnaubeira da Penha	mai-22		
Casinhas	abr-22		
Condado	abr-22		
Correntes	abr-22		
Cortês	abr-22		
Cumaru	abr-22		
Cupira	abr-22		
Custódia			
Exu	mai-22		
Feira Nova	abr-22		
Flores	mai-22		
Frei Miguelinho			
Gameleira	abr-22		
Glória do Goitá			
Gravatá			
Iati	mai-22		
Ibimirim	mai-22		
Ibirajuba	abr-22		
Igaracy			
Inajá	mai-22		
Ipubi	mai-22		
Itaíba	mai-22		
Itapetim	mai-22		
Jaqueira			

ENTREGAS | FASE 1.3

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

PERNANBUCO (2/3)

124 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Jataúba	mai-22		
Jatobá	mai-22		
João Alfredo			
Joaquim Nabuco	abr-22		
Jucati	abr-22		
Jupi	abr-22		
Jurema	abr-22		
Lagoa de Itaenga	abr-22		
Lagoa do Ouro	abr-22		
Lagoa dos Gatos	abr-22		
Lagoa Grande	mai-22		
Lajedo	abr-22		
Manari	mai-22		
Maraial	abr-22		
Mirandiba	mai-22		
Orobó	abr-22		
Ouricuri	mai-22		
Palmares			
Palmeirina	abr-22		
Panelas			
Paranatama	mai-22		
Parnamirim			
Passira			
Paudalho			
Pedra	mai-22		
Petrolândia	mai-22		
Poção	mai-22		

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Pombos	abr-22		
Primavera			
Quipapá	abr-22		
Riacho das Almas	abr-22		
Ribeirão	abr-22		
Rio Formoso	abr-22		
Sairé	abr-22		
Salgueiro	mai-22		
Saloá	mai-22		
Sanharó	abr-22		
Santa Cruz da Baixa Verde	mai-22		
Santa Maria da Boa Vista	mai-22		
Santa Maria do Cambucá	abr-22		
Santa Terezinha	mai-22		
São Benedito do Sul	abr-22		
São Bento do Una			
São João	abr-22		
São Joaquim do Monte	abr-22		
São José da Coroa Grande	abr-22		
São José do Belmonte	mai-22		
São José do Egito			
Serra Talhada			
Sertânia	mai-22		
Surubim	abr-22		
Tabira	mai-22		
Tacaimbó	abr-22		
Tacaratu	mai-22		

ENTREGAS | FASE 1.3

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

PERNANBUCO (3/3)

124 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Terezinha	mai-22		
Toritama	abr-22		
Trindade	mai-22		
Triunfo	mai-22		
Tupanatinga	mai-22		
Tuparetama	mai-22		
Venturosa	mai-22		
Verdejante	mai-22		
Vertente do Lério	abr-22		
Vertentes	abr-22		
Vicência			
Xexéu	abr-22		
Calumbi	mai-22		
Ingazeira	mai-22		
Itacuruba	mai-22		
Solidão	mai-22		

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

MINAS GERAIS (1/9)

470 municípios

INFRA			
Realizado	Programada	PPTA	Com pendência
0	348	0	0

RF		
Realizado	Programadas	Pendência ou sem L20
0	0	0

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Abadia dos Dourados	mai-22		
Abaeté	mar-22		
Abre Campo	jun-22		
Acaiaca	fev-22		
Água Boa			
Águas Vermelhas			
Aimorés	mar-22		
Aiuruoca	abr-22		
Albertina	fev-22		
Além Paraíba	mar-22		
Alfredo Vasconcelos	mar-22		
Alto Caparaó	mar-22		
Alto Jequitibá	mar-22		
Alto Rio Doce	mar-22		
Alvarenga	fev-22		
Alvinópolis	mar-22		
Alvorada de Minas	mar-22		
Amparo do Serra	fev-22		
Antônio Dias			
Antônio Prado de Minas			
Aracitaba	abr-22		
Arantina			
Araponga			
Arapuá	mai-22		
Araújos	mar-22		
Arceburgo	mar-22		
Areado	fev-22		

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Argirita	fev-22		
Astolfo Dutra	abr-22		
Ataléia	mar-22		
Augusto de Lima	mar-22		
Baependi			
Bandeira			
Bandeira do Sul	fev-22		
Barra Longa	fev-22		
Bela Vista de Minas	mar-22		
Belmiro Braga	fev-22		
Belo Oriente	mar-22		
Berilo	mar-22		
Berizal	mar-22		
Bertópolis	mar-22		
Bias Fortes	fev-22		
Bicas	abr-22		
Boa Esperança	fev-22		
Bom Despacho			
Bom Jardim de Minas			
Bom Jesus da Penha	fev-22		
Bom Jesus do Amparo			
Bom Repouso	fev-22		
Bom Sucesso	fev-22		
Bonfinópolis de Minas	mar-22		
Bonito de Minas	mar-22		
Borda da Mata	fev-22		
Botumirim	mar-22		

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

MINAS GERAIS (2/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Brás Pires	abr-22		
Brasilândia de Minas	mar-22		
Braúnas	mar-22		
Brazópolis	fev-22		
Bueno Brandão			
Buenópolis	mar-22		
Cabo Verde	fev-22		
Cachoeira de Minas	fev-22		
Cachoeira de Pajeú			
Cachoeira Dourada	jun-22		
Cajuri			
Caldas			
Camanducaia	fev-22		
Cambuquira	fev-22		
Campanário	mar-22		
Campestre			
Campo do Meio	fev-22		
Campo Florido	mar-22		
Campos Altos			
Campos Gerais			
Cana Verde	mar-22		
Canaã	fev-22		
Candeias	fev-22		
Caparaó	fev-22		
Capetinga	mar-22		
Capinópolis	mai-22		
Capitão Andrade	fev-22		

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Capitólio		mai-22	
Caputira			
Carai		jul-22	
Carandaí		mar-22	
Carangola		abr-22	
Carbonita		ago-22	
Careaçu		jun-22	
Carlos Chagas			
Carmo da Mata		mar-22	
Carmo de Minas			
Carmópolis de Minas		fev-22	
Carneirinho			
Carrancas			
Carvalhópolis		jun-22	
Cascalho Rico			
Catas Altas da Noruega		jul-22	
Catuti		mar-22	
Caxambu		mai-22	
Cedro do Abaeté			
Central de Minas			
Centralina			
Chácara		mai-22	
Chapada do Norte		jul-22	
Chiador			
Cipotânea		mai-22	
Coimbra		mai-22	
Coluna		jul-22	

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

MINAS GERAIS (3/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Comendador Gomes			
Comercinho			
Conceição da Aparecida			
Conceição das Pedras	jun-22		
Conceição de Ipanema			
Conceição do Mato Dentro	ago-22		
Conceição do Rio Verde	mai-22		
Conceição dos Ouros	jun-22		
Cônego Marinho	mar-22		
Congonhal	mai-22		
Conselheiro Pena			
Coqueiral	fev-22		
Cordislândia	mai-22		
Corinto	abr-22		
Coroaci	mar-22		
Coronel Murta	mar-22		
Coronel Pacheco	mai-22		
Córrego Danta			
Córrego do Bom Jesus	mai-22		
Córrego Fundo	mar-22		
Córrego Novo	jun-22		
Cristais	mai-22		
Cristina	mai-22		
Crucilândia	abr-22		
Cruzeiro da Fortaleza	mar-22		
Cruzília	jun-22		
Curral de Dentro	mar-22		

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Datas		ago-22	
Delfim Moreira		abr-22	
Delfinópolis		jun-22	
Delta		mar-22	
Descoberto		abr-22	
Desterro de Entre Rios		jul-22	
Desterro do Melo			
Diogo de Vasconcelos			
Divinésia		jun-22	
Divino			
Divino das Laranjeiras			
Divinolândia de Minas		abr-22	
Dom Joaquim		jul-22	
Dom Viçoso		mai-22	
Dona Eusébia			
Dores de Guanhães		jul-22	
Dores do Indaiá			
Dores do Turvo		jun-22	
Doresópolis			
Douradoquara		mar-22	
Elói Mendes			
Engenheiro Caldas		fev-22	
Engenheiro Navarro		abr-22	
Entre Rios de Minas			
Ervália		mai-22	
Espera Feliz		fev-22	
Espinosa		abr-22	

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

MINAS GERAIS (4/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Espírito Santo do Dourado	fev-22		
Estiva	fev-22		
Estrela Dalva	jun-22		
Estrela do Sul			
Eugenópolis	mai-22		
Ewbank da Câmara	mai-22		
Extrema			
Faria Lemos	mai-22		
Felisburgo	abr-22		
Felixlândia	jun-22		
Fernandes Tourinho	jun-22		
Formoso	jul-22		
Fortaleza de Minas	mar-22		
Francisco Badaró	jun-22		
Francisco Sá	abr-22		
Frei Gaspar	abr-22		
Frei Inocêncio	abr-22		
Fronteira	jun-22		
Galiléia			
Goianá			
Gonçalves			
Gouveia	abr-22		
Grão Mogol	abr-22		
Grupiara	mar-22		
Guapé	mar-22		
Guaraciaba	mar-22		
Guaranésia	fev-22		

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Guarani			
Guarará			
Guarda-Mor			
Guidoval	mar-22		
Guiricema	mai-22		
Gurinhata			
Heliodora			
Iapu	fev-22		
Ibertioga			
Ibiaí	abr-22		
Ibiraci	mar-22		
Ibitiúra de Minas			
Ibituruna	mar-22		
Icaraí de Minas	abr-22		
Igaratinga	jun-22		
Iguatama	mai-22		
Ijaci	mar-22		
Illicinea	fev-22		
Indaialbira	abr-22		
Inimutaba	abr-22		
Ipuiúna			
Iraí de Minas	mar-22		
Itabirinha	mai-22		
Itacarambi	abr-22		
Itaipé	ago-22		
Itamarandiba	abr-22		
Itamarati de Minas	mai-22		

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

MINAS GERAIS (5/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Itambacuri	abr-22		
Itambé do Mato Dentro			
Itamogi	mar-22		
Itamonte	fev-22		
Itanhandu	jun-22		
Itanhomi	fev-22		
Itaobim	abr-22		
Itapagipe			
Itapecerica	abr-22		
Itapeva	mar-22		
Itaú de Minas	mai-22		
Itaverava	abr-22		
Itinga			
Itueta	mai-22		
Itumirim	mai-22		
Jacuí	mar-22		
Jaíba	abr-22		
Japonvar	mai-22		
Jeceaba	abr-22		
Jenipapo de Minas	mai-22		
Jequeri			
Jequitai	jul-22		
Jesuânia	abr-22		
Joáima			
Joaquim Felício	jun-22		
Josenópolis	mai-22		
Juramento	ago-22		

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Juruáia		fev-22	
Ladainha		mai-22	
Lagamar			
Lagoa Dourada		abr-22	
Lagoa Formosa		mai-22	
Lajinha		mar-22	
Lamim		mar-22	
Laranjal		fev-22	
Lassance		mai-22	
Leme do Prado		mai-22	
Liberdade		mai-22	
Lima Duarte			
Limeira do Oeste		abr-22	
Lontra		mai-22	
Luisburgo		mar-22	
Luislândia		mai-22	
Luminárias		fev-22	
Madre de Deus de Minas		abr-22	
Malacacheta		mai-22	
Manhumirim			
Maravilhas		jun-22	
Maria da Fé		abr-22	
Marilac		jun-22	
Maripã de Minas		jun-22	
Marliéria		abr-22	
Martinho Campos		mar-22	
Martins Soares		mar-22	

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

MINAS GERAIS (6/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Materlândia	jun-22		
Matipó			
Mato Verde	mai-22		
Matutina	abr-22		
Medeiros	mar-22		
Medina			
Mendes Pimentel	mar-22		
Mercês	mai-22		
Mesquita			
Minas Novas	jul-22		
Minduri	abr-22		
Mirabela	jun-22		
Miradouro			
Mirai	mai-22		
Moeda			
Moema	mai-22		
Monsenhor Paulo	abr-22		
Monte Alegre de Minas	jun-22		
Monte Santo de Minas	mar-22		
Montezuma	jul-22		
Morro da Garça			
Morro do Pilar			
Munhoz			
Mutum			
Muzambinho			
Natalândia	mai-22		
Natércia	fev-22		

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Nazareno	mar-22		
Nova Mógica	mai-22		
Nova Serrana			
Novo Cruzeiro	mai-22		
Olaria	fev-22		
Olhos-d'Água	mai-22		
Olímpio Noronha	abr-22		
Oliveira Fortes			
Onça de Pitangui	mai-22		
Oratórios	fev-22		
Ouro Verde de Minas			
Padre Paraíso	jun-22		
Paineiras	mai-22		
Pains	mar-22		
Paiva	mar-22		
Palma	fev-22		
Paraisópolis			
Passa Quatro			
Passa Tempo	mar-22		
Passa-Vinte	abr-22		
Patrocínio do Muriaé	fev-22		
Paula Cândido	jun-22		
Paulistas	jul-22		
Pavão	jun-22		
Peçanha	jun-22		
Pedra do Anta	mar-22		
Pedra do Indaiá	abr-22		

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

MINAS GERAIS (7/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Pedra Dourada	mar-22		
Pedralva	abr-22		
Pedras de Maria da Cruz			
Pedrinópolis	abr-22		
Pequeri	fev-22		
Perdizes	abr-22		
Perdões			
Pescador	jun-22		
Piau	mar-22		
Piedade de Ponte Nova	mar-22		
Piedade do Rio Grande	mai-22		
Pirajuba	abr-22		
Piranga	mar-22		
Piranguçu	abr-22		
Pirapetinga	mar-22		
Piraúba	mar-22		
Pitangui	mai-22		
Planura	mai-22		
Poço Fundo	abr-22		
Pocrane	abr-22		
Pompéu	mai-22		
Ponto Chique	jun-22		
Porto Firme			
Poté	ago-22		
Pouso Alto			
Pratápolis			
Pratinha			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Presidente Juscelino	mai-22		
Presidente Kubitschek	mai-22		
Presidente Olegário	jul-22		
Quartel Geral	abr-22		
Recreio	fev-22		
Reduto	mai-22		
Resplendor	abr-22		
Riachinho			
Rio Casca	abr-22		
Rio do Prado	jun-22		
Rio Doce	abr-22		
Rio Espera			
Rio Novo	abr-22		
Rio Paranaíba	jun-22		
Rio Pardo de Minas	ago-22		
Rio Piracicaba	mai-22		
Rio Pomba	abr-22		
Rio Preto	jun-22		
Rio Vermelho	mai-22		
Ritápolis	mai-22		
Rochedo de Minas	abr-22		
Rodeiro	abr-22		
Romaria	mai-22		
Rubelita	jun-22		
Rubim			
Sabinópolis	ago-22		
Salto da Divisa			

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

MINAS GERAIS (8/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Santa Bárbara do Monte Verde	abr-22		
Santa Bárbara do Tugúrio	jun-22		
Santa Cruz do Escalvado	abr-22		
Santa Juliana	jun-22		
Santa Margarida	abr-22		
Santa Maria de Itabira	jul-22		
Santa Maria do Salto			
Santa Maria do Suaçuí			
Santa Rita de Caldas			
Santa Rita de Minas	abr-22		
Santana do Deserto	abr-22		
Santana do Jacaré	abr-22		
Santana do Manhuaçu	jun-22		
Santana dos Montes	jun-22		
Santo Antônio do Amparo	jun-22		
Santo Antônio do Aventureiro	mai-22		
Santo Antônio do Grama	fev-22		
Santo Antônio do Itambé	jun-22		
Santo Antônio do Jacinto			
Santo Antônio do Monte			
Santo Antônio do Rio Abaixo			
São Geraldo	fev-22		
São Gonçalo do Abaeté	jun-22		
São Gonçalo do Pará	abr-22		
São Gonçalo do Rio Abaixo			
São Gonçalo do Sapucaí	abr-22		
São Gotardo			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
São João Batista do Glória			
São João da Mata	mai-22		
São João da Ponte	jun-22		
São João do Manhuaçu			
São João do Oriente	jun-22		
São João Evangelista	jun-22		
São José da Barra			
São José do Divino	jun-22		
São José do Goiabal	jun-22		
São José do Mantimento			
São Miguel do Anta	mai-22		
São Pedro da União			
São Pedro dos Ferros			
São Romão			
São Roque de Minas			
São Thomé das Letras	mai-22		
São Tiago	jul-22		
São Tomás de Aquino			
Senador Amaral	mai-22		
Senador Cortes	mai-22		
Senador Firmino			
Senador José Bento	abr-22		
Senhora de Oliveira	jun-22		
Senhora do Porto			
Senhora dos Remédios	jul-22		
Sericita	fev-22		
Serra Azul de Minas	jul-22		

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

31/Jan/22

MINAS GERAIS (9/9)

470 municípios




Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Serra do Salitre			
Serra dos Aimorés	jul-22		
Serrania			
Serranos	mai-22		
Serro	jun-22		
Silvianópolis	abr-22		
Simão Pereira	jun-22		
Simonésia			
Soledade de Minas			
Tabuleiro			
Tapira			
Tapiraí			
Tarumirim	fev-22		
Teixeiras	mai-22		
Tiros			
Tocantins	jun-22		
Tombos	jun-22		
Turmalina	jun-22		
Turvolândia	mai-22		
Umburatiba	jul-22		
União de Minas			
Urucânia	jun-22		
Urucuia	jul-22		
Vargem Bonita			
Varjão de Minas			
Varzelândia	jun-22		
Vazante	jul-22		

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Verdelândia	jul-22		
Veredinha	jul-22		
Veríssimo			
Vermelho Novo			
Vieiras	mai-22		
Virgem da Lapa	jul-22		
Virgínia	mai-22		
Virginópolis	ago-22		
Virgolândia	jul-22		
Volta Grande			
Wenceslau Braz	abr-22		

FLUXO | FASE 1.1 | CE . PI . RN

73 MUNICÍPIOS • 267 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

31/Jan/22
Status d+194

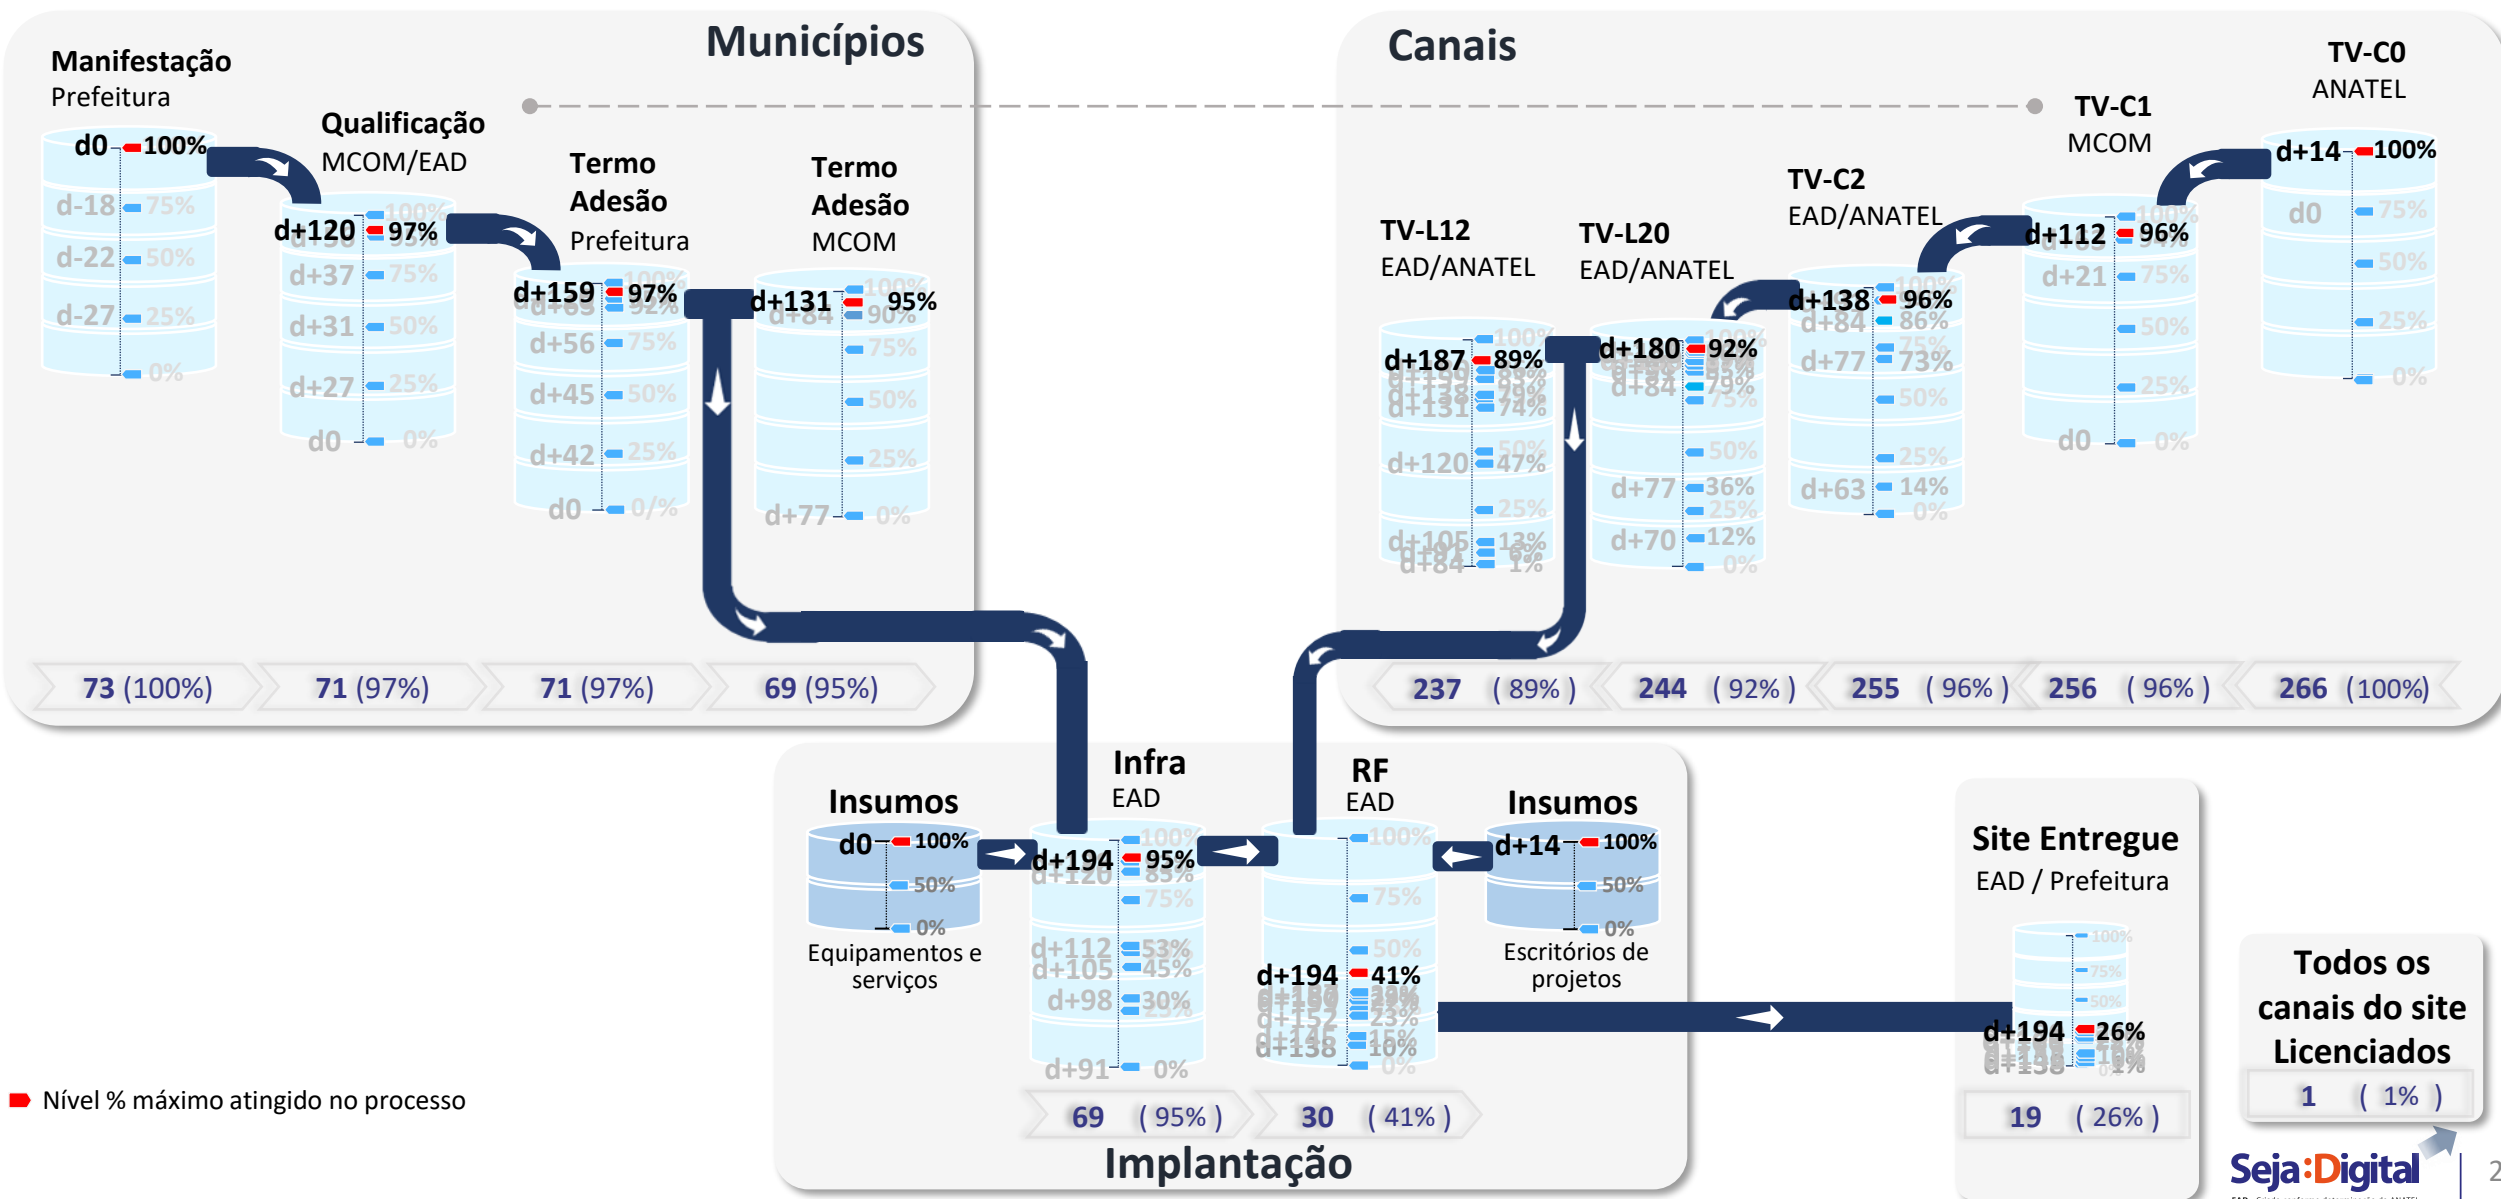


QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.1 • 73 MUNICÍPIOS • 267 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

31/Jan/22
Status d+194

Manifestação de interesse da entidade


Entidade



72 (99%)

VTA positiva da entidade manifestante


EAD



72 (99%)

Entidade manifestante qualificada


MCOM



71 (97%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD



72 (99%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.1 • 73 MUNICÍPIOS • 266 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

31/Jan/22

Status d+194

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.1	Lagoa Nova/RN	15.477	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.1	Inhuma/PI	15.296	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.1

31/Jan/22

Status d+194

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	9	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	10	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	11	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	13	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	8	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Guaraciaba do Norte	FUNDACAO JOAO PAULO II	26	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.1	CE	Itapiúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	3	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.1	CE	Nova Russas	RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA	2	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.1	PI	Pedro II	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	26	STM 6	STM 5	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.


P3 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.1

31/Jan/22

Status d+194

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A		7	STM 10	STM 9	SIM	SIM
1.1	CE	São Luís do Curu	FUNDAÇÃO DE TELEDU. DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC	Televisão Verdes Mares		11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.1	RN	Umarizal	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	TVSBT Canal 4 de São Paulo		12	STM 6	STM4	NÃO	SIM

 Entidade que manifestou interesse

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA


NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1	CE	Meruoca	FUNDACAO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC	43	STM 4	SIM	SIM
1.1	CE	Meruoca	FUNDACAO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC	28	STM 4	SIM	SIM
1.1	CE	Nova Russas	RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA	42	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Nova Russas	RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA	20	STM 5	SIM	SIM

FLUXO | FASE 1.1 Complemento | CE . PI . RN

24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

31/Jan/22
Status d+164

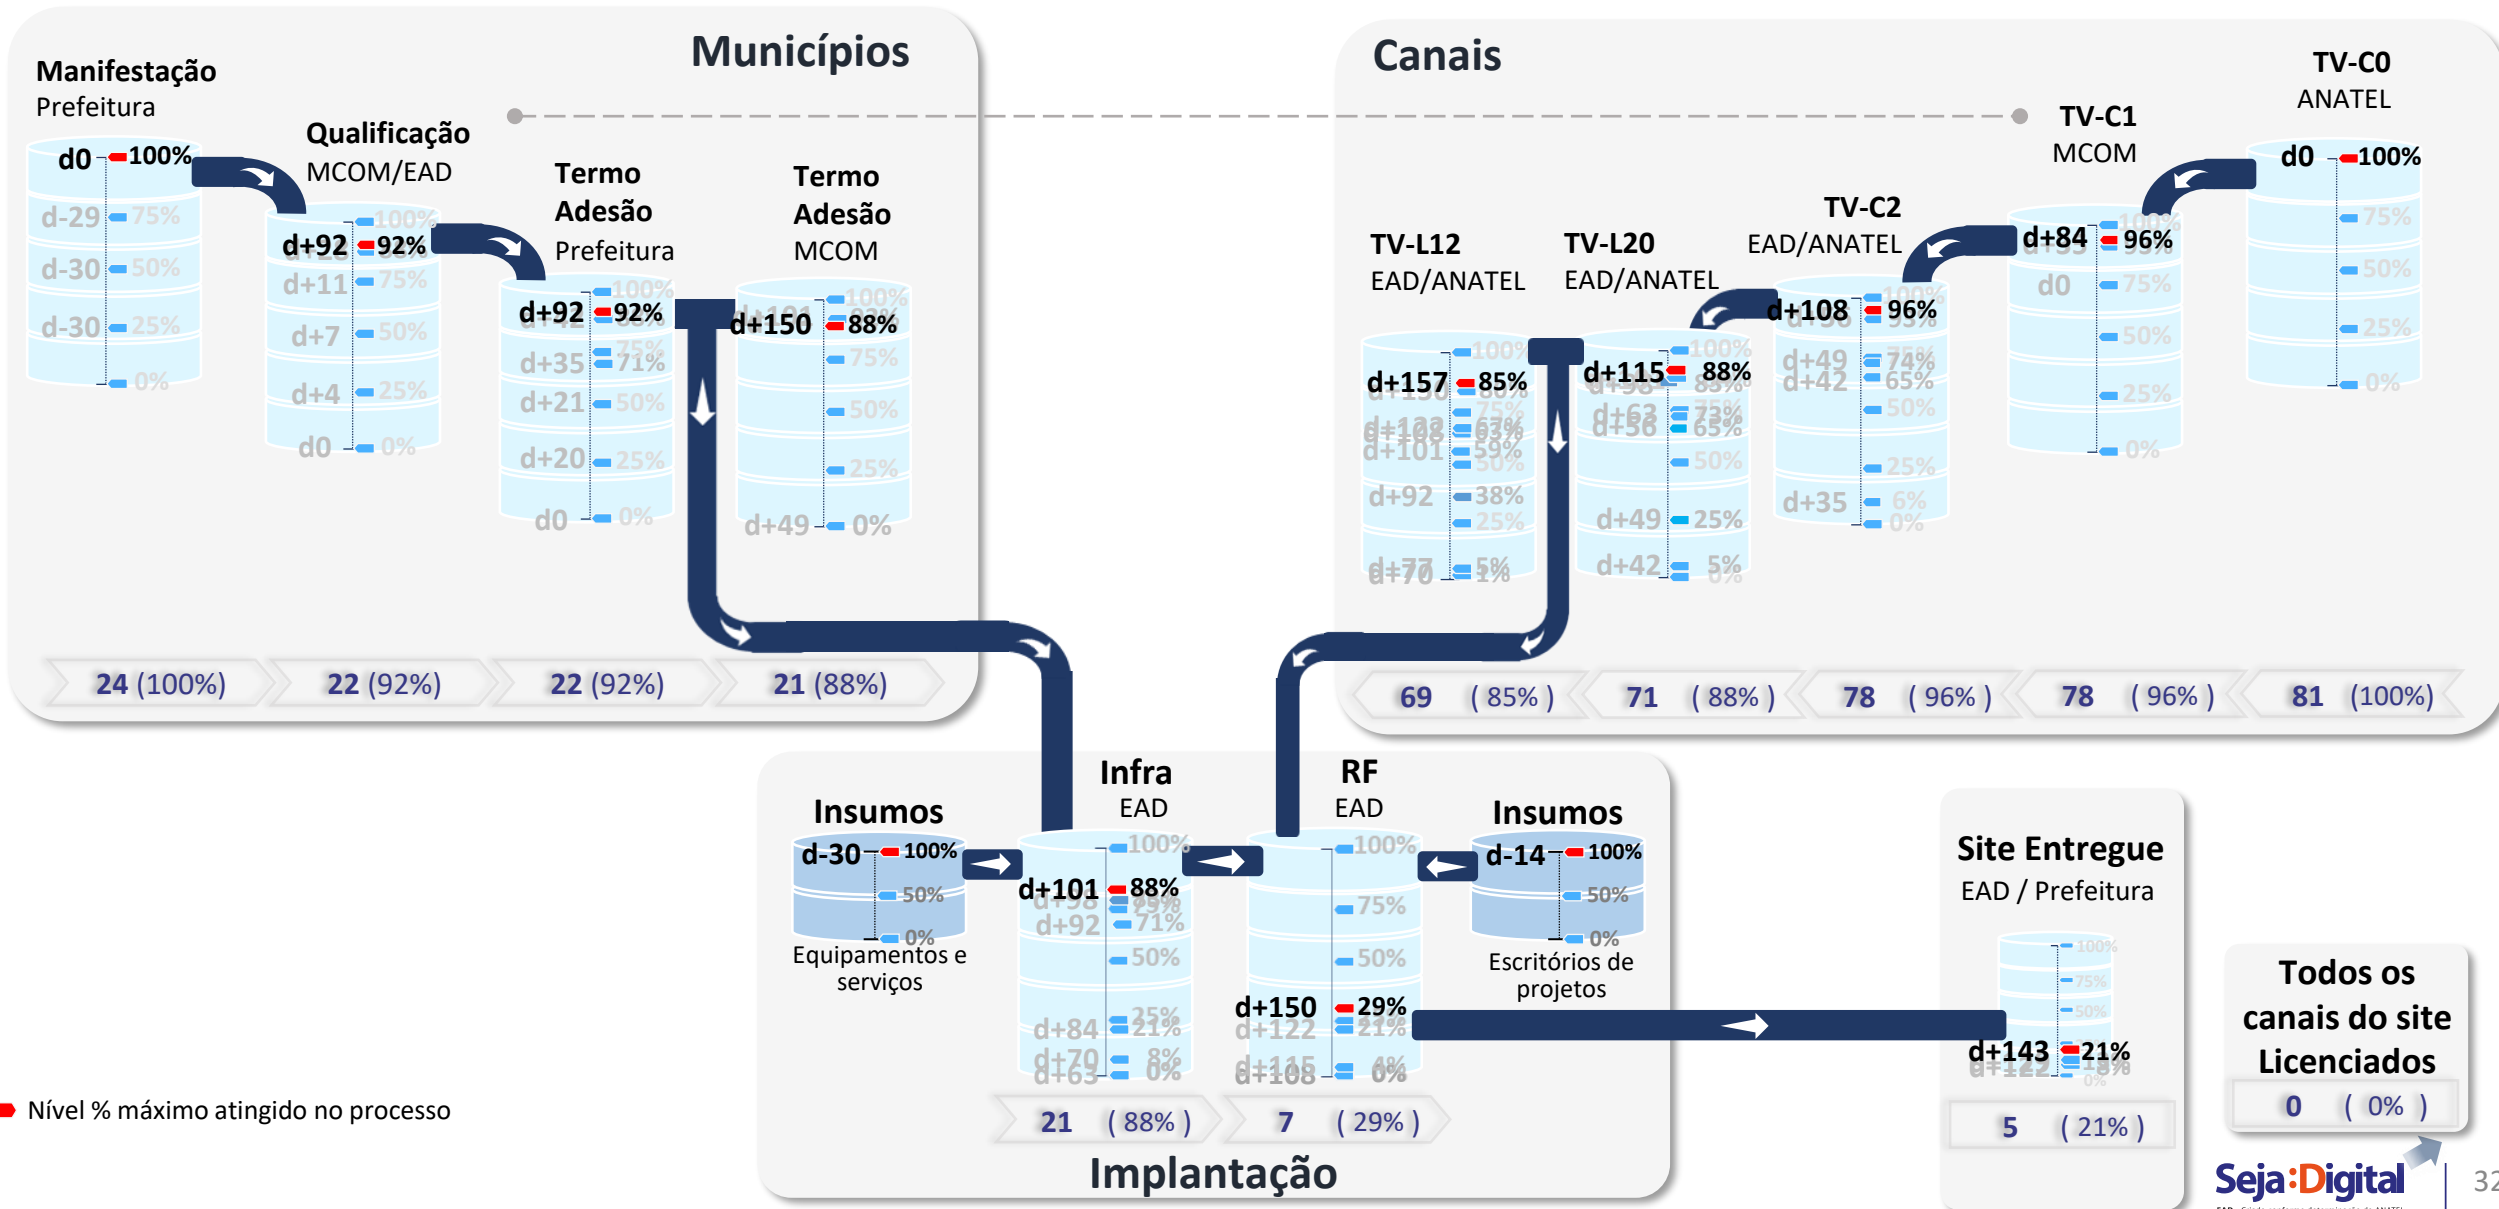

■ Nível % máximo atingido no processo


QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.1 COMP. • 24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

31/Jan/22
Status d+164

Manifestação de
interesse da
entidade


Entidade



24 (100%)

VTA positiva da
entidade
manifestante


EAD



24 (100%)

Entidade
manifestante
qualificada


MCOM



22 (92%)

Local
Habilitado

Prefeitura / EAD



24 (100%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.1 COMP. • 24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

31/Jan/22
Status d+164

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.1 compl.	Frutuoso Gomes/RN	4.095	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.1 compl.	Itaú/RN	5.858	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.1 COMP.

31/Jan/22

Status d+164


Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1 comp	RN	Itaú	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU	4	STM 4	STM 3	NÃO	SIM

P3 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.1 COMP.

31/Jan/22
Status d+164

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	Observação	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1 Comp	CE	Baixio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO	TVSBT Canal 4 de São Paulo		2	A manifestação deveria ter ocorrido pela CPB	STM 4	STM 3	NÃO	SIM

 Entidade que manifestou interesse

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA


NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

FLUXO | FASE 1.2 | MA . PB

161 MUNICÍPIOS • 605 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

31/Jan/22
Status d+157

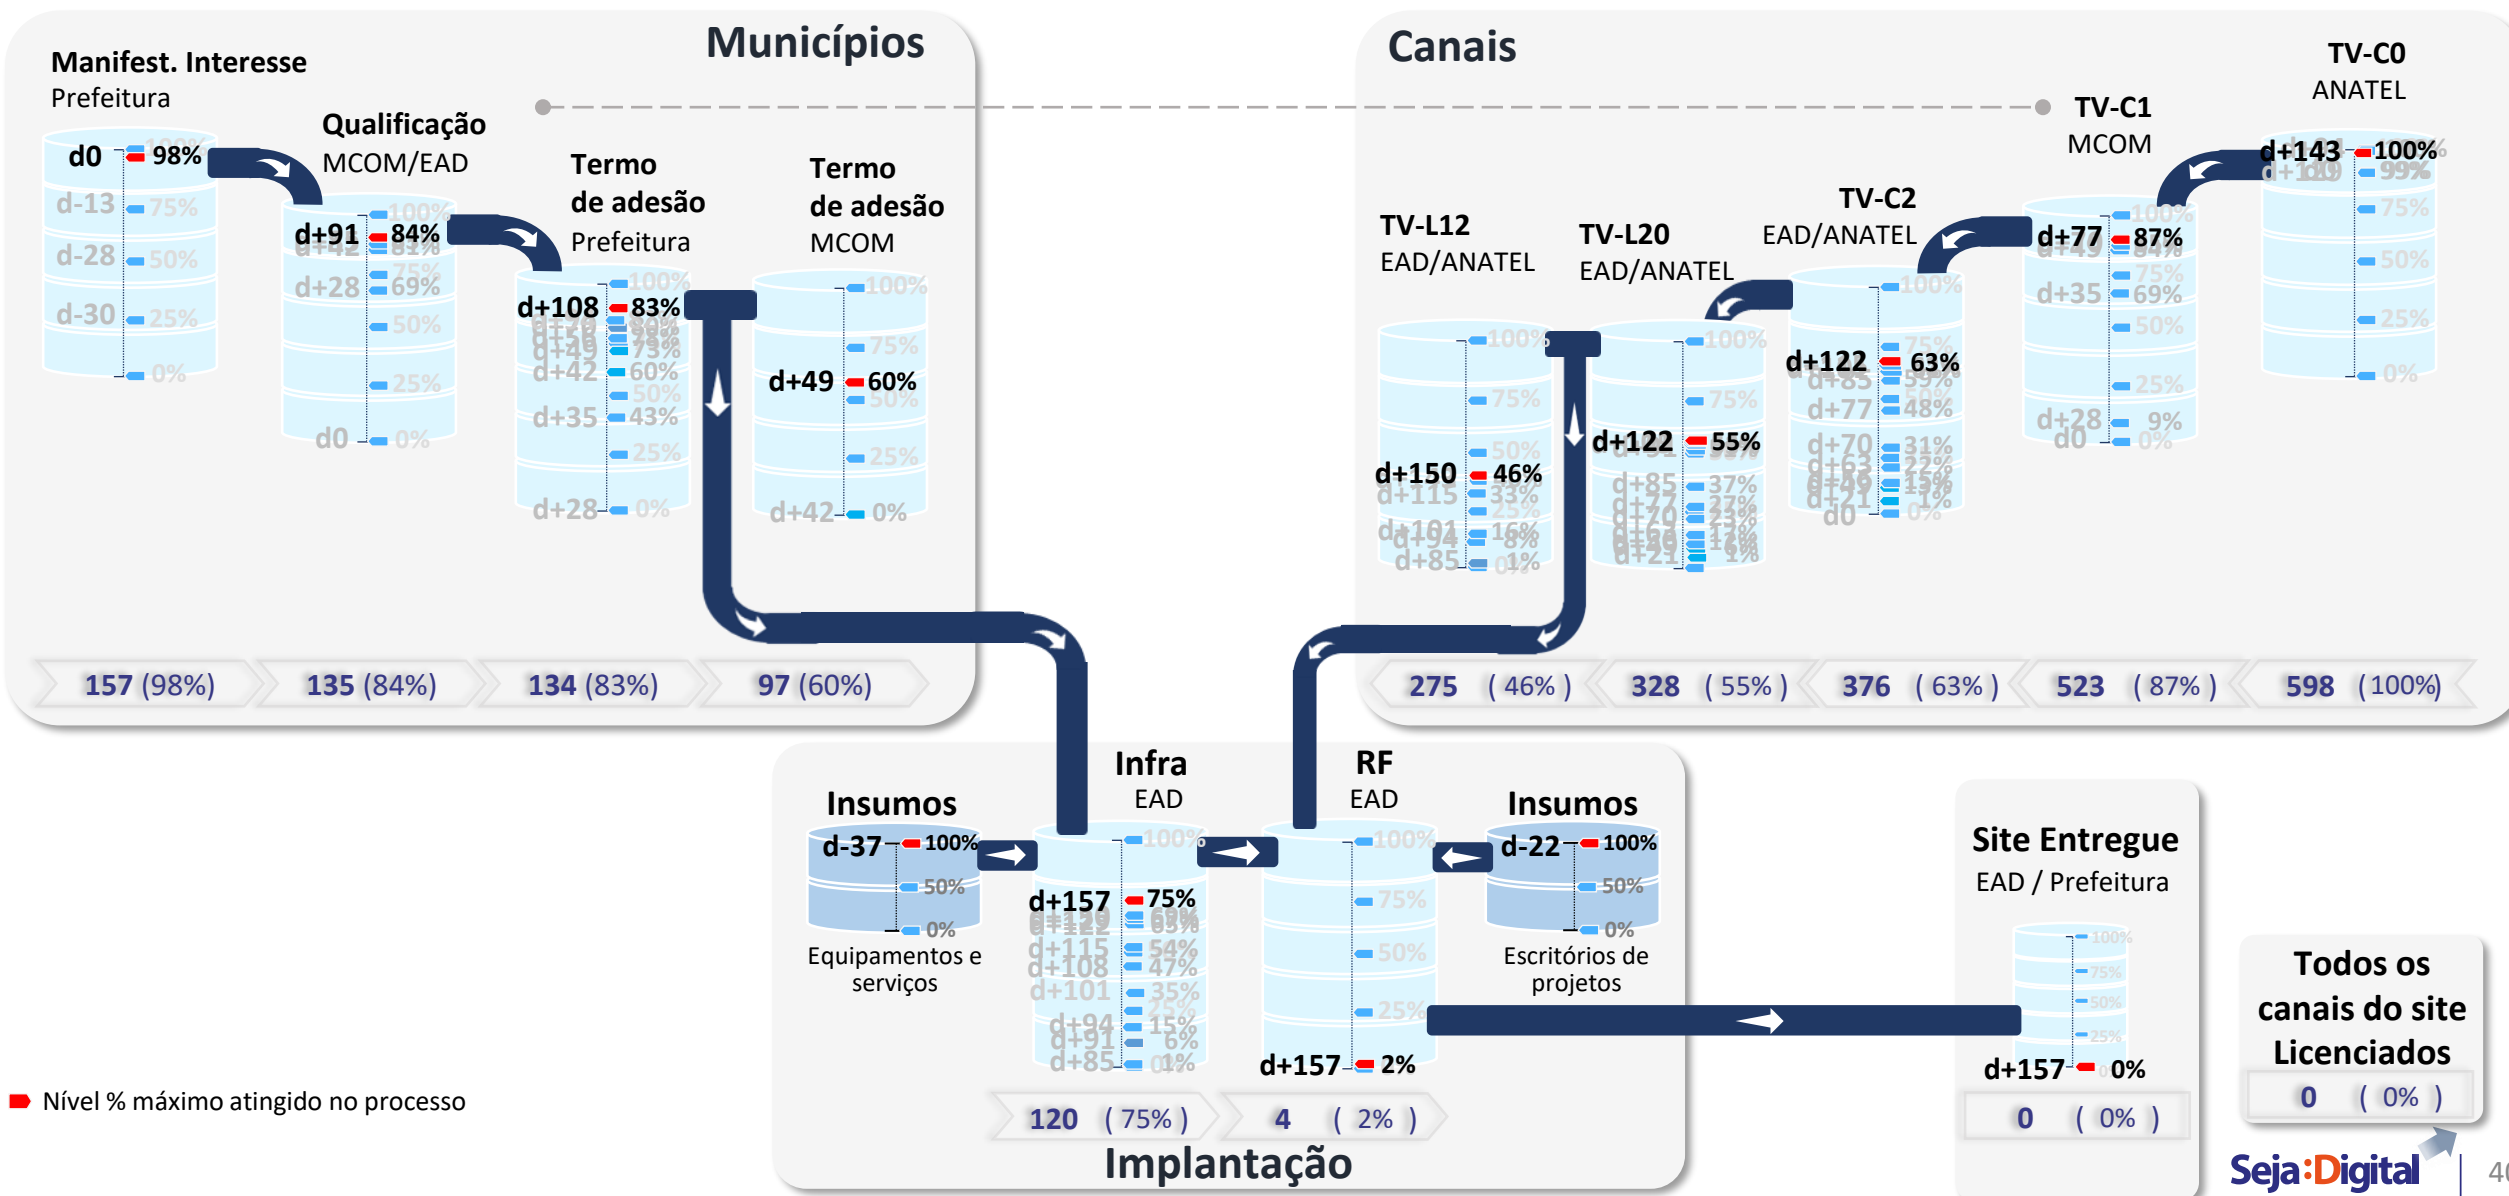

■ Nível % máximo atingido no processo

Todos os canais do site Licenciados
0 (0%)


QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 605 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

31/Jan/22
Status d+157

Manifestação de interesse da entidade


Entidade



154 (96%)

VTA positiva da entidade manifestante


EAD

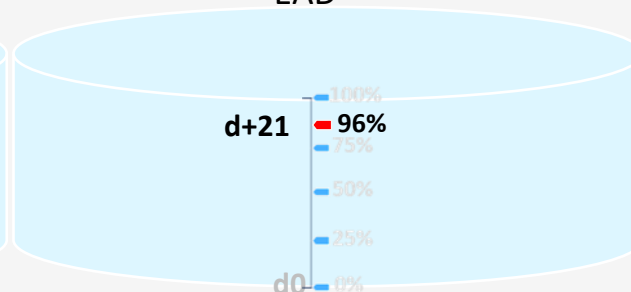

154 (96%)

Entidade manifestante qualificada


MCOM

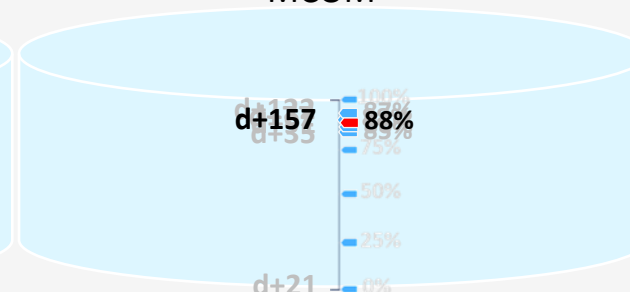

141 (88%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD

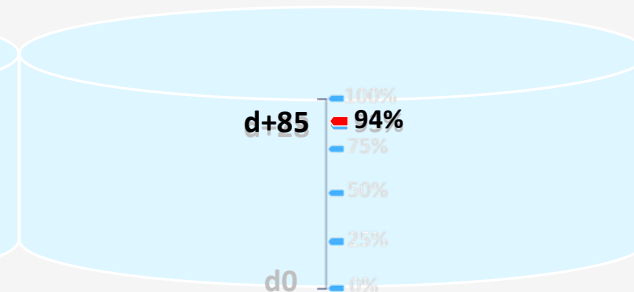

151 (94%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES (1/2)

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

31/Jan/22

Status d+157

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.2	Malta/PB	5.766	Não	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Pilar/PB	11.855	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	4	SIM	SIM
1.2	Serra Grande/PB	3.089	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Sertãozinho/PB	4.958	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Caaporã/PB	21.698	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Imaculada/PB	11.790	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	São José de Piranhas/PB	20.053	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Condado/PB	6.649	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Santa Cruz/PB	6.585	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	São José dos Ramos/PB	5.915	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Gonçalves Dias/MA	17.924	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Graça Aranha/MA	6.263	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Magalhães de Almeida/MA	19.620	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Mata Roma/MA	16.679	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Mirador/MA	21.000	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	São João dos Patos/MA	25.860	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES (2/2)

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

31/Jan/22

Status d+157

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.2	Tutóia/MA	58.311	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Belém/PB	17.640	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Bonito de Santa Fé/PB	11.797	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Cacimba de Dentro/PB	17.159	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Jericó/PB	7.732	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Livramento/PB	7.371	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Bananeiras/PB	21.210	Sim	Sim	Sim	Não	Inviável	Não	6	SIM	SIM
1.2	Marajá do Sena/MA	7.810	Sim	Sim	Sim	Não	Inviável	Não	3	SIM	SIM
1.2	Casserengue/PB	7.431	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Conceição/PB	18.904	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	6	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.2

31/Jan/22

Status d+157

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	MA	Anajatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	9	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Anajatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	11	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Itapecuru Mirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM	5	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	MA	Passagem Franca	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM	4	STM 9	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Alagoa Grande	TELEVISAO BORBOREMA S/A	19	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.2	PB	Alagoa Grande	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	33	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.2	PB	Areia	PABLO COMUNICACOES LTDA EPP	15	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Areia	TELEVISAO BORBOREMA SA	21	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Caaporã	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	46	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Conceição	SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME	32	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Conceição	F S M COMUNICACAO LTDA - EPP	38	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Coremas	FUNDACAO BRASIL ECOAR	26	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Cubati	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	10	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Imaculada	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA	13	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Ingá	FUNDACAO PADRE IBIAPINA	7	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	Itabaiana	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	13	STM 8	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	Juazeirinho	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	14	STM 5	STM 4	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P2 • CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.2

31/Jan/22
Status d+157

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	PB	Piancó	FUNDACAO BRASIL ECOAR	29	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Picuí	FUNDACAO BRASIL ECOAR	21	STM 5	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Picuí	TELEVISAO BORBOREMA S/A	22	STM 5	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Princesa Isabel	TELEVISAO BORBOREMA S/A	14	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Queimadas	FUNDACAO PEDRO AMERICO	8	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Queimadas	FUNDACAO BRASIL ECOAR	33	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Rio Tinto	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST MARISCHEN	30	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.2	PB	São Bento	FUNDACAO BRASIL ECOAR	25	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	São Bento	PRINTSTEL ENGENHARIA LTDA	48	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	São José de Piranhas	FUNDACAO BRASIL ECOAR	29	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Serra Branca	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA	4	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Serra Branca	TELEVISAO BORBOREMA S/A	14	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Teixeira	MUNICIPIO DE TEIXEIRA	8	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Condado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	10	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Malta	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA	5	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Santa Cruz	FUNDACAO BRASIL ECOAR	25	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	São José dos Ramos	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	16	STM 3	STM 2	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P3 • CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.2

31/Jan/22

Status d+157

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	MA	Barreirinhas	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO		11	STM 4	STM 2	SIM	SIM
1.2	MA	Coelho Neto	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO	SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSÃO LTDA		5	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Coelho Neto	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	TV Itapicuru Ltda	12	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Governador Archer	TYMARANHÃO CENTRAL LTDA			7	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Itapecuru Mirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	Televisão Mirante Ltda	11	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	MA	Joselândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	TV Itapicuru Ltda	10	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lago do Junco	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO	RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA		4	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lago do Junco	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	TV Itapicuru Ltda	9	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lago do Junco	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO	RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA		13	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lima Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO		7	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Passagem Franca	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA		Rádio Mirante do Maranhão	6	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	MA	Presidente Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	TV Itapicuru Ltda	7	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	MA	Santo Antônio dos Lopes	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO		10	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Santo Antônio dos Lopes	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES		TV Itapicuru Ltda	13	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Santo Antônio dos Lopes	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES			2	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	São Domingos do Maranhão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	TV Itapicuru Ltda	8	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	São Domingos do Maranhão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA		13	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	São Domingos do Maranhão	TYMARANHÃO CENTRAL LTDA			7	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Timbiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO		11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM	RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA		10	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	TV Itapicuru Ltda	13	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	Alagoa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA		11	STM 8	STM 6	NÃO	SIM

P3 • CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.2

31/Jan/22

Status d+157

Fase	UF	Município	Entidade Detetora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	PB	Areia	USINA SANTA MARIA SA	TELEVISAO PARAIBA LTDA		13	STM 10	STM 9	SIM	SIM
1.2	PB	Bananeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA	Rádio e Televisão Band	4	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Bananeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA		7	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Barra de Santa Rosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO PARAÍBA	9	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Brejo do Cruz	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LT		9	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Dona Inês	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO CABO BRA	4	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Gurinhém	TELEVISAO BORBOREMA S/A	TELEVISAO BORBOREMA S/A	TELEVISÃO TAMBAÚ L	4	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Ingá	PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA	TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO L		9	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	Itabaiana	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE I	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LT		4	STM 8	STM 4	SIM	SIM
1.2	PB	Itabaiana	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE I	TV OMEGA LTDA		8	STM 8	STM 4	SIM	SIM
1.2	PB	Itabaiana	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE I	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA		11	STM 8	STM 4	SIM	SIM
1.2	PB	Juazeirinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO	TV OMEGA LTDA		10	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Mataraca	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LT		12	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Pocinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO PARAÍBA	12	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Queimadas	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO PARAÍBA	7	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Queimadas	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE	TELEVISAO SUL BAHIA	40	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Remígio	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO PARAÍBA	5	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Rio Tinto	AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO CABO BRA	7	STM 7	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	Rio Tinto	PRINTSTEL ENGENHARIA LTDA	FUNDACAO SECULO VINTE E UM		2	STM 7	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	São Bento	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE	Tlevisão Sul Bahia de Te	40	STM 9	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Soledade	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	TELEVISAO PARAIBA LTDA		7	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Taperoá	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	TELEVISAO PARAIBA LTDA		13	STM 4	STM 3	NÃO	SIM

P4 • CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.2

31/Jan/22
Status d+157

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	PB	São José dos Ramos	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	16	STM 3	STM 1	SIM	SIM
1.2	PB	São José dos Ramos	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 1	SIM	SIM
1.2	PB	Serraria	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P6 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.2


31/Jan/22
Status d+157

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	MA	Areia	TELEVISAO PARAIBA LTDA	20	STM 10	SIM	SIM
1.2	MA	Areia	TELEVISAO PARAIBA LTDA	31	STM 10	SIM	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	TV MARANHAO CENTRAL LTDA	31	STM 9	SIM	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	TV MARANHAO CENTRAL LTDA	30	STM 9	SIM	SIM

FLUXO | FASE 1.3 | AL . BA . PE . SE

322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = d0

31/Jan/22
Status d+115

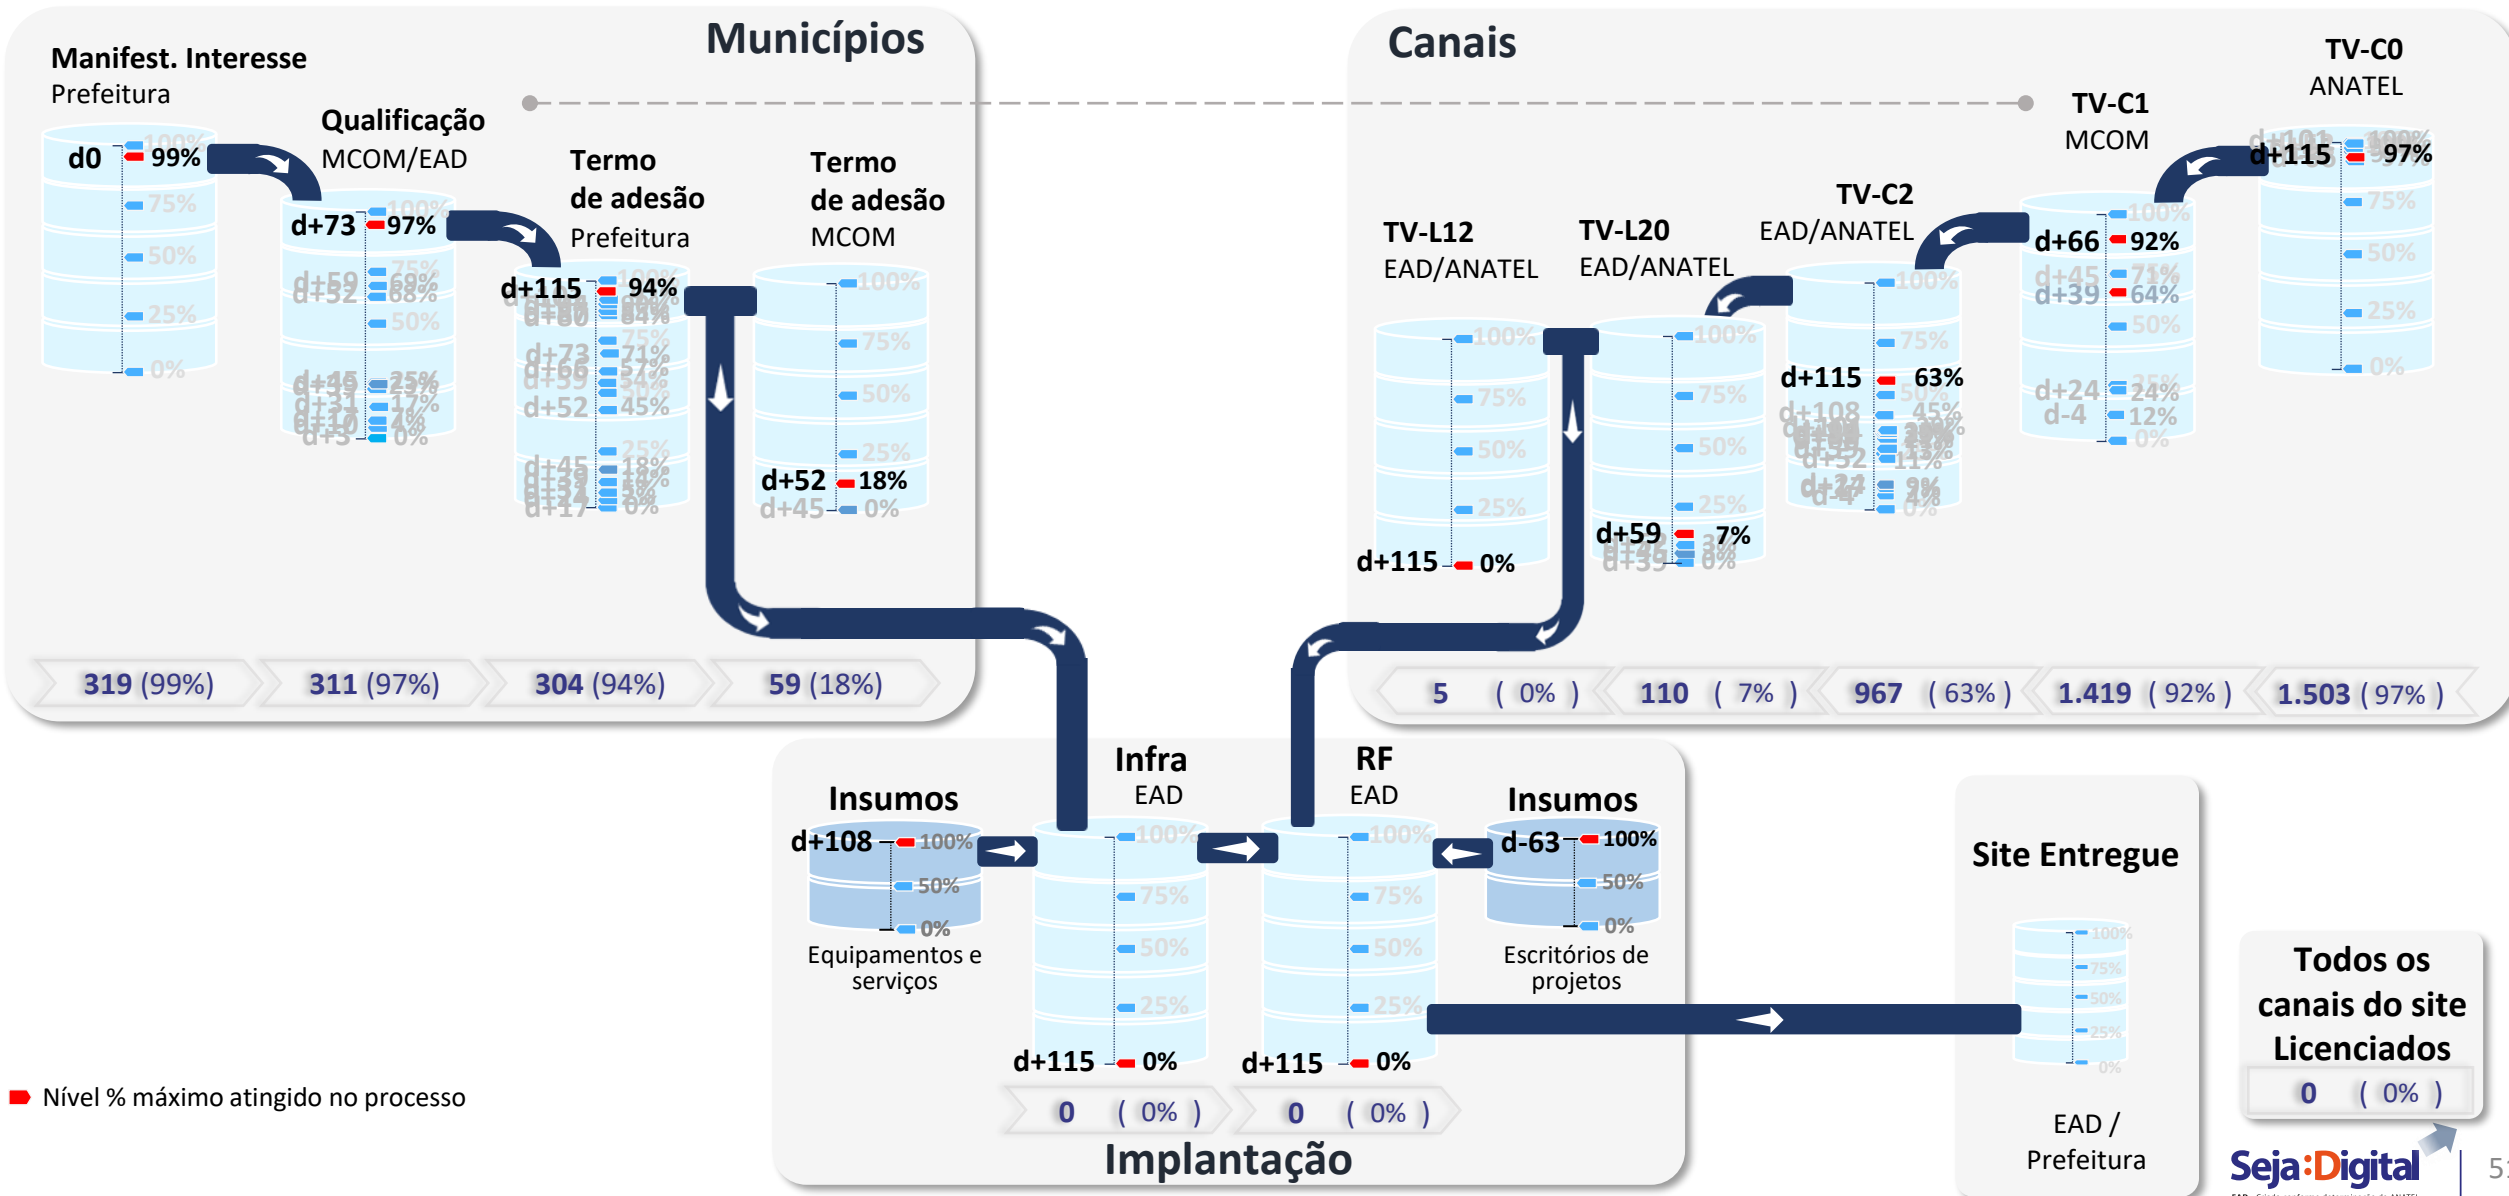

■ Nível % máximo atingido no processo


QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRA EM 08/OUT/21 = d0

31/Jan/22
Status d+115

Manifestação de interesse da entidade


Entidade



322 (100%)

VTA positiva da entidade manifestante


EAD



322 (100%)

Entidade manifestante qualificada


MCOM



316 (98%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD



317 (98%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = d0

31/Jan/22
Status d+115

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.3	Craíbas/AL	24.129	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	4	SIM	SIM
1.3	Traipu/AL	27.632	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	4	SIM	SIM
1.3	Lajedo do Tabocal/BA	8.546	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.3	Dois Riachos/AL	11.054	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Olho d'Água do Casado/AL	9.303	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Coaraci/BA	17.458	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Iguaracy/PE	12.209	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Cafarnaum/BA	18.356	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.3

31/Jan/22
Status d+115

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	AL	Ibateguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA	2	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.3	AL	Murici	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	2	STM 8	STM 5	NÃO	SIM
1.3	AL	Murici	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	30	STM 8	STM 5	NÃO	SIM
1.3	AL	Passo de Camaragibe	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO CAMARAGIBE	2	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.3	AL	Piranhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	8	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.3	AL	São Luís do Quitunde	TVF COMUNICACOES LTDA - ME	30	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	AL	Viçosa	TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA	2	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	AL	Viçosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	9	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	BA	Alcobaça	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	10	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	BA	Cachoeira	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	13	STM 8	STM 7	NÃO	SIM
1.3	BA	Castro Alves	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES	9	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	BA	Pintadas	TELEVISAO BAHIA S.A.	11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.3	PE	Belém de Maria	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA	4	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.3	PE	Bom Conselho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	2	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.3	PE	Bom Conselho	ELO COMUNICACAO LTDA	28	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.3	PE	Cortês	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES	2	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.3	PE	Glória do Goitá	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	30	STM 8	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	16	STM 9	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	16	STM 9	STM 6	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P2 • CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.3

31/Jan/22
Status d+115

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	PE	Paudalho	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	27	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Triunfo	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A EP	7	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.3	PE	Triunfo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	8	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.3	PE	Vicência	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S. A. (GLO	50	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Carira	TELEVISAO ATALAIA LTDA	21	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	SE	Carmópolis	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	16	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.3	SE	Gararu	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	2	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	SE	Itabaianinha	TELEVISAO ATALAIA LTDA	17	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Itabaianinha	TELEVISAO FENIX LTDA	49	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Neópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS	2	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Poço Redondo	TELEVISAO ATALAIA LTDA	38	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Poço Redondo	TELEVISAO FENIX LTDA	43	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Poço Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE	4	STM 8	STM 7	NÃO	SIM
1.3	SE	Riachão do Dantas	MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS	11	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Riachão do Dantas	MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS	13	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Riachão do Dantas	TELEVISAO ATALAIA LTDA	23	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Simão Dias	TELEVISAO ATALAIA LTDA	39	STM 7	STM 5	NÃO	SIM
1.3	SE	Simão Dias	TELEVISAO FENIX LTDA	47	STM 7	STM 5	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

Temos 60 entidades com manifestação de interesse e sem qualificação, na Fase 1.3.

P4 • CANAIS PENDENTES (1/2)

SEM VIABILIDADE - FASE 1.3

31/Jan/22
Status d+115

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	AL	Igreja Nova	FUNDACAO BRASIL ECOAR	46	STM 8	STM 7	SIM	SIM
1.3	AL	Murici	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	47	STM 8	STM 5	NÃO	SIM
1.3	AL	São Luís do Quitunde	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	49	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	AL	Teotônio Vilela	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	27	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Barra de Guabiraba	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	PE	Belém de Maria	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.3	PE	Caetés	NOSSO LAR SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA-ME	41	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.3	PE	Caetés	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.3	PE	Glória do Goitá	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 8	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	TV NEWS - CANAL BRASILEIRO DE COMUNICACAO L	21	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	REDE 21 COMUNICACOES S.A.	32	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME	41	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	TELEVISAO CIDADE MODELO LTDA	42	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	FUNDACAO DE APOIO A GERACAO, PRODUCAO, CRI	43	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Ibirajuba	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Palmares	REDE 21 COMUNICACOES S.A.	32	STM 13	STM 10	SIM	SIM
1.3	PE	Palmares	SISTEMA ASSOCIADO DE COMUNICACAO S.A.	48	STM 13	STM 10	SIM	SIM
1.3	PE	Palmares	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 13	STM 10	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P4 • CANAIS PENDENTES (2/2)

SEM VIABILIDADE - FASE 1.3

31/Jan/22
Status d+115

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	16	STM 9	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	21	STM 9	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Passira	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	43	STM 9	STM 8	SIM	SIM
1.3	PE	Paudalho	FUNDACAO VICENTE CAMPELO	16	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Paudalho	SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME	34	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Paudalho	TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA	36	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Primavera	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 8	STM 7	SIM	SIM
1.3	PE	São Benedito do Sul	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	São José do Egito	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	19	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Vertente do Lério	REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA	13	STM 4	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Vertente do Lério	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 4	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Vertentes	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Vicência	FUNDACAO DE APOIO A GERACAO, PRODUCAO, CRI	15	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Itabaianinha	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Nossa Senhora das Dores	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	SE	Poço Redondo	RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	9	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Itabi	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.


NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	BA	Curaçá	TELEVISAO BAHIA S.A.	31	STM 5	SIM	SIM
1.3	BA	Curaçá	TELEVISAO BAHIA S.A.	30	STM 5	SIM	SIM
1.3	BA	Pintadas	TELEVISAO BAHIA S.A.	32	STM 4	SIM	SIM
1.3	BA	Pintadas	TELEVISAO BAHIA S.A.	32	STM 4	SIM	SIM
1.3	PE	Custódia	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	48	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Custódia	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	46	STM 9	SIM	SIM

FLUXO | FASE 1.4 | MG

470 MUNICÍCIOS • 2.016 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

31/Jan/22
Status d+81

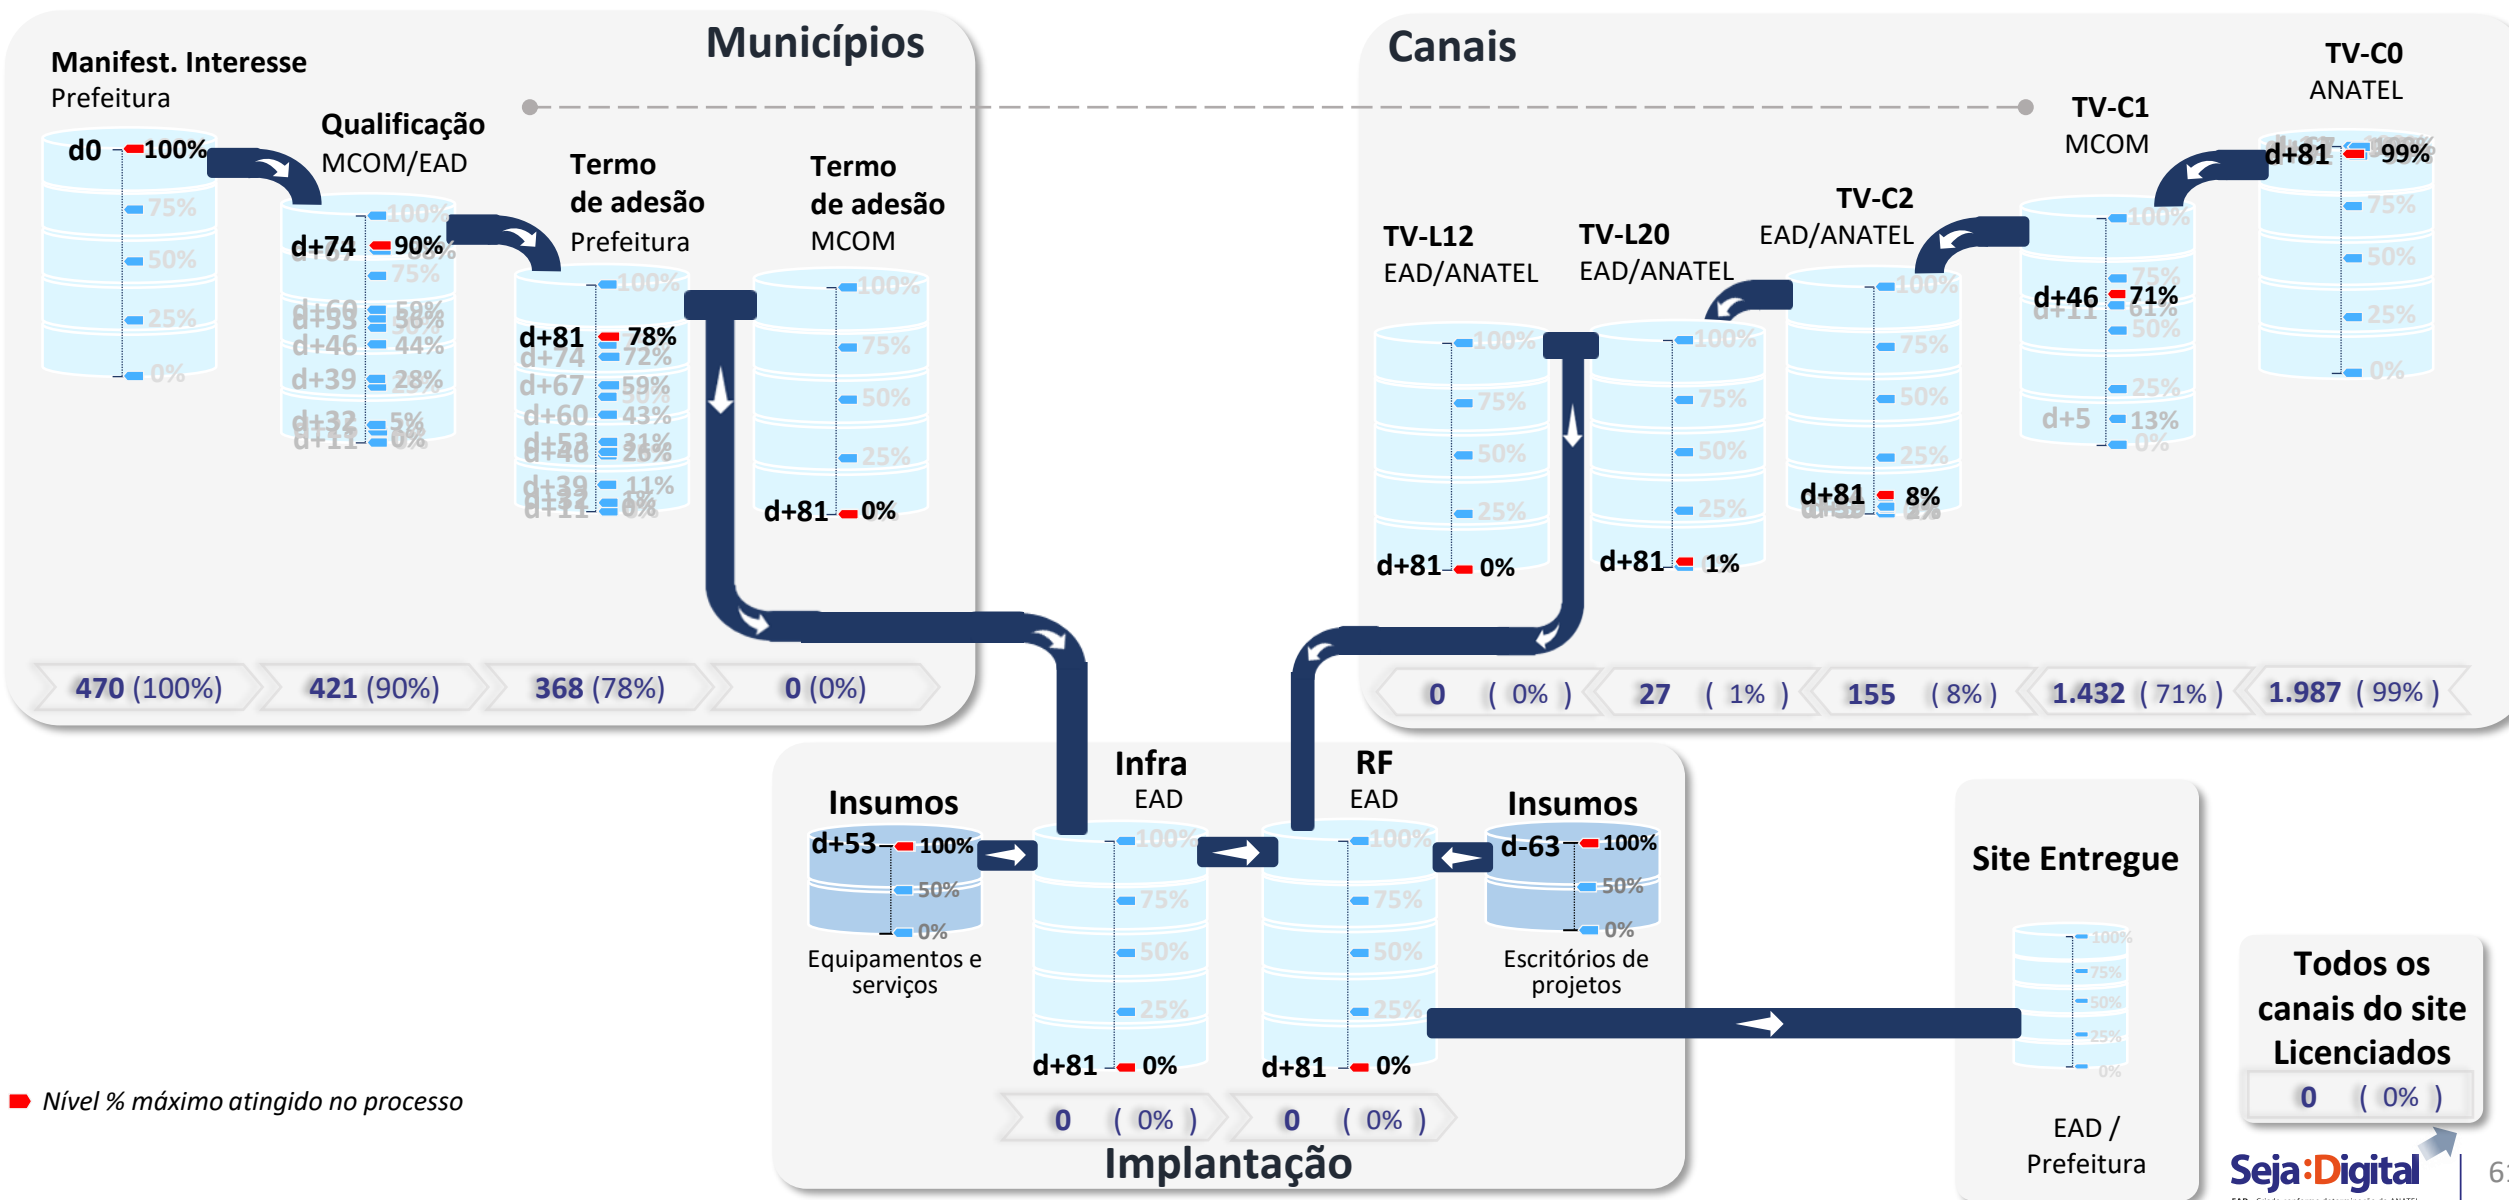

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO


FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.016 CANAIS • EDITAL ENCERRA EM 11/NOV/21 = d0

24/Jan/22

Status d+81

Manifestação de interesse da entidade


Entidade



466 (99%)

VTA positiva da entidade manifestante


EAD



466 (99%)

Entidade manifestante qualificada


MCOM



444 (94%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD



463 (99%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

31/Jan/22

Status d+81

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.4	Água Boa/MG	13.600	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	Pedras de Maria da Cruz/MG	11.453	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	São Romão/MG	12.139	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	Santo Antônio do Rio Abaixo/MG	1.770	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM

Além dos municípios acima, temos outros 22 com manifestação de interesse da entidade mas sem qualificação, na Fase 1.4.

Temos 117 entidades sem manifestação de interesse na Fase 1.4.

Temos 80 entidades com manifestação de interesse e sem qualificação, na Fase 1.4.

P4 • CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.4

31/Jan/22

Status d+81

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.4	MG	Arceburgo	FUNDACAO SECULO VINTE E UM	14	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Arceburgo	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DO SUDOES	45	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Paraisópolis	FUNDACAO SECULO VINTE E UM	2	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.4	MG	Pedralva	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	São Thomé das Letras	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Serrania	TELEVISAO SOCIEDADE LIMITADA	27	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Serrania	FUNDACAO TELEVISAO EDUCATIVA DE POCOS DE C	51	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Serrania	CAMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Cachoeira Dourada	REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA	13	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Cachoeira Dourada	RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA	30	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Campanário	MUNICIPIO DE CAMPANARIO	6	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Cordislândia	CAMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.4	MG	Itueta	MUNICIPIO DE ITUETA	9	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Moeda	CAMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Piedade de Ponte Nova	CAMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.4	MG	Pouso Alto	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	7	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.4	MG	Santo Antônio do Grama	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS G	16	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Soledade de Minas	TELEVISAO SUL DE MINAS S/A	9	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Carlos Chagas	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	6	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.4	MG	Itapeva	Televisão Sul de Minas S/A.	9	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Santo Antônio do Itambé	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GEST	45	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Santo Antônio do Itambé	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GEST	33	STM 6	STM 4	NÃO	SIM

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P6 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.4

31/Jan/22


Status d+81

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.4	MG	Miradouro	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	30	STM 5	SIM	SIM
1.4	MG	Miradouro	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	30	STM 5	SIM	SIM

FLUXO | FASE 2 | ES . RJ . PR . SC . RS

344 MUNICÍPIOS • 1.663 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JAN/22 = d0

31/Jan/22
Status d+10

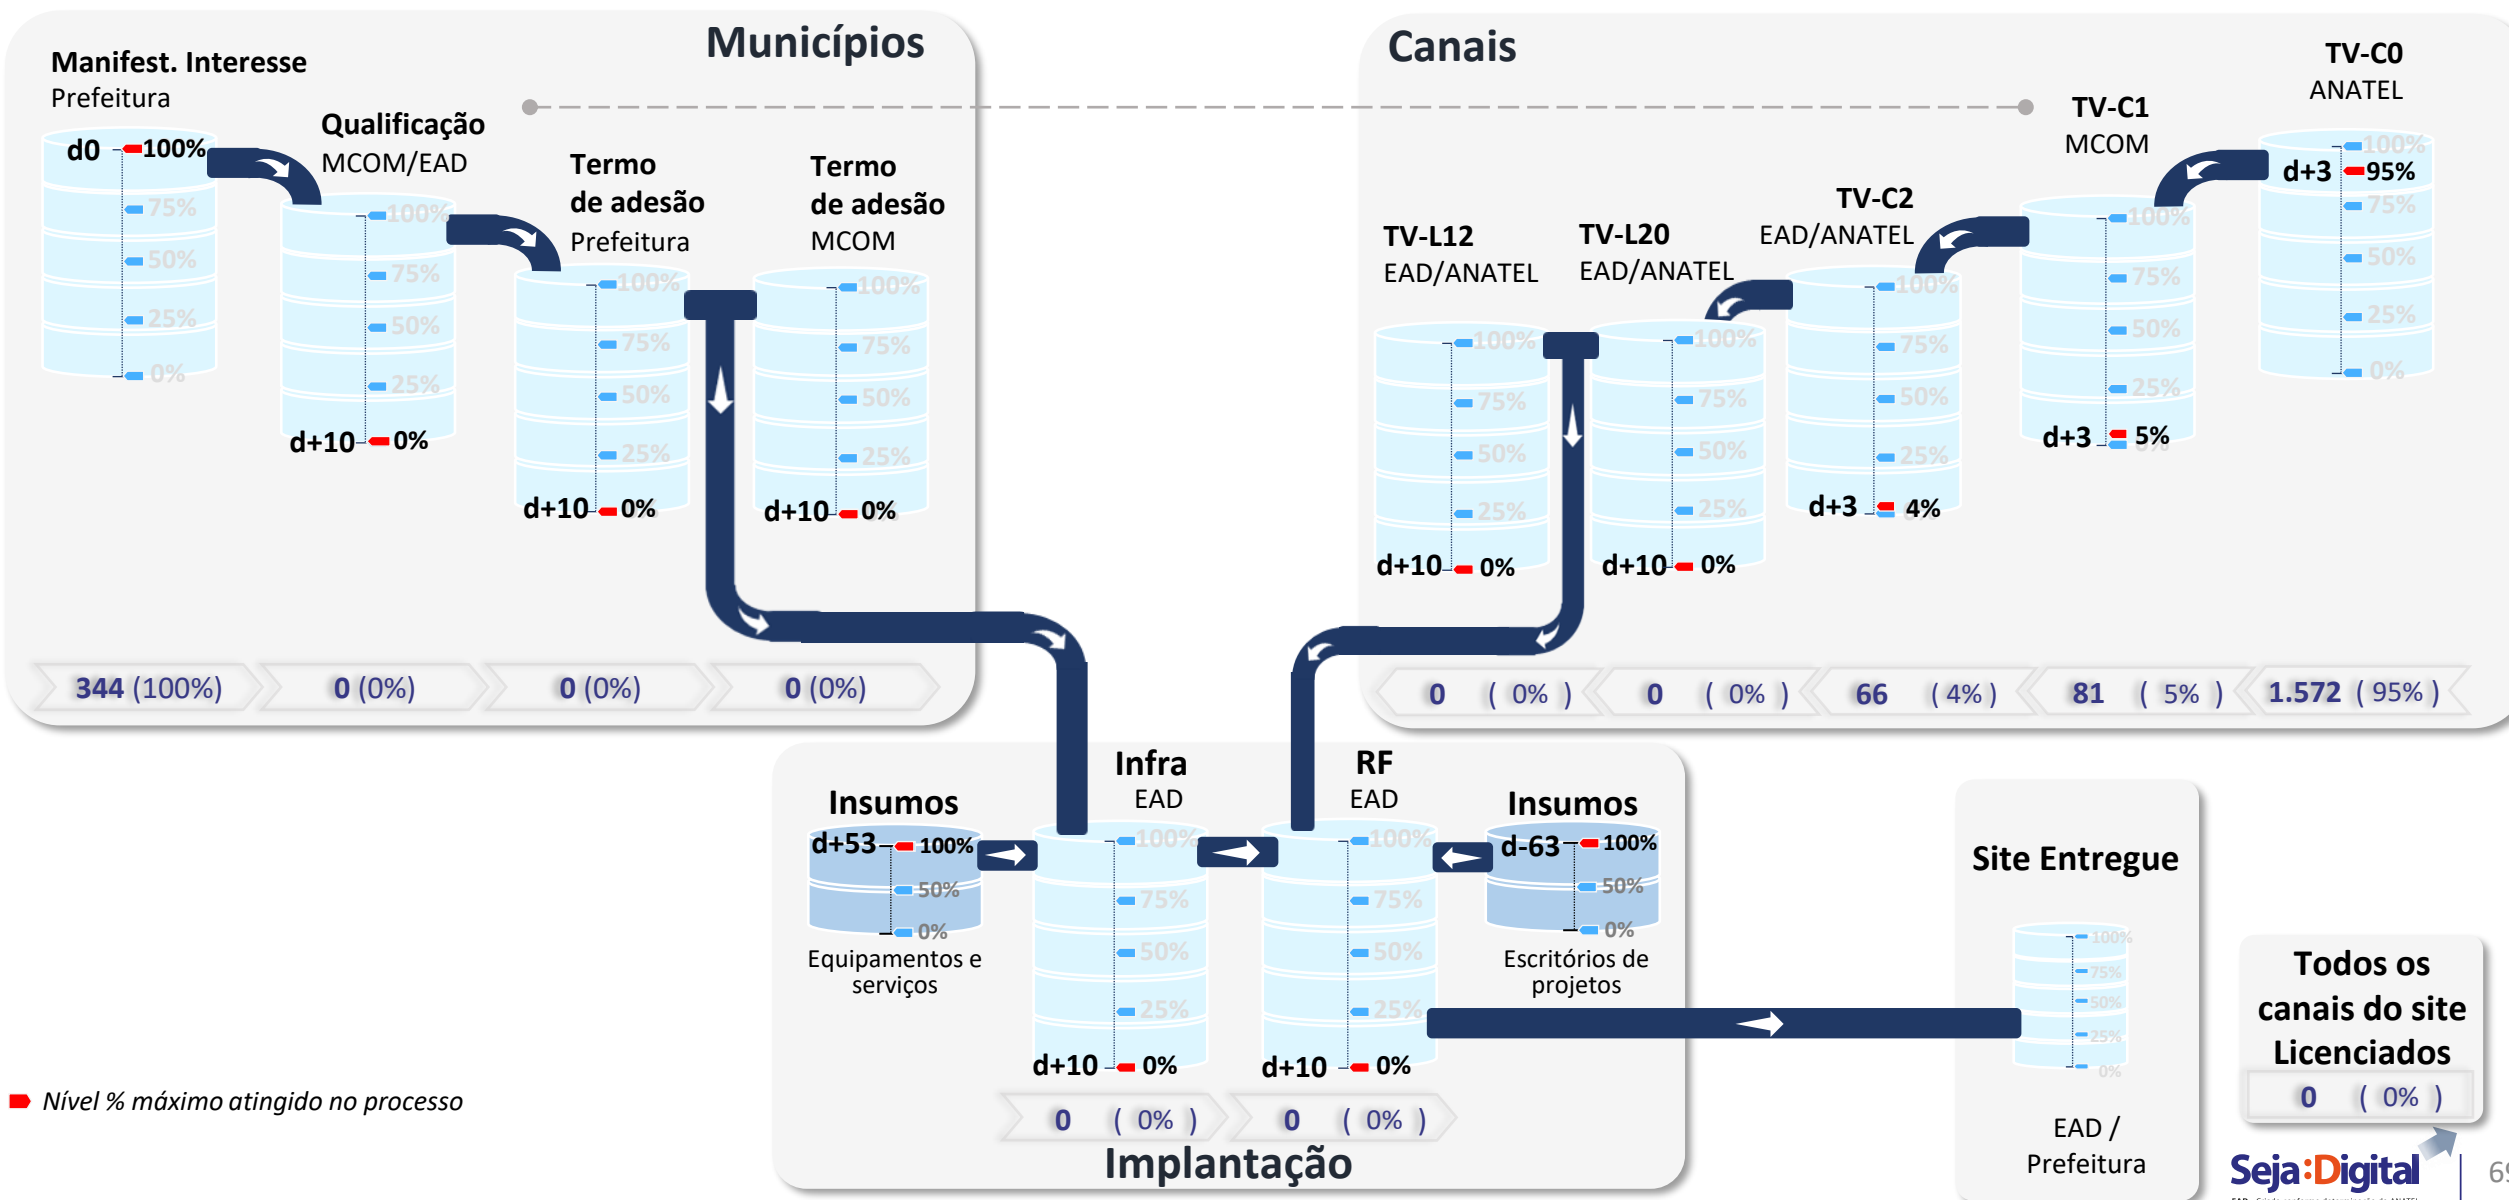

■ Nível % máximo atingido no processo

Todos os canais do site Licenciados
0 (0%)

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO


FASE 2 • 344 MUNICÍPIOS • 1.663 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JAN/22 = d0

31/Jan/22

Status d+10

Manifestação de interesse da entidade


Entidade



344 (100%)

VTA positiva da entidade manifestante


EAD



228 (66%)

Entidade manifestante qualificada


MCOM



28 (8%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD




0 (0%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo


FLUXO TIPO

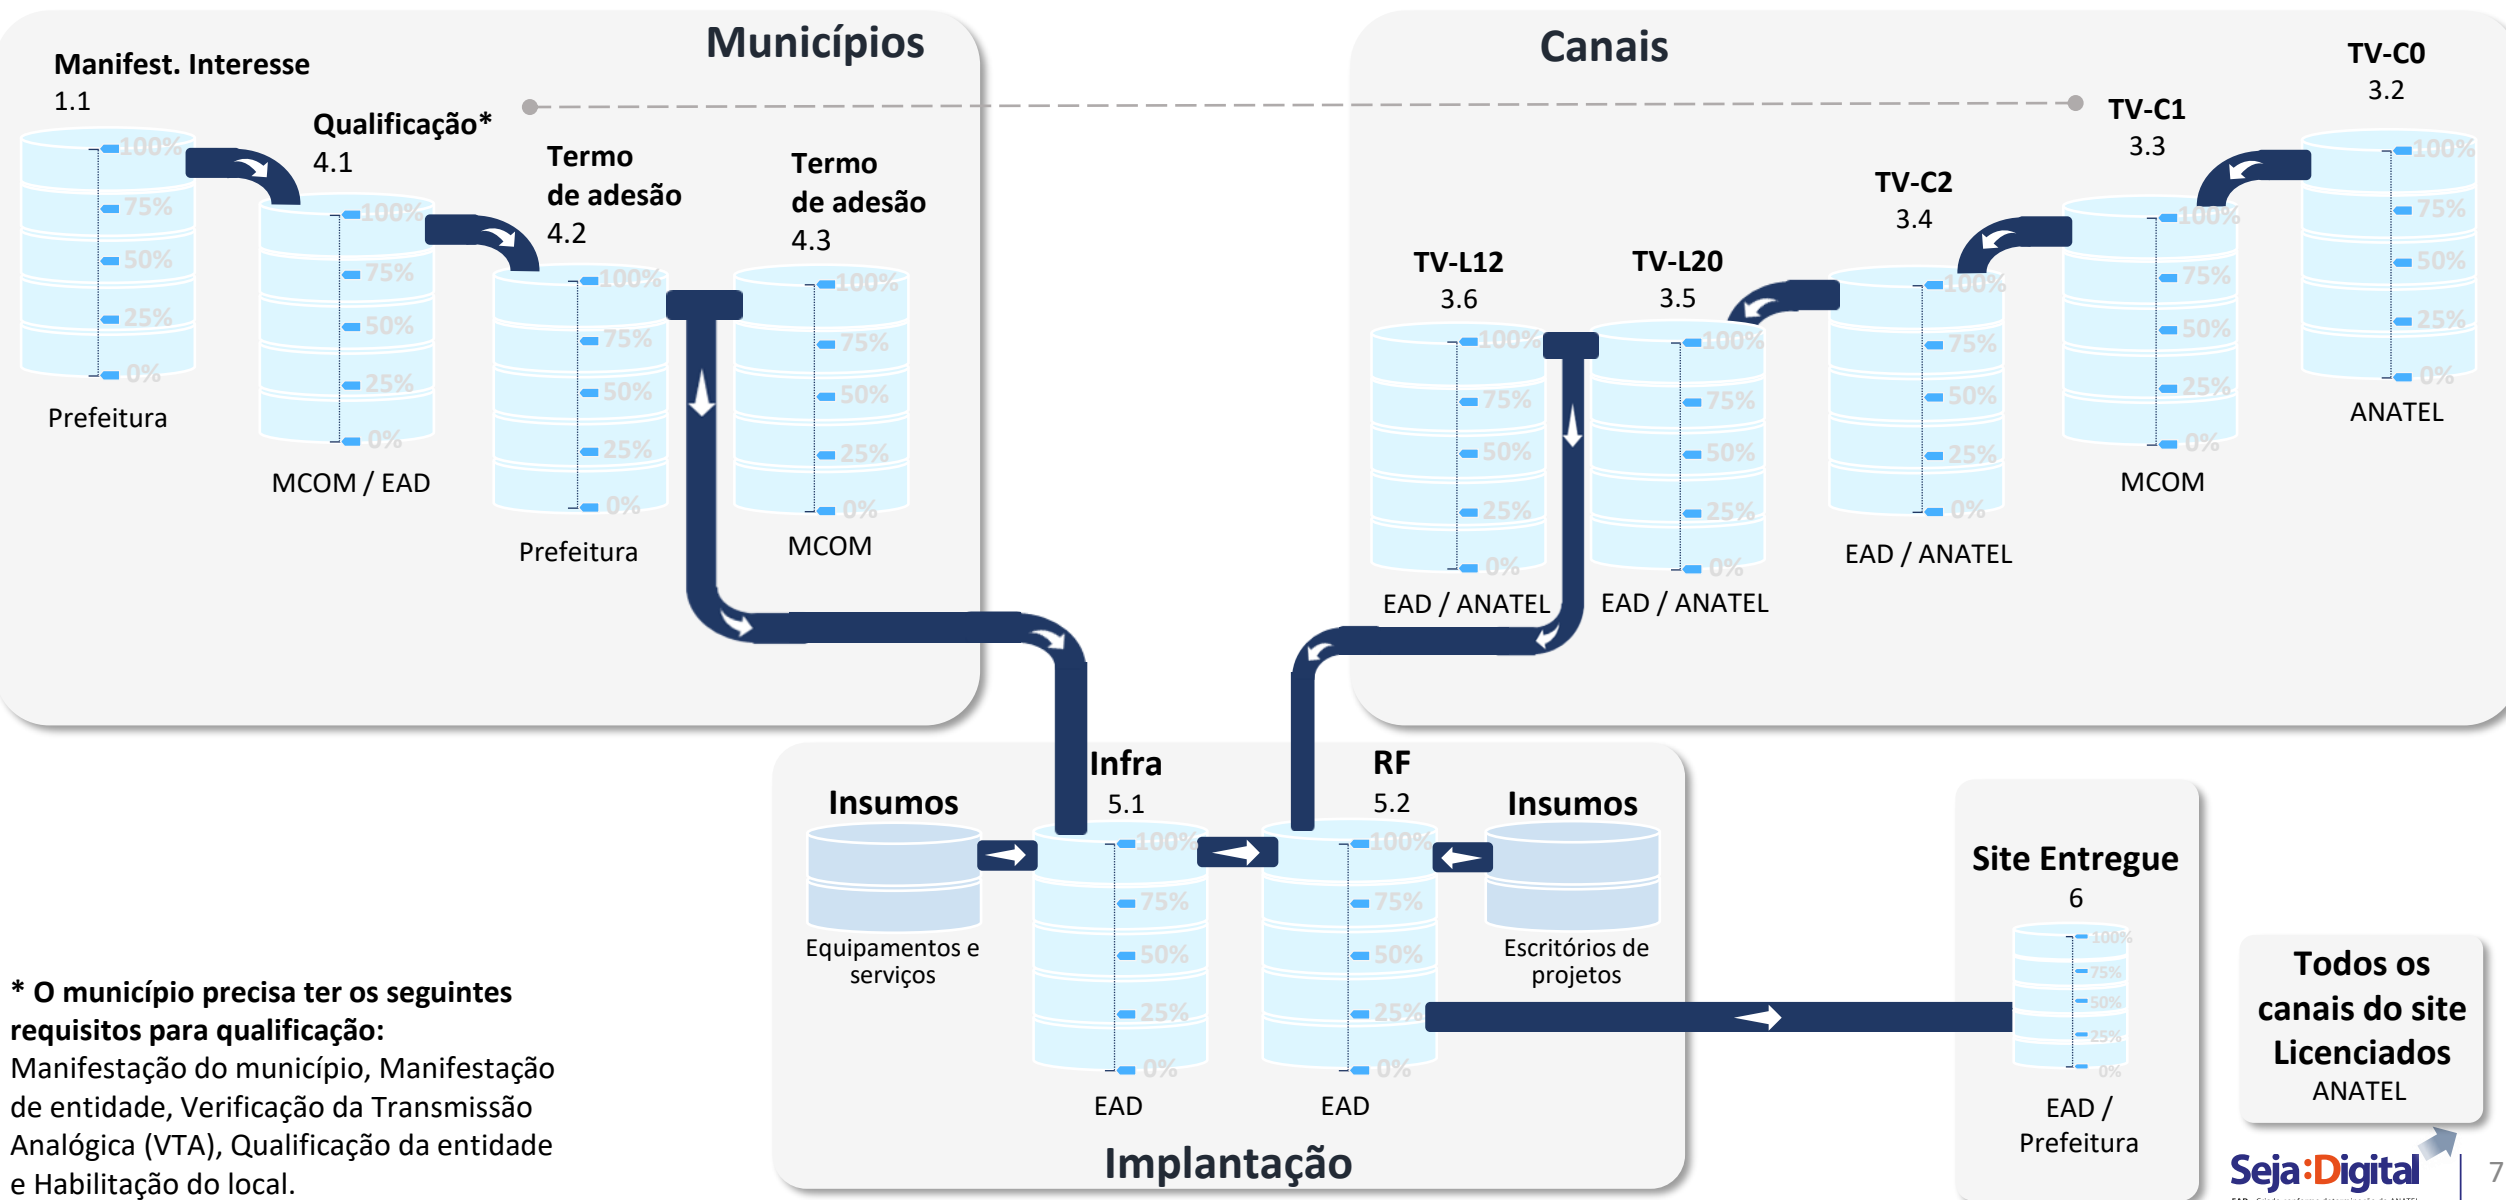

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Manifestação de
interesse da
entidade**


2.1



Entidade

**VTA positiva da
entidade
manifestante**


2.2



EAD

**Entidade
manifestante
qualificada**


2.3



MCOM

**Local
Habilitado**


1.2



Prefeitura / EAD

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

ESTEIRA

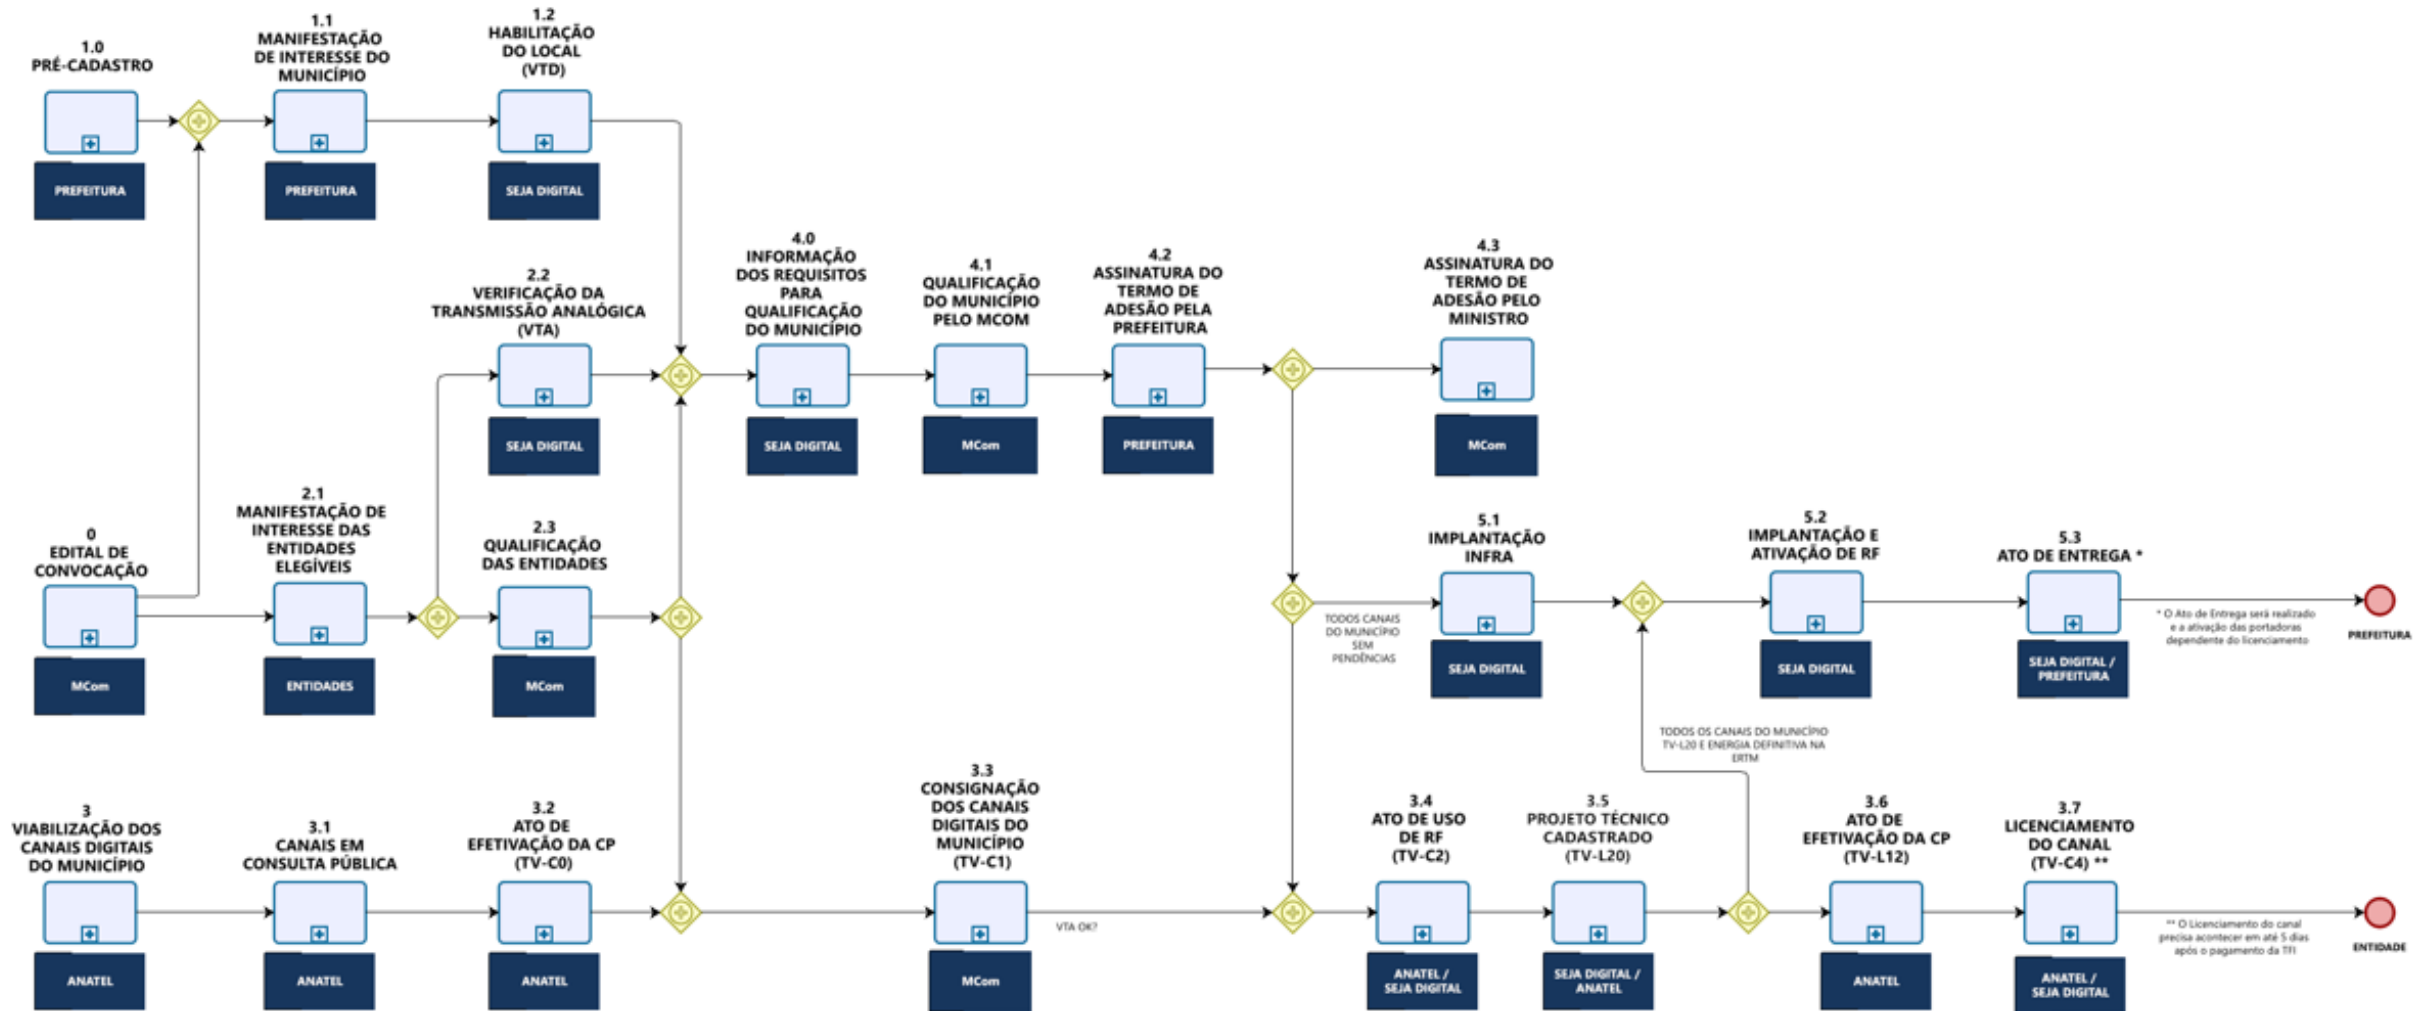

Seja:Digital 

EAD - Criada conforme determinação da ANATEL
