

# RELATÓRIO SEMANAL

---

28.Fev.22

		Acumulado dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	
INFRA	GIRED (Infra) - Fase 1.1 + 1.2	204	11			215
	Programado	199	21	1	0	221
	Pendência Pós TA Assinado (PPTA)	5	0	0	0	5
	Realizado (Infra)	196	16	9	0	221
RF	GIRED (RF) - Fase 1.1 + 1.2	24	35	92	32	183
	Programado	25	35	89	54	203
	Pendência Pós TA Assinado (PPTA)	0	0	4	1	5
	Realizado (RF)	25	19	39	0	83

	INFRA					RF					TOTAL
	Realizado	Programada	PPTA	DR4	Com pendência	Realizado	Programadas	PPTA	DR4	Pendência ou sem L20	
CE	48	0	0	0	0	27	18	0	0	3	48
PI	16	0	0	1	0	14	2	0	1	0	17
RN	29	0	0	2	1	17	12	0	2	1	32
PB	74	0	1	15	4	11	57	1	15	10	94
MA	54	0	4	6	3	14	31	4	6	12	67
TOTAL	221	0	5	24	8	83	120	5	24	26	258

Nota: a programação de RF não considera o status dos canais da TV Câmara.

# VISÃO EXECUTIVA

## FASES 1.3 E 1.4 – INFRAESTRUTURA

28/Fev/22

		Acumulado Dez/21	jan/22	fev/22	Acumulado Fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total
Municípios com entidade elegível qualificada	Previsto	431	221	140	792											792
	Real	574	175	15	764											764
Fase 1.3	Previsto	281	41	0	322											322
	Real	311	1	4	316											316
Fase 1.4	Previsto	150	180	140	470											470
	Real	263	174	11	448											448
T.A. assinado	Previsto	200	220	232	652	140										792
	Real	420	252	72	744											744
Fase 1.3	Previsto	200	70	52	322											322
	Real	275	29	4	308											308
Fase 1.4	Previsto	0	150	180	330	140										470
	Real	145	223	68	436											436
Município com infra programável (TA-A & s/ P1-P6 & s/P2-P5 se especial)	Previsto	150	50	120	320	217	205	50								792
	Real	243	387	102	732											732
Fase 1.3	Previsto	150	50	70	270	52										322
	Real	243	38	20	301											301
Fase 1.4	Previsto	0	0	50	50	165	205	50								470
	Real	0	349	82	431											431
Infra concluída (TA + premissas) - GIREC	Previsto			0	0	100	140	140	140	50	50	50	50	50		770
	Real			5	5											5
Fase 1.3	Previsto			0	0	60	90	90	90							330
	Real			0	0											0
Fase 1.4	Previsto			0	0	40	50	50	50	50	50	50	50	50		440
	Real			5	5											5

# VISÃO EXECUTIVA

## FASES 1.3 E 1.4 – REGULATÓRIO

28/Fev/22

		Acumulado Dez/21	jan/22	fev/22	Acumulado Fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total
Todos os canais dos municípios em TV-C1 (municípios com infra planejada para conclusão)	Previsto		100	140	240	140	140	50	50	50	50					960
	Real		79	91	170											340
Fase 1.3	Previsto		60	90	150	90	90									480
	Real		1	40	41											82
Fase 1.4	Previsto		40	50	90	50	50	50	50	50	50					480
	Real		78	51	129											258
Todos os canais dos municípios em TV-C2 (municípios com infra planejada para conclusão)	Previsto			100	100	140	140	140	50	50	50	50				820
	Real		0	31	31											62
Fase 1.3	Previsto			60	60	90	90	90								390
	Real		0	1	1	36										38
Fase 1.4	Previsto			40	40	50	50	50	50	50	50	50	50			480
	Real		0	30	30	15										75
Todos os canais dos municípios em TV-L20 (municípios com infra concluída)	Previsto				0	100	140	140	140	50	50	50	50	50		770
	Real		0	0	0											0
Fase 1.3	Previsto				0	60	90	90	90							330
	Real		0		0	1	15									16
Fase 1.4	Previsto				0	40	50	50	50	50	50	50	50	50		440
	Real		0	0	0	19	2									21
Entrega (Infra + RF)	Previsto				0		100	140	140	140	50	50	50	50	50	770
	Real		0		0											0
Fase 1.3	Previsto				0		60	90	90	90						330
	Real		0		0											0
Fase 1.4	Previsto				0		40	50	50	50	50	50	50	50	50	440
	Real		0		0											0

# ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

28/Fev/22

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

### CEARÁ

48 municípios

INFRA				
Realizado	Programada	PPTA	DR4	Com pendência
48	0	0	0	0

RF				
Realizado	Programadas	PPTA	DR4	Pendência ou sem L20
27	18	0	0	3

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Abaiara	Realizado	11-nov-21	Sim	Realizado	2-dez-21
Aiuaba	Realizado	31-out-21	Sim	Realizado	6-dez-21
Alcântaras	Realizado	24-out-21	Sim	Realizado	3-fev-22
Altaneira	Realizado	28-nov-21	Sim	Realizado	16-jan-22
Antonina do Norte	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	2-fev-22
Araripe	Realizado	31-out-21	Sim	Realizado	28-jan-22
Aratuba	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	27-jan-22
Arneiroz	Realizado	5-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Assaré	Realizado	8-nov-21	Sim	--	5-fev-22
Baixio	Realizado	8-nov-21	--	--	28-fev-22
Capistrano	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	26-jan-22
Catarina	Realizado	11-nov-21	--	--	9-fev-22
Chaval	Realizado	15-out-21	Sim	Realizado	5-fev-22
Choró	Realizado	30-jan-22	--	--	28-fev-22
Farias Brito	Realizado	4-nov-21	Sim	Realizado	20-jan-22
Fortim	Realizado	27-out-21	Sim	Realizado	8-dez-21
General Sampaio	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	31-jan-22
Granjeiro	Realizado	8-nov-21	Sim	Realizado	14-jan-22
Guaraciaba do Norte	Realizado	8-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Hidrolândia	Realizado	30-jan-22	--	--	28-fev-22
Ibiapina	Realizado	23-out-21	Sim	Realizado	15-dez-21
Independência	Realizado	20-out-21	Sim	--	14-fev-22
Ipaumirim	Realizado	18-out-21	--	--	28-fev-22
Itaíba	Realizado	24-out-21	Sim	Realizado	7-dez-21
Itapiúna	Realizado	12-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Itatira	Realizado	21-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Jaguaretama	Realizado	17-out-21	Sim	--	13-fev-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Jaguaribara	Realizado	5-nov-21	Sim	Realizado	14-dez-21
Jati	Realizado	11-nov-21		Realizado	21-jan-22
Lavras da Mangabeira	Realizado	9-nov-21	Sim	Realizado	3-dez-21
Meruoca	Realizado	27-nov-21	Sim	S/P	FR
Mulungu	Realizado	25-out-21	Sim	Realizado	29-jan-22
Nova Russas	Realizado	23-out-21	Sim	S/P	FR
Novo Oriente	Realizado	5-nov-21	Sim	--	15-fev-22
Ocara	Realizado	12-nov-21	Sim	Realizado	7-fev-22
Orós	Realizado	22-out-21		--	12-fev-22
Pacujá	Realizado	30-out-21	Sim	Realizado	2-fev-22
Parambu	Realizado	12-nov-21	Sim	--	16-fev-22
Pedra Branca	Realizado	1-fev-22	Sim	S/P	FR
Penaforte	Realizado	16-out-21	Sim	Realizado	30-nov-21
Pereiro	Realizado	15-out-21	Sim	Realizado	4-dez-21
Poranga	Realizado	22-out-21	Sim	--	9-fev-22
Porteiras	Realizado	22-out-21	Sim	Realizado	28-nov-21
Potengi	Realizado	29-out-21	Sim	Realizado	1-fev-22
Saboeiro	Realizado	25-out-21	Sim	--	31-jan-22
Santana do Cariri	Realizado	5-nov-21	Sim	Realizado	29-jan-22
São Luís do Curu	Realizado	12-nov-21		--	28-fev-22
Umari	Realizado	18-out-21	Sim	Realizado	17-dez-21

# ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

28/Fev/22

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

### PIAUI

17 municípios

INFRA				
Realizado	Programada	PPTA	DR4	Com pendência
16	0	0	1	0

RF				
Realizado	Programadas	PPTA	DR4	Pendência ou sem L20
14	2	0	1	0

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Alto Longá	Realizado	23-out-21	Sim	Realizado	31-jan-22
Avelino Lopes	Realizado	25-out-21	Sim	Realizado	4-fev-22
Barro Duro	Realizado	22-out-21	Sim	Realizado	28-jan-22
Beneditinos	Realizado	23-out-21	Sim	Realizado	17-dez-21
Bertolândia	Realizado	14-nov-21	Sim	Realizado	19-fev-22
Capitão de Campos	Realizado	4-nov-21	Sim	Realizado	14-dez-21
Flores do Piauí	Realizado	21-out-21	Sim	Realizado	5-fev-22
Fronteiras	Realizado	8-nov-21	Sim	--	15-fev-22
Gilbués	Realizado	19-out-21	Sim	Realizado	9-dez-21
Inhuma	S/P	P1		S/P	FR
Manoel Emídio	Realizado	17-nov-21	Sim	Realizado	19-fev-22
Pedro II	Realizado	28-out-21	Sim	Realizado	8-fev-22
Pio IX	Realizado	10-nov-21	Sim	--	14-fev-22
Porto	Realizado	4-nov-21	Sim	Realizado	26-jan-22
Santa Filomena	Realizado	19-out-21	Sim	Realizado	10-dez-21
Simplício Mendes	Realizado	11-nov-21	Sim	Realizado	2-fev-22
Várzea Grande	Realizado	8-nov-21	Sim	Realizado	9-fev-22

# ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

28/Fev/22

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

### RIO GRANDE DO NORTE

32 municípios

INFRA				
Realizado	Programada	PPTA	DR4	Com pendência
29	0	0	2	1

RF				
Realizado	Programadas	PPTA	DR4	Pendência ou sem L20
17	12	0	2	1

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Alexandria	Realizado 10-nov-21	Sim	Realizado 14-dez-21
Almino Afonso	Realizado 31-jan-22	Sim	-- 28-fev-22
Angicos	Realizado 27-out-21	Sim	Realizado 9-fev-22
Augusto Severo	Realizado 29-out-21	Sim	Realizado 4-fev-22
Baía Formosa	Realizado 12-nov-21	Sim	Realizado 18-dez-21
Barcelona	Realizado 12-nov-21	Sim	Realizado 16-jan-22
Bento Fernandes	Realizado 16-nov-21	Sim	Realizado 8-dez-21
Caiçara do Rio do Vento	Realizado 15-nov-21	Sim	-- 31-jan-22
Canguaretama	Realizado 6-dez-21	Sim	-- 28-fev-22
Coronel João Pessoa	Realizado 31-out-21	Sim	Realizado 15-dez-21
Doutor Severiano	Realizado 29-out-21	Sim	-- 14-fev-22
Frutuoso Gomes	S/P P1		S/P FR
Governador Dix-Sept Rosado	Realizado 31-out-21	Sim	-- 28-fev-22
Guamaré	Realizado 4-dez-21		-- 28-fev-22
Itaú	S/P P1		S/P P2 / FR
Lagoa de Velhos	Realizado 17-nov-21	Sim	Realizado 11-fev-22
Lagoa Nova	S/P P1		S/P FR
Montanhas	Realizado 8-fev-22		-- 28-fev-22
Pedra Preta	Realizado 12-nov-21		-- 31-jan-22
Pedro Avelino	Realizado 25-out-21	Sim	-- 28-fev-22
Pedro Velho	Realizado 12-nov-21	Sim	-- 7-fev-22
Portalegre	Realizado 31-out-21	Sim	-- 13-fev-22
Rafael Fernandes	Realizado 11-nov-21	Sim	-- 31-jan-22
Rafael Godeiro	Realizado 10-nov-21	Sim	Realizado 15-dez-21
Santo Antônio	Realizado 10-nov-21	Sim	Realizado 17-dez-21
São Bento do Trairí	Realizado 25-nov-21	Sim	Realizado 10-dez-21
São João do Sabugi	Realizado 11-nov-21	Sim	-- 15-fev-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Serra Negra do Norte	Realizado 12-nov-21	Sim	Realizado 11-dez-21
Serrinha	Realizado 11-nov-21	Sim	-- 28-fev-22
Tenente Ananias	Realizado 2-mai-21	Sim	Realizado 7-mai-21
Touros	Realizado 9-nov-21	Sim	Realizado 26-nov-21
Umarizal	Realizado 30-out-21	Sim	-- 28-fev-22

# ENTREGAS | FASE 1.2 (1/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

## PARAÍBA (1/2)

94 municípios

INFRA				
Realizado	Programada	PPTA	DR4	Com pendência
74	0	1	15	4

RF				
Realizado	Programadas	PPTA	DR4	Pendência ou sem L20
11	57	1	15	10

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Água Branca	Realizado	29-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Aguiar	Realizado	25-nov-21	Sim	Realizado	27-jan-22
Alagoa Grande	Realizado	10-dez-21	--	--	28-fev-22
Alagoinha	Realizado	21-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Alcantil	Realizado	12-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Algodão de Jandaíra	Realizado	6-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Araruna	Realizado	19-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Areia	S/P	P2 / P3		S/P	P2 / P3 / FR
Aroeiras	Realizado	22-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Bananeiras	S/P	P1		S/P	P3 / FR
Barra de Santa Rosa	Realizado	1-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Barra de Santana	Realizado	19-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Belém	S/P	P1		S/P	FR
Boa Ventura	Realizado	15-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Bonito de Santa Fé	S/P	P1		S/P	FR
Brejo do Cruz	Realizado	4-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Caaporã	S/P	P1	Sim	S/P	P2 / FR
Cacimba de Dentro	S/P	P1		S/P	FR
Camalaú	Realizado	15-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Casserengue	S/P	P1		S/P	FR
Catingueira	Realizado	9-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Conceição	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Condado	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Coremas	Realizado	9-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Cubati	Realizado	9-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Curral Velho	Realizado	30-nov-21	Sim	Realizado	24-fev-22
Dona Inês	Realizado	8-dez-21	Sim	--	31-mar-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Duas Estradas	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Fagundes	PPTA	15-nov-21	Sim	PPTA	31-mar-22
Frei Martinho	Realizado	30-nov-21	Sim	Realizado	1-fev-22
Gado Bravo	Realizado	1-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Gurinhém	Realizado	26-nov-21	Sim	S/P	P3 / FR
Gurjão	Realizado	5-dez-21	Sim	Realizado	26-jan-22
Igaracy	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Imaculada	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Ingá	Realizado	19-nov-21		--	31-mar-22
Itabaiana	Realizado	8-fev-22	Sim	--	31-mar-22
Itatuba	Realizado	29-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Jericó	S/P	P1		S/P	FR
Juarez Távora	Realizado	20-nov-21	Sim	S/P	FR
Juazeirinho	Realizado	1-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Junco do Seridó	Realizado	25-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Juru	Realizado	27-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Lagoa	Realizado	19-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Lagoa de Dentro	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Livramento	S/P	P1		S/P	FR
Logradouro	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Malta	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Mataraca	Realizado	4-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Matinhas	Realizado	4-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Monte Horebe	Realizado	10-dez-21	Sim	Realizado	26-fev-22
Ouro Velho	Realizado	29-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Paulista	Realizado	15-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Piancó	Realizado	19-dez-21	Sim	--	31-mar-22

S/P - Sem previsão; E/P - Em programação; FQ - Fluxo qualificador; FR - Fluxo regulatório; P1 - Pendência do município; P2/P3/P4/P5 - pendência de canal; PPTA - Pendência Pós Termo de Adesão



# ENTREGAS | FASE 1.2 (2/4)

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

### PARAÍBA (2/2)

94 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Picuí	Realizado	4-fev-22	Sim	--	31-mar-22
Pilar	S/P	P1		S/P	FR
Pilões	Realizado	22-nov-21	Sim	Realizado	29-jan-22
Pitimbu	Realizado	27-jan-22	Sim	--	31-mar-22
Pocinhos	Realizado	4-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Prata	Realizado	29-nov-21	Sim	Realizado	22-fev-22
Princesa Isabel	Realizado	22-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Queimadas	Realizado	8-fev-22	Sim	S/P	P2 / P3 / FR
Remígio	Realizado	12-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Riachão	Realizado	21-nov-21		S/P	FR
Riacho dos Cavalos	Realizado	19-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Rio Tinto	Realizado	3-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Salgadinho	Realizado	18-nov-21	Sim	Realizado	31-jan-22
Salgado de São Félix	Realizado	12-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Santa Cruz	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Santa Luzia	Realizado	14-fev-22	Sim	--	31-mar-22
Santa Teresinha	Realizado	21-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Santana de Mangueira	Realizado	25-nov-21	Sim	Realizado	25-fev-22
Santo André	Realizado	29-nov-21	Sim	--	31-mar-22
São Bentinho	Realizado	12-dez-21	Sim	--	31-mar-22
São Bento	Realizado	27-jan-22	Sim	--	31-mar-22
São Francisco	Realizado	10-dez-21		--	14-jan-22
São José da Lagoa Tapada	Realizado	21-nov-21	Sim	--	31-mar-22
São José de Piranhas	S/P	P1		S/P	P2 / FR
São José do Brejo do Cruz	Realizado	4-dez-21	Sim	--	31-mar-22
São José dos Ramos	S/P	P1		S/P	P2 / P4 / FR
São Mamede	Realizado	19-dez-21	Sim	--	31-mar-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
São Sebastião do Umbuzeiro	Realizado	7-dez-21	Sim	Realizado	23-fev-22
São Vicente do Seridó	Realizado	27-nov-21	Sim	--	31/03/22
Serra Branca	Realizado	28-jan-22	Sim	--	31/03/22
Serra Grande	S/P	P1		S/P	FR
Serraria	Realizado	29-nov-21	Sim	--	31/03/22
Sertãozinho	S/P	P1		S/P	FR
Soledade	Realizado	1-dez-21	Sim	S/P	FR
Sumé	Realizado	4-fev-22	Sim	S/P	FR
Tacima	Realizado	20-nov-21	Sim	--	31/03/22
Taperoá	Realizado	5-dez-21	Sim	--	31/03/22
Teixeira	Realizado	27-jan-22	Sim	--	31/03/22
Uiraúna	Realizado	10-dez-21	Sim	--	31/03/22
Vista Serrana	Realizado	7-dez-21	Sim	Realizado	28-jan-22

S/P - Sem previsão; E/P - Em programação; FQ - Fluxo qualificador; FR - Fluxo regulatório; P1 - Pendência do município; P2/P3/P4/P5 - pendência de canal; PPTA - Pendência Pós Termo de Adesão

# ENTREGAS | FASE 1.2 (3/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

## MARANHÃO (1/2)

67 municípios

INFRA				
Realizado	Programada	PPTA	DR4	Com pendência
54	0	4	6	3

RF				
Realizado	Programadas	PPTA	DR4	Pendência ou sem L20
14	31	4	6	12

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Altamira do Maranhão	Realizado 18-dez-21	Sim	-- 28-fev-22
Alto Parnaíba	Realizado 3-fev-22	Sim	-- 28/02/22
Anajatuba	Realizado 19-dez-21	Sim	S/P FR
Araguanã	Realizado 13-dez-21	Sim	-- 28/02/22
Arari	Realizado 19-dez-21		S/P FR
Axixá	Realizado 18-dez-21	Sim	-- 28/02/22
Barão de Grajaú	Realizado 8-dez-21	Sim	Realizado 25/02/22
Barreirinhas	Realizado 18-fev-22	Sim	Realizado 22/02/22
Bequimão	Realizado 16-dez-21	Sim	Realizado 16/02/22
Buritcupu	PPTA 25-nov-21		PPTA 28/02/22
Cajapió	Realizado 13-dez-21	Sim	Realizado 15/02/22
Campestre do Maranhão	Realizado 19-dez-21	Sim	-- 28/02/22
Cedral	Realizado 18-nov-21	Sim	Realizado 19/02/22
Centro do Guilherme	Realizado 28-nov-21	Sim	Realizado 25/02/22
Coelho Neto	Realizado 29-dez-21	Sim	Realizado 07/02/22
Conceição do Lago-Açu	PPTA 6-dez-21		PPTA 28/02/22
Cururupu	Realizado 29-nov-21	Sim	Realizado 18/02/22
Gonçalves Dias	S/P P1	Sim	S/P FR
Governador Archer	Realizado 7-dez-21	Sim	S/P FR
Governador Luiz Rocha	PPTA 7-dez-21		PPTA 28/02/22
Guimarães	Realizado 12-dez-21	Sim	-- 28/02/22
Humberto de Campos	Realizado 14-nov-21	Sim	Realizado 27/02/22
Itapecuru Mirim	Realizado 19-dez-21	Sim	Realizado 18/02/22
Joselândia	Realizado 26-dez-21	Sim	S/P FR
Lago do Junco	Realizado 6-dez-21	Sim	-- 28-fev-22
Lago dos Rodrigues	Realizado 18-dez-21	Sim	-- 28-fev-22
Lagoa Grande do Maranhão	Realizado 19-dez-21	Sim	-- 28/02/22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)	Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)
Lima Campos	Realizado 19-dez-21	Sim	-- 28-fev-22
Magalhães de Almeida	S/P P1		S/P FR
Marajá do Sena	S/P P1		S/P FR
Maranhãozinho	Realizado 18-dez-21	Sim	Realizado 26-fev-22
Mata Roma	S/P P1		S/P FR
Mirador	S/P P1		S/P FR
Miranda do Norte	Realizado 28-nov-21	Sim	Realizado 19-fev-22
Mirinzal	Realizado 24-jan-22	Sim	-- 28-fev-22
Montes Altos	Realizado 26-dez-21	Sim	-- 28-fev-22
Morros	PPTA 20-dez-21		PPTA 28-fev-22
Nina Rodrigues	Realizado 18-nov-21	Sim	-- 28-fev-22
Nova Olinda do Maranhão	Realizado 12-dez-21	Sim	-- 28-fev-22
Olinda Nova do Maranhão	Realizado 16-dez-21	Sim	S/P FR
Palmeirândia	Realizado 25-nov-21	Sim	-- 28-fev-22
Passagem Franca	Realizado 31-jan-22	Sim	S/P P2 / FR
Paulo Ramos	Realizado 9-dez-21	Sim	-- 28-fev-22
Peri Mirim	Realizado 27-nov-21	Sim	-- 28-fev-22
Presidente Dutra	Realizado 7-dez-21	Sim	S/P FR
Presidente Juscelino	Realizado 21-nov-21	Sim	Realizado 21-fev-22
Presidente Vargas	Realizado 18-dez-21	Sim	-- 28-fev-22
Primeira Cruz	Realizado 18-nov-21	Sim	-- 28-fev-22
Santa Luzia	Realizado 19-dez-21	Sim	-- 28-fev-22
Santo Antônio dos Lopes	Realizado 20-jan-22	Sim	S/P P3 / FR
São Benedito do Rio Preto	Realizado 27-nov-21	Sim	-- 28-fev-22
São Domingos do Maranhão	Realizado 20-jan-22	Sim	S/P P3 / FR
São João Batista	Realizado 28-nov-21	Sim	-- 28-fev-22
São João do Carú	Realizado 25-jan-22	Sim	-- 28-fev-22

S/P - Sem previsão; E/P - Em programação; FQ - Fluxo qualificatório; FR - Fluxo regulatório; P1 - Pendência do município; P2/P3/P4/P5 - pendência de canal; PPTA - Pendência Pós Termo de Adesão

# ENTREGAS | FASE 1.2 (4/4)

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

### MARANHÃO (2/2)

67 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
	S/P	P1		S/P	FR
São João dos Patos	S/P	P1		S/P	FR
São José dos Basílios	Realizado	7-dez-21		--	28-fev-22
São Vicente Ferrer	Realizado	28-jan-22	Sim	--	28-fev-22
Satubinha	Realizado	26-jan-22		--	28-fev-22
Timbiras	Realizado	28-jan-22	Sim	--	28-fev-22
Tutóia	S/P	P1		S/P	FR
Vitória do Mearim	S/P	P2 / P3		S/P	P2 / P3 / FR
Amapá do Maranhão	Realizado	19-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Graça Aranha	S/P	P1		S/P	FR
Junco do Maranhão	Realizado	9-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Luís Domingues	Realizado	21-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Presidente Médici	Realizado	26-nov-21	Sim	Realizado	24/02/22
Tufilândia	Realizado	20-jan-22		--	28-fev-22

# ENTREGAS | FASE 1.3

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

## PERNAMBUCO (1/3)

124 municípios

INFRA				
Realizado	Programada	PPTA	DR4	Com pendência
0	115	0	3	6

RF				
Realizado	Programadas	PPTA	DR4	Pendência ou sem L20
0	26	0	3	95

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Afrânio	--	jun-22			
Agrestina	--	abr-22			
Água Preta	--	abr-22		--	mai-22
Águas Belas	--	mai-22			
Alagoinha	--	mai-22			
Aliança	--	abr-22		--	mai-22
Altinho	--	mai-22			
Amaraji	--	abr-22			
Angelim	--	abr-22		--	mai-22
Araripina	--	mai-22			
Barra de Guabiraba	--	abr-22			
Barreiros	--	jun-22			
Belém de Maria	--	abr-22			
Belém do São Francisco	--	mai-22			
Betânia	--	mai-22			
Bodocó	--	mai-22			
Bom Conselho	--	jun-22			
Bonito	--	mai-22			
Brejão	--	abr-22			
Brejinho	--	mai-22			
Brejo da Madre de Deus	--	jun-22			
Buíque	--	mai-22			
Cabrobó	--	jun-22			
Cachoeirinha	--	abr-22			
Caetés	--	abr-22			
Calçado	--	abr-22		--	mai-22
Camocim de São Félix	--	abr-22		--	mai-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Canhotinho	--	abr-22			
Capoeiras	--	abr-22			
Carnaíba	--	mai-22			
Carnaubeira da Penha	--	mai-22			
Casinhas	--	abr-22		--	mai-22
Condado	--	abr-22			
Correntes	--	abr-22			
Cortês	--	abr-22		--	mai-22
Cumaru	--	abr-22		--	mai-22
Cupira	--	abr-22		--	mai-22
Custódia	--	jun-22			
Exu	--	mai-22			
Feira Nova	--	abr-22		--	mai-22
Flores	--	mai-22			
Frei Miguelinho					
Gameleira	--	abr-22		--	mai-22
Glória do Goitá	--	jun-22			
Gravatá	--	jun-22			
Iati	--	abr-22			
Ibimirim	--	mai-22			
Ibirajuba	--	abr-22			
Iguaracy					
Inajá	--	mai-22			
Ipubi	--	mai-22			
Itaíba	--	mai-22			
Itapetim	--	mai-22			
Jaqueira	--	jun-22			

# ENTREGAS | FASE 1.3

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

### PERNAMBUCO (2/3)

124 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Jataúba	--	mai-22			
Jatobá	--	mai-22			
João Alfredo					
Joaquim Nabuco	--	abr-22			
Jucati	--	abr-22		--	mai-22
Jupi	--	abr-22		--	mai-22
Jurema	--	abr-22		--	mai-22
Lagoa de Itaenga	--	abr-22			
Lagoa do Ouro	--	abr-22		--	mai-22
Lagoa dos Gatos	--	abr-22			
Lagoa Grande	--	jun-22			
Lajedo	--	abr-22		--	mai-22
Manari	--	mai-22			
Maraial	--	abr-22		--	mai-22
Mirandiba	--	mai-22			
Orobó	--	abr-22		--	mai-22
Ouricuri	--	mai-22			
Palmares					
Palmeirina	--	abr-22		--	mai-22
Panelas	--	jun-22			
Paranatama	--	abr-22			
Parnamirim					
Passira	--	jun-22			
Paudalho					
Pedra	--	mai-22			
Petrolândia	--	mai-22			
Poção	--	mai-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Pombos	--	abr-22		--	mai-22
Primavera					
Quipapá	--	mai-22			
Riacho das Almas	--	abr-22		--	mai-22
Ribeirão	--	mai-22			
Rio Formoso	--	mai-22			
Sairé	--	abr-22		--	mai-22
Salgueiro	--	mai-22			
Saloá	--	abr-22			
Sanharó	--	mai-22			
Santa Cruz da Baixa Verde	--	mai-22			
Santa Maria da Boa Vista	--	jun-22			
Santa Maria do Cambucá	--	abr-22			
Santa Terezinha	--	mai-22			
São Benedito do Sul	--	abr-22			
São Bento do Una					
São João	--	abr-22		--	mai-22
São Joaquim do Monte	--	abr-22			
São José da Coroa Grande	--	abr-22		--	mai-22
São José do Belmonte	--	mai-22			
São José do Egito	--	jun-22			
Serra Talhada					
Sertânia	--	mai-22			
Surubim	--	mai-22			
Tabira	--	mai-22			
Tacaimbó	--	abr-22		--	mai-22
Tacaratu	--	mai-22			

### PERNAMBUCO (3/3)

124 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Terezinha	--	abr-22			
Toritama	--	mai-22			
Trindade	--	mai-22			
Triunfo	--	mai-22			
Tupanatinga	--	mai-22			
Tuparetama	--	mai-22			
Venturosa	--	mai-22			
Verdejante	--	mai-22			
Vertente do Lério	--	abr-22			
Vertentes	--	abr-22			
Vicência	--	jun-22			
Xexéu	--	abr-22		--	mai-22
Calumbi	--	mai-22			
Ingazeira	--	mai-22			
Itacuruba	--	mai-22			
Solidão	--	mai-22			

# ENTREGAS | FASE 1.3

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

## ALAGOAS

53 municípios

INFRA				
Realizado	Programada	PPTA	DR4	Com pendência
0	44	0	2	7

RF				
Realizado	Programadas	PPTA	DR4	Pendência ou sem L20
0	0	0	2	51

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Água Branca					
Anadia	--	jun-22			
Branquinha	--	mar-22			
Cacimbinhas	--	jun-22			
Cajueiro	--	jun-22			
Campo Alegre					
Campo Grande	--	jun-22			
Canapi	--	jun-22			
Capela	--	jun-22			
Carneiros	--	jun-22			
Craibas					
Dois Riachos					
Feira Grande	--	jun-22			
Flexeiras	--	mar-22			
Ibateguara	--	jun-22			
Igaci	--	jun-22			
Igreja Nova	--	jun-22			
Japaratinga	--	jun-22			
Jequiá da Praia					
Joaquim Gomes	--	jun-22			
Maravilha	--	jun-22			
Maribondo	--	jun-22			
Mata Grande	--	jun-22			
Murici					
Novo Lino	--	jun-22			
Olho d'Água das Flores	--	jun-22			
Olho d'Água do Casado					

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Oliveira	--	jun-22			
Ouro Branco	--	jun-22			
Passo de Camaragibe	--	jun-22			
Paulo Jacinto	--	jun-22			
Piranhas	--	jun-22			
Porto de Pedras	--	jun-22			
Porto Real do Colégio	--	jun-22			
Quebrangulo					
Santana do Mundaú	--	jun-22			
São José da Laje	--	jun-22			
São José da Tapera	--	jun-22			
São Luís do Quitunde	--	jun-22			
São Miguel dos Milagres	--	jun-22			
São Sebastião	--	jun-22			
Senador Rui Palmeira	--	jun-22			
Teotônio Vilela	--	jun-22			
Traipu					
Viçosa	--	jun-22			
Belém	--	jun-22			
Campestre	--	jun-22			
Feliz Deserto	--	jun-22			
Jacaré dos Homens	--	jun-22			
Jundiá	--	jun-22			
Palestina	--	jun-22			
São Brás	--	jun-22			
Tanque d'Arca	--	jun-22			

# ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

## MINAS GERAIS (1/9)

470 municípios

INFRA				
Realizado	Programada	PPTA	DR4	Com pendência
5	416	7	18	24

RF				
Realizado	Programadas	PPTA	DR4	Pendência ou sem L20
0	126	7	18	319

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Abadia dos Dourados	--	mai-22			
Abaeté	--	mar-22			
Abre Campo	--	jun-22		--	jul-22
Acaiaca	--	fev-22		--	abr-22
Água Boa					
Águas Vermelhas					
Aimorés	--	mar-22			
Aiuruoca	PPTA	--		PPTA	--
Albertina	--	fev-22		--	jun-22
Além Paraíba	--	mar-22			
Alfredo Vasconcelos	--	mar-22		--	abr-22
Alto Caparaó	--	mar-22			
Alto Jequitibá	--	mar-22		--	abr-22
Alto Rio Doce	--	mar-22			
Alvarenga	--	fev-22		--	abr-22
Alvinópolis	PPTA	--		PPTA	--
Alvorada de Minas	--	mar-22		--	abr-22
Amparo do Serra	--	fev-22			
Antônio Dias					
Antônio Prado de Minas					
Aracitaba	--	abr-22		--	mai-22
Arantina	--	jun-22			
Araponga					
Arapuã	--	mai-22			
Araújos	--	mar-22		--	abr-22
Arceburgo	--	mar-22			
Areado	--	fev-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Argirita	--	fev-22		--	abr-22
Astolfo Dutra	--	abr-22		--	mai-22
Ataléia	--	mar-22		--	abr-22
Augusto de Lima	PPTA	--		PPTA	--
Baependi	--	jul-22			
Bandeira					
Bandeira do Sul	--	fev-22			
Barra Longa	--	fev-22		--	abr-22
Bela Vista de Minas	--	mar-22		--	jul-22
Belmiro Braga	--	fev-22		--	abr-22
Belo Oriente	--	mar-22		--	abr-22
Berilo	--	mar-22		--	abr-22
Berizal	--	mar-22		--	abr-22
Bertópolis	--	mar-22		--	abr-22
Bias Fortes	--	fev-22		--	abr-22
Bicas	--	abr-22			
Boa Esperança	--	fev-22			
Bom Despacho	--	jun-22			
Bom Jardim de Minas	--	jul-22		--	ago-22
Bom Jesus da Penha	Realizado	fev-22		--	abr-22
Bom Jesus do Amparo					
Bom Repouso	Realizado	fev-22		--	abr-22
Bom Sucesso	--	fev-22		--	abr-22
Bonfinópolis de Minas	--	mar-22			
Bonito de Minas	--	mar-22		--	abr-22
Borda da Mata	--	fev-22		--	abr-22
Botumirim	--	mar-22		--	abr-22



# ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

## MINAS GERAIS (2/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Brás Pires	--	abr-22		--	mai-22
Brasilândia de Minas	--	mar-22		--	abr-22
Braúnas	--	mar-22		--	abr-22
Brazópolis	Realizado	fev-22		--	jun-22
Bueno Brandão	--	jun-22			
Buenópolis	--	mar-22		--	jul-22
Cabo Verde	--	fev-22			
Cachoeira de Minas	--	fev-22			
Cachoeira de Pajeú					
Cachoeira Dourada					
Cajuri	--	jul-22			
Caldas	--	jun-22			
Camanducaia	--	fev-22		--	abr-22
Cambuquira	--	fev-22			
Campanário	--	mar-22			
Campestre					
Campo do Meio	--	fev-22		--	abr-22
Campo Florido	--	mar-22		--	abr-22
Campos Altos	--	jun-22			
Campos Gerais	--	jun-22			
Cana Verde	--	mar-22			
Canaã	--	fev-22			
Candeias	Realizado	fev-22		--	jun-22
Caparaó	--	fev-22		--	abr-22
Capetinga	--	mar-22			
Capinópolis	--	mai-22			
Capitão Andrade	--	fev-22		--	abr-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Capitólio	--	mai-22			
Caputira					
Carai	--	jul-22			
Carandaí	--	mar-22			
Carangola	--	abr-22			
Carbonita	--	ago-22			
Careaçu	--	jun-22			
Carlos Chagas	--	ago-22			
Carmo da Mata	--	mar-22			
Carmo de Minas	--	jun-22			
Carmópolis de Minas	--	fev-22			
Carneirinho	--	jul-22			
Carrancas	--	jul-22			
Carvalhópolis	--	jun-22			
Cascalho Rico	--	ago-22			
Catas Altas da Noruega	--	jul-22		--	ago-22
Catuti	--	mar-22		--	abr-22
Caxambu	--	mai-22			
Cedro do Abaeté	--	ago-22			
Central de Minas	--	jul-22			
Centralina	--	ago-22			
Chácara					
Chapada do Norte	--	jul-22			
Chiador	--	jul-22			
Cipotânea	--	mai-22		--	jun-22
Coimbra	--	mai-22			
Coluna	--	jul-22			

S/P - Sem previsão; E/P - Em programação; FQ - Fluxo qualificatório; FR - Fluxo regulatório; P1 - Pendência do município; P2/P3/P4/P5 - pendência de canal; PPTA - Pendência Pós Termo de Adesão

# ENTREGAS | FASE 1.4

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

### MINAS GERAIS (3/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Comendador Gomes	--	ago-22			
Comercinho					
Conceição da Aparecida	--	jun-22		--	jul-22
Conceição das Pedras	--	jun-22		--	jul-22
Conceição de Ipanema	--	jul-22			
Conceição do Mato Dentro	--	ago-22			
Conceição do Rio Verde	--	mai-22			
Conceição dos Ouros	--	jun-22			
Cônego Marinho	--	mar-22		--	abr-22
Congonhal	--	mai-22		--	set-22
Conselheiro Pena	--	jun-22			
Coqueiral	--	fev-22		--	abr-22
Cordislândia	--	mai-22			
Corinto	--	abr-22			
Coroaci	--	mar-22		--	abr-22
Coronel Murta	--	mar-22			
Coronel Pacheco	--	mai-22		--	jun-22
Córrego Danta	--	abr-22			
Córrego do Bom Jesus	--	mai-22		--	set-22
Córrego Fundo	--	mar-22		--	jul-22
Córrego Novo	--	jun-22			
Cristais	--	mai-22			
Cristina	--	mai-22			
Crucilândia	--	abr-22			
Cruzeiro da Fortaleza	--	mar-22		--	jul-22
Cruzília	--	jun-22		--	jul-22
Curral de Dentro	--	mar-22		--	abr-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Datas	--	ago-22			
Delfim Moreira	--	abr-22		--	mai-22
Delfinópolis	--	jun-22			
Delta	--	mar-22			
Descoberto	--	abr-22			
Desterro de Entre Rios	--	jul-22			
Desterro do Melo	--	jul-22			
Diogo de Vasconcelos					
Divinésia	--	jun-22			
Divino	--	jul-22			
Divino das Laranjeiras	--	jul-22			
Divinolândia de Minas	--	abr-22			
Dom Joaquim	--	jul-22			
Dom Viçoso	--	mai-22			
Dona Eusébia	--	jul-22			
Dores de Guanhães	--	jul-22			
Dores do Indaiá	--	jul-22			
Dores do Turvo	--	jun-22			
Doresópolis	--	jul-22			
Douradoquara	--	mar-22			
Elói Mendes	--	jun-22			
Engenheiro Caldas	--	fev-22			
Engenheiro Navarro	--	abr-22			
Entre Rios de Minas					
Ervália	--	mai-22			
Espera Feliz	--	fev-22		--	abr-22
Espinosa	--	abr-22			

# ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

## MINAS GERAIS (4/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Espírito Santo do Dourado	Realizado	fev-22		--	jun-22
Estiva	PPTA	--		PPTA	--
Estrela Dalva	--	jun-22			
Estrela do Sul					
Eugenópolis	--	mai-22		--	jun-22
Ewbank da Câmara	--	mai-22		--	jun-22
Extrema	--	jun-22			
Faria Lemos	--	mai-22			
Felisburgo	--	abr-22			
Felixlândia	--	jun-22			
Fernandes Tourinho	--	jun-22			
Formoso	--	jul-22			
Fortaleza de Minas	--	mar-22		--	abr-22
Francisco Badaró	--	jun-22			
Francisco Sá	--	abr-22			
Frei Gaspar	--	abr-22			
Frei Inocêncio	--	abr-22			
Fronteira	--	jun-22			
Galiléia	--	jun-22			
Goianá	--	mai-22			
Gonçalves	--	jun-22			
Gouveia	--	abr-22			
Grão Mogol	--	abr-22			
Grupiara	--	mar-22			
Guapé	--	mar-22		--	jul-22
Guaraciaba	--	mar-22			
Guaranésia	--	fev-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Guarani	--	jul-22			
Guarará	--	jul-22			
Guarda-Mor					
Guidoval	--	mar-22		--	jul-22
Guiricema	--	mai-22		--	jun-22
Gurinhata	--	abr-22			
Heliadora	--	jul-22			
Iapu	--	fev-22			
Ibertioga					
Ibiaí	--	abr-22			
Ibiraci	PPTA	--		PPTA	--
Ibitiúra de Minas	--	jun-22			
Ibituruna	--	mar-22		--	abr-22
Icaraí de Minas	--	abr-22			
Igaratinga	--	jun-22			
Iguatama	--	mai-22			
Ijaci	--	mar-22		--	jul-22
Illicínea	PPTA	--		PPTA	--
Indaiabira	--	abr-22			
Inimutaba	--	abr-22			
Ipuiúna	--	jun-22			
Iraí de Minas	--	ago-22			
Itabirinha	--	mai-22			
Itacarambi	--	abr-22			
Itaipé	--	ago-22			
Itamarandiba	--	abr-22			
Itamarati de Minas	--	mai-22			

S/P - Sem previsão; E/P - Em programação; FQ - Fluxo qualificatório; FR - Fluxo regulatório; P1 - Pendência do município; P2/P3/P4/P5 - pendência de canal; PPTA - Pendência Pós Termo de Adesão

# ENTREGAS | FASE 1.4

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

### MINAS GERAIS (5/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Itambacuri	--	abr-22			
Itambé do Mato Dentro					
Itamogi	--	mar-22		--	abr-22
Itamonte	--	fev-22		--	jun-22
Itanhandu	--	jul-22			
Itanhomi	--	fev-22			
Itaobim	--	abr-22		--	mai-22
Itapagipe	--	jul-22			
Itapecerica	--	abr-22			
Itapeva	--	mar-22			
Itaú de Minas	--	mai-22			
Itaverava	--	abr-22		--	ago-22
Itinga	--	ago-22			
Itueta	--	mai-22			
Itumirim	--	mai-22			
Jacuí	--	mar-22		--	abr-22
Jaíba	--	abr-22			
Japonvar	--	mai-22			
Jeceaba	--	abr-22		--	mai-22
Jenipapo de Minas	--	mai-22			
Jequeri	--	jul-22			
Jequitai	--	jul-22			
Jesuânia	--	abr-22		--	mai-22
Joáima	--	ago-22			
Joaquim Felício	--	jun-22			
Josenópolis	--	mai-22			
Juramento	--	ago-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Juruáia	--	fev-22			
Ladainha	--	mai-22			
Lagamar					
Lagoa Dourada	--	abr-22			
Lagoa Formosa	--	mai-22			
Lajinha	--	mar-22			
Lamim	--	mar-22			
Laranjal	--	fev-22		--	abr-22
Lassance	--	mai-22			
Leme do Prado	--	mai-22			
Liberdade	--	mai-22		--	jun-22
Lima Duarte	--	jul-22			
Limeira do Oeste	--	abr-22			
Lontra	--	mai-22			
Luisburgo	--	mar-22		--	abr-22
Luislândia	--	mai-22			
Luminárias	--	fev-22		--	abr-22
Madre de Deus de Minas	--	abr-22			
Malacacheta	--	mai-22			
Manhumirim					
Maravilhas	--	jun-22			
Maria da Fé	--	abr-22			
Marilac	--	jun-22			
Maripã de Minas	--	jun-22			
Marliéria	--	abr-22			
Martinho Campos	--	mar-22		--	abr-22
Martins Soares	--	mar-22		--	abr-22

# ENTREGAS | FASE 1.4

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

### MINAS GERAIS (6/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Materlândia	--	jun-22			
Matipó					
Mato Verde	--	mai-22			
Matutina	--	abr-22			
Medeiros	--	mar-22		--	abr-22
Medina					
Mendes Pimentel	--	mar-22			
Mercês	--	mai-22		--	jun-22
Mesquita	--	jun-22			
Minas Novas	--	jul-22			
Minduri	--	abr-22			
Mirabela	--	jun-22			
Miradouro	--	abr-22			
Mirai	--	mai-22			
Moeda					
Moema	--	mai-22			
Monsenhor Paulo	--	abr-22			
Monte Alegre de Minas	--	jun-22			
Monte Santo de Minas	--	mar-22		--	abr-22
Montezuma	--	jul-22			
Morro da Garça	--	ago-22			
Morro do Pilar					
Munhoz					
Mutum	--	jul-22			
Muzambinho					
Natalândia	--	mai-22			
Natércia	--	fev-22		--	jun-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Nazareno	--	mar-22		--	abr-22
Nova Módica	--	mai-22			
Nova Serrana					
Novo Cruzeiro	--	mai-22			
Olaria	--	fev-22		--	jun-22
Olhos-d'Água	--	mai-22			
Olímpio Noronha	--	abr-22			
Oliveira Fortes					
Onça de Pitangui	--	mai-22			
Oratórios	--	fev-22		--	jun-22
Ouro Verde de Minas	--	ago-22			
Padre Paraíso	--	jun-22			
Paineiras	--	mai-22			
Pains	--	mar-22			
Paiva	--	mar-22		--	jul-22
Palma	--	fev-22			
Paraisópolis	--	jul-22			
Passa Quatro	--	jul-22			
Passa Tempo	--	mar-22		--	jul-22
Passa-Vinte	--	abr-22		--	mai-22
Patrocínio do Muriaé	--	fev-22		--	jun-22
Paula Cândido	--	jun-22		--	jul-22
Paulistas	--	jul-22			
Pavão	--	jun-22			
Peçanha	--	jun-22			
Pedra do Anta	--	mar-22		--	abr-22
Pedra do Indaiá	--	abr-22			

# ENTREGAS | FASE 1.4

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

### MINAS GERAIS (7/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Pedra Dourada	--	mar-22			
Pedralva	--	abr-22			
Pedras de Maria da Cruz					
Pedrinópolis	--	abr-22			
Pequeri	--	fev-22		--	jun-22
Perdizes	--	abr-22			
Perdões	--	jul-22			
Pescador	--	jun-22			
Piau	--	mar-22		--	abr-22
Piedade de Ponte Nova	--	mar-22			
Piedade do Rio Grande	--	mai-22			
Pirajuba	PPTA	--		PPTA	--
Piranga	--	mar-22		--	abr-22
Piranguçu	--	abr-22		--	mai-22
Pirapetinga	--	mar-22			
Piraúba	--	mar-22		--	abr-22
Pitangui	--	mai-22			
Planura	--	mai-22			
Poço Fundo	--	abr-22		--	mai-22
Pocrane	--	abr-22			
Pompéu	--	mai-22			
Ponto Chique	--	jun-22			
Porto Firme	--	abr-22		--	mai-22
Poté	--	ago-22			
Pouso Alto					
Pratápolis	--	jul-22			
Pratinha					

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Presidente Juscelino	--	mai-22			
Presidente Kubitschek	--	mai-22		--	jun-22
Presidente Olegário	--	jul-22			
Quartel Geral	--	abr-22			
Recreio	--	fev-22		--	abr-22
Reduto	--	mai-22		--	jun-22
Resplendor	--	abr-22			
Riachinho	--	ago-22			
Rio Casca	--	abr-22		--	mai-22
Rio do Prado	--	jun-22			
Rio Doce	--	abr-22		--	mai-22
Rio Espera	--	jul-22			
Rio Novo					
Rio Paranaíba	--	jun-22			
Rio Pardo de Minas	--	ago-22			
Rio Piracicaba	--	mai-22			
Rio Pomba	--	abr-22		--	mai-22
Rio Preto	--	jun-22			
Rio Vermelho	--	mai-22			
Ritápolis	--	mai-22			
Rochedo de Minas	--	abr-22		--	mai-22
Rodeiro	--	abr-22		--	ago-22
Romaria	--	mai-22			
Rubelita	--	jun-22			
Rubim	--	ago-22			
Sabinópolis	--	ago-22			
Salto da Divisa	--	ago-22			

S/P - Sem previsão; E/P - Em programação; FQ - Fluxo qualificatório; FR - Fluxo regulatório; P1 - Pendência do município; P2/P3/P4/P5 - pendência de canal; PPTA – Pendência Pós Termo de Adesão

# ENTREGAS | FASE 1.4

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

### MINAS GERAIS (8/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Santa Bárbara do Monte Verde	--	abr-22		--	mai-22
Santa Bárbara do Tugúrio	--	jun-22			
Santa Cruz do Escalvado	--	abr-22			
Santa Juliana	--	jun-22			
Santa Margarida	--	abr-22		--	mai-22
Santa Maria de Itabira	--	jul-22			
Santa Maria do Salto	--	ago-22			
Santa Maria do Suaçuí	--	ago-22			
Santa Rita de Caldas	--	jul-22		--	ago-22
Santa Rita de Minas	--	abr-22			
Santana do Deserto	--	abr-22		--	ago-22
Santana do Jacaré	--	abr-22			
Santana do Manhuaçu	--	jun-22			
Santana dos Montes	--	jun-22			
Santo Antônio do Amparo	--	jul-22			
Santo Antônio do Aventureiro	--	mai-22			
Santo Antônio do Gramma	--	fev-22			
Santo Antônio do Itambé	--	jun-22			
Santo Antônio do Jacinto	--	ago-22			
Santo Antônio do Monte	--	jul-22			
Santo Antônio do Rio Abaixo					
São Geraldo	--	fev-22		--	abr-22
São Gonçalo do Abaeté	--	jun-22			
São Gonçalo do Pará	--	abr-22			
São Gonçalo do Rio Abaixo					
São Gonçalo do Sapucaí	--	abr-22		--	mai-22
São Gotardo	--	jul-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
São João Batista do Glória	--	ago-22			
São João da Mata	--	mai-22			
São João da Ponte	--	jun-22			
São João do Manhuaçu	--	jul-22		--	ago-22
São João do Oriente	--	jun-22			
São João Evangelista	--	jun-22			
São José da Barra	--	mai-22			
São José do Divino	--	jun-22			
São José do Goiabal	--	jun-22			
São José do Mantimento	--	jun-22		--	jul-22
São Miguel do Anta	--	mai-22		--	jun-22
São Pedro da União	--	jul-22			
São Pedro dos Ferros	--	jun-22		--	jul-22
São Romão					
São Roque de Minas	--	jul-22			
São Thomé das Letras	--	mai-22			
São Tiago	--	jul-22			
São Tomás de Aquino	--	jul-22			
Senador Amaral	--	mai-22			
Senador Cortes	--	mai-22		--	jun-22
Senador Firmino					
Senador José Bento	--	abr-22			
Senhora de Oliveira	--	jun-22			
Senhora do Porto					
Senhora dos Remédios	--	jul-22			
Sericita	--	fev-22		--	abr-22
Serra Azul de Minas	--	jul-22			

# ENTREGAS | FASE 1.4

## PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

28/Fev/22

### MINAS GERAIS (9/9)

470 municípios



Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Serra do Salitre	--	ago-22			
Serra dos Aimorés	--	jul-22			
Serrania	--	ago-22			
Serranos	--	mai-22		--	jun-22
Serro	--	jun-22			
Silvianópolis	--	abr-22		--	mai-22
Simão Pereira	--	jun-22			
Simonésia	--	jul-22		--	ago-22
Soledade de Minas	--	jul-22			
Tabuleiro					
Tapira	--	jul-22			
Tapiraí					
Tarumirim	--	fev-22		--	abr-22
Teixeiras	--	mai-22		--	jun-22
Tiros	--	jul-22			
Tocantins	--	jun-22			
Tombos	--	jun-22			
Turmalina	--	jun-22			
Turvolândia	--	mai-22		--	jun-22
Umburatiba	--	jul-22			
União de Minas					
Urucânia	--	jun-22		--	jul-22
Urucuia	--	jul-22			
Vargem Bonita	--	jul-22			
Varjão de Minas	--	ago-22			
Varzelândia	--	jun-22			
Vazante	--	jul-22			


Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Verdelândia	--	jul-22			
Veredinha	--	jul-22			
Veríssimo	--	ago-22			
Vermelho Novo					
Vieiras	--	mai-22		--	jun-22
Virgem da Lapa	--	jul-22			
Virgínia	--	jul-22		--	ago-22
Virginópolis	--	ago-22			
Virgolândia	--	jul-22			
Volta Grande	--	jul-22			
Wenceslau Braz	--	abr-22			



# FLUXO | FASE 1.1 | CE . PI . RN

73 MUNICÍPIOS • 267 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

28/Fev/22  
Status d+222

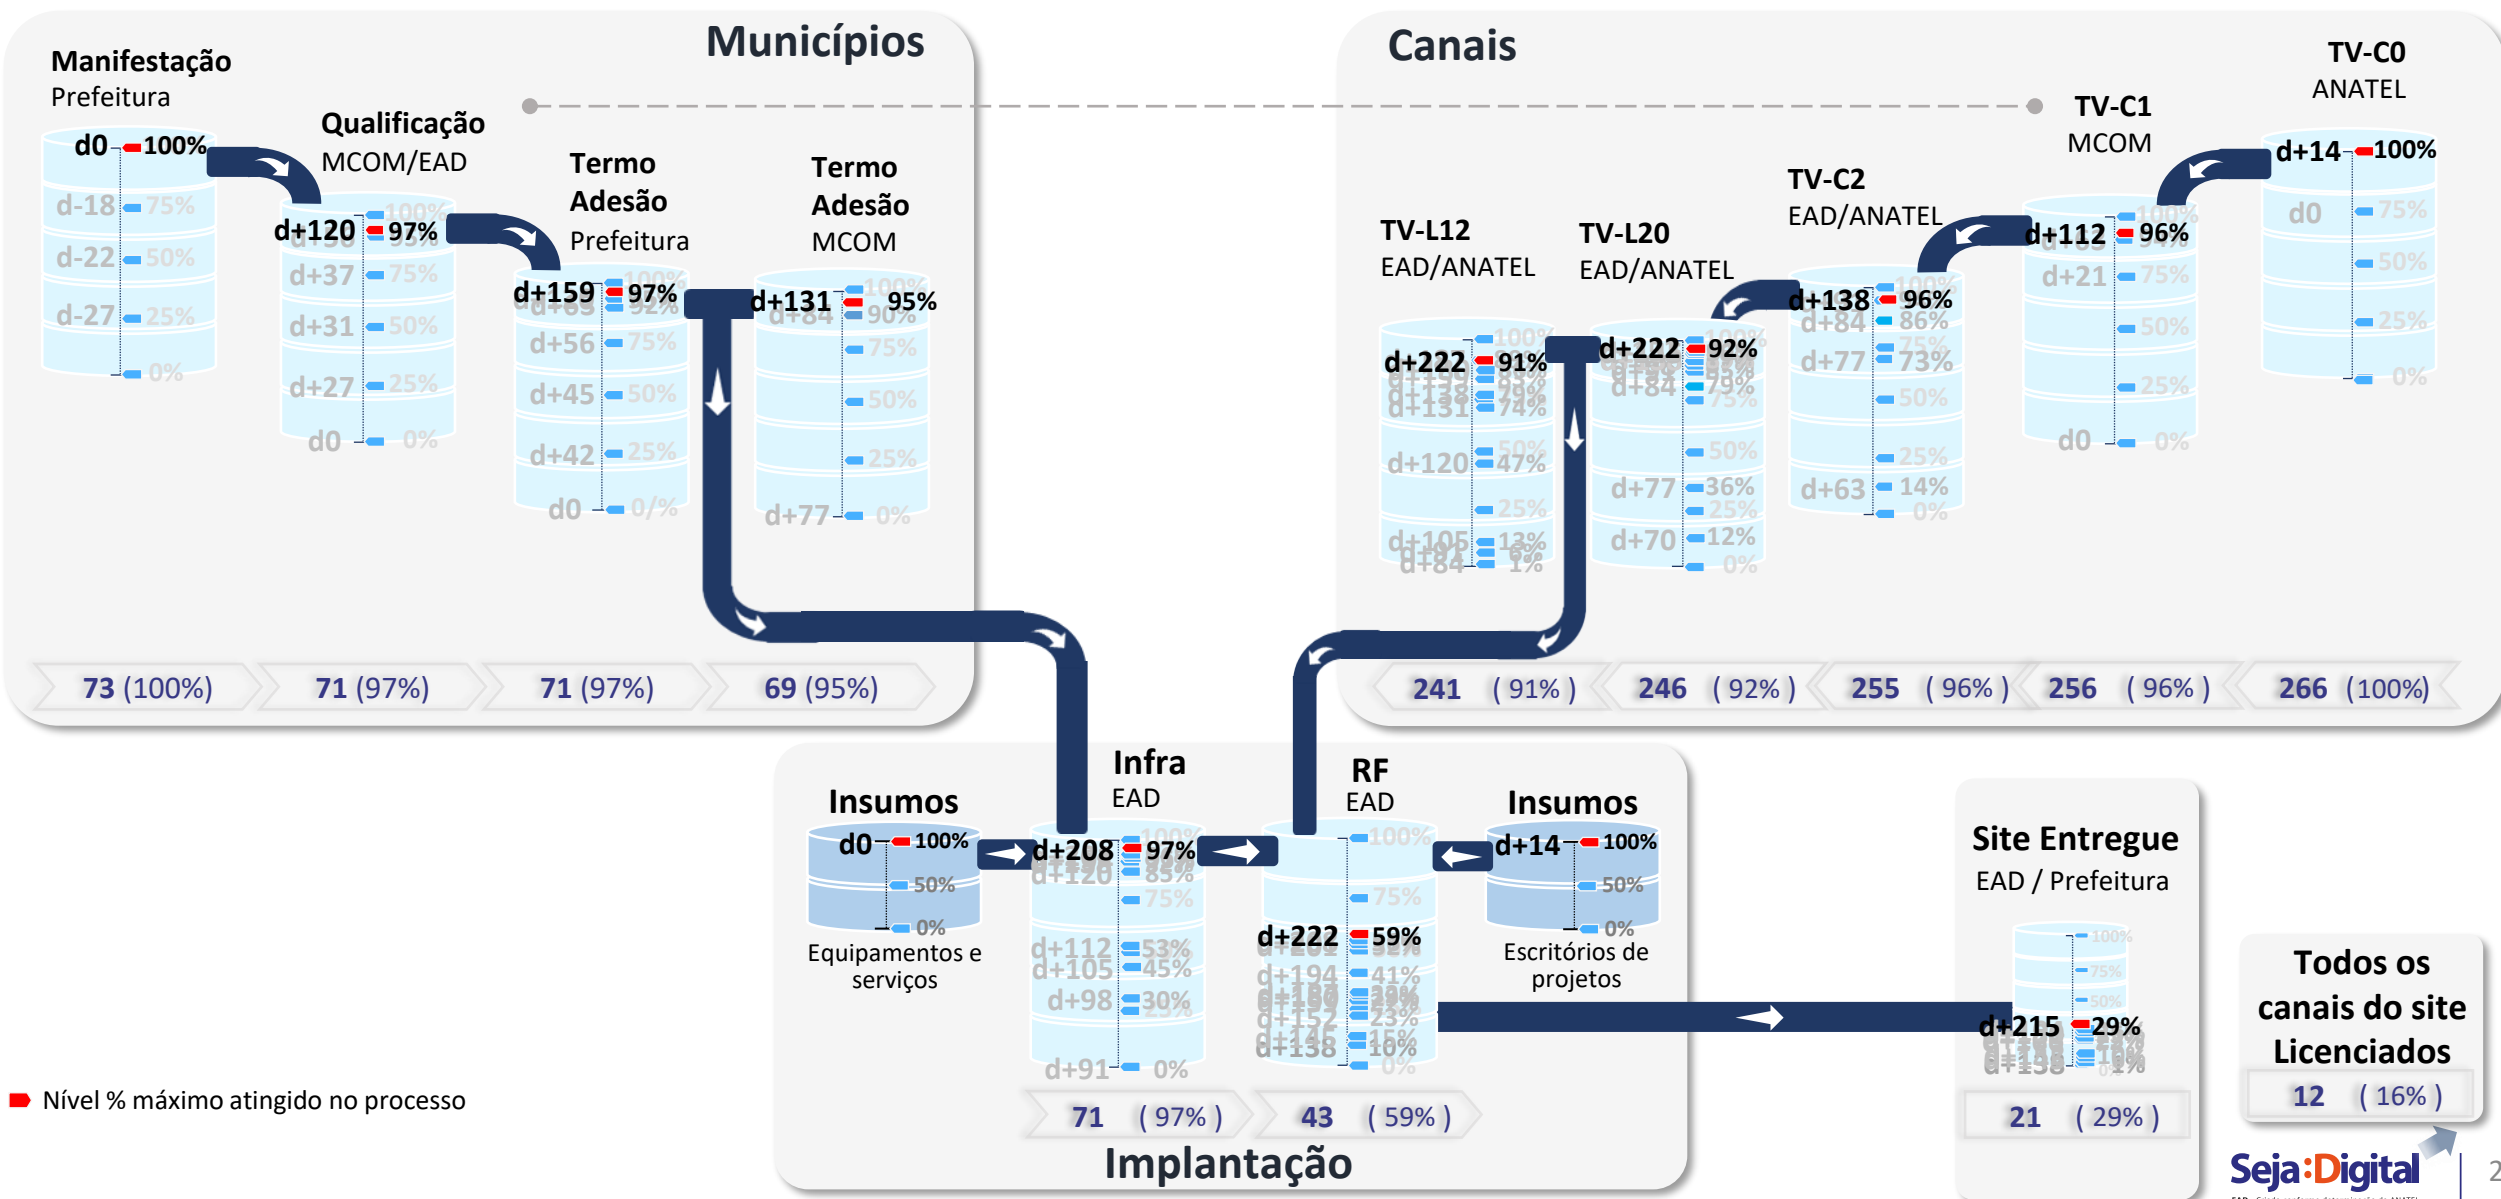

# QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO


FASE 1.1 • 73 MUNICÍPIOS • 267 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

28/Fev/22

Status d+222

## Manifestação de interesse da entidade


Entidade



72 (99%)

## VTA positiva da entidade manifestante


EAD



72 (99%)

## Entidade manifestante qualificada


MCOM



71 (97%)

## Local Habilitado

Prefeitura / EAD



72 (99%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo

# PROJETO SERÁ SOBRESTADO NO MUNICÍPIO

FASE 1.1 • 73 MUNICÍPIOS • 266 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

---

28/Fev/22

Status d+222

NÃO HÁ MUNICÍPIO NESSE CRITÉRIO

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO MUNICÍPIO

FASE 1.1 • 73 MUNICÍPIOS • 266 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

28/Fev/22

Status d+222

FASE	UF	MUNICÍPIO	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.1	RN	Lagoa Nova	60 dias após término do Edital	20/ago/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.1	PI	Inhuma	60 dias após término do Edital	20/ago/21	Sem qualificação de nenhuma entidade

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL

FASE 1.1 • 73 MUNICÍPIOS • 266 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

28/Fev/22


Status d+222

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de corte	MOTIVO
1.1	CE	Arneiroz	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	60 dias após término do Edital	20/ago/21	Entidade não qualificada
1.1	CE	Arneiroz	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	Edital	21/jul/21	Sem manifestação da entidade
1.1	CE	Arneiroz	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	Edital	21/jul/21	Sem manifestação da entidade
1.1	CE	Arneiroz	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	Edital	21/jul/21	Sem manifestação da entidade
1.1	CE	Arneiroz	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	Edital	21/jul/21	Sem manifestação da entidade
1.1	CE	Arneiroz	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	Edital	21/jul/21	Sem manifestação da entidade
1.1	CE	Guaraciaba do Norte	26	FUNDACAO JOAO PAULO II	Edital	21/jul/21	Sem manifestação da entidade
1.1	CE	Itapiúna	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	Edital	21/jul/21	Sem manifestação da entidade
1.1	CE	Meruoca	9	FUNDACAO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC	Qualquer momento		RDF informou que não tem interesse
1.1	CE	Nova Russas	2	RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA	Qualquer momento		Excluir canal conforme subgrupo GT-TVD (08/Fev/22)
1.1	CE	São Luís do Curu	11	FUNDACAO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC	60 dias após término do Edital	20/ago/21	Entidade não qualificada
1.1	PI	Pedro II	26	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	Edital	21/jul/21	Sem manifestação da entidade
1.1	RN	Umarizal	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	60 dias após término do Edital	20/ago/21	Entidade não qualificada

# FLUXO | FASE 1.1 Complemento | CE . PI . RN

24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0


21/Fev/22  
Status d+185

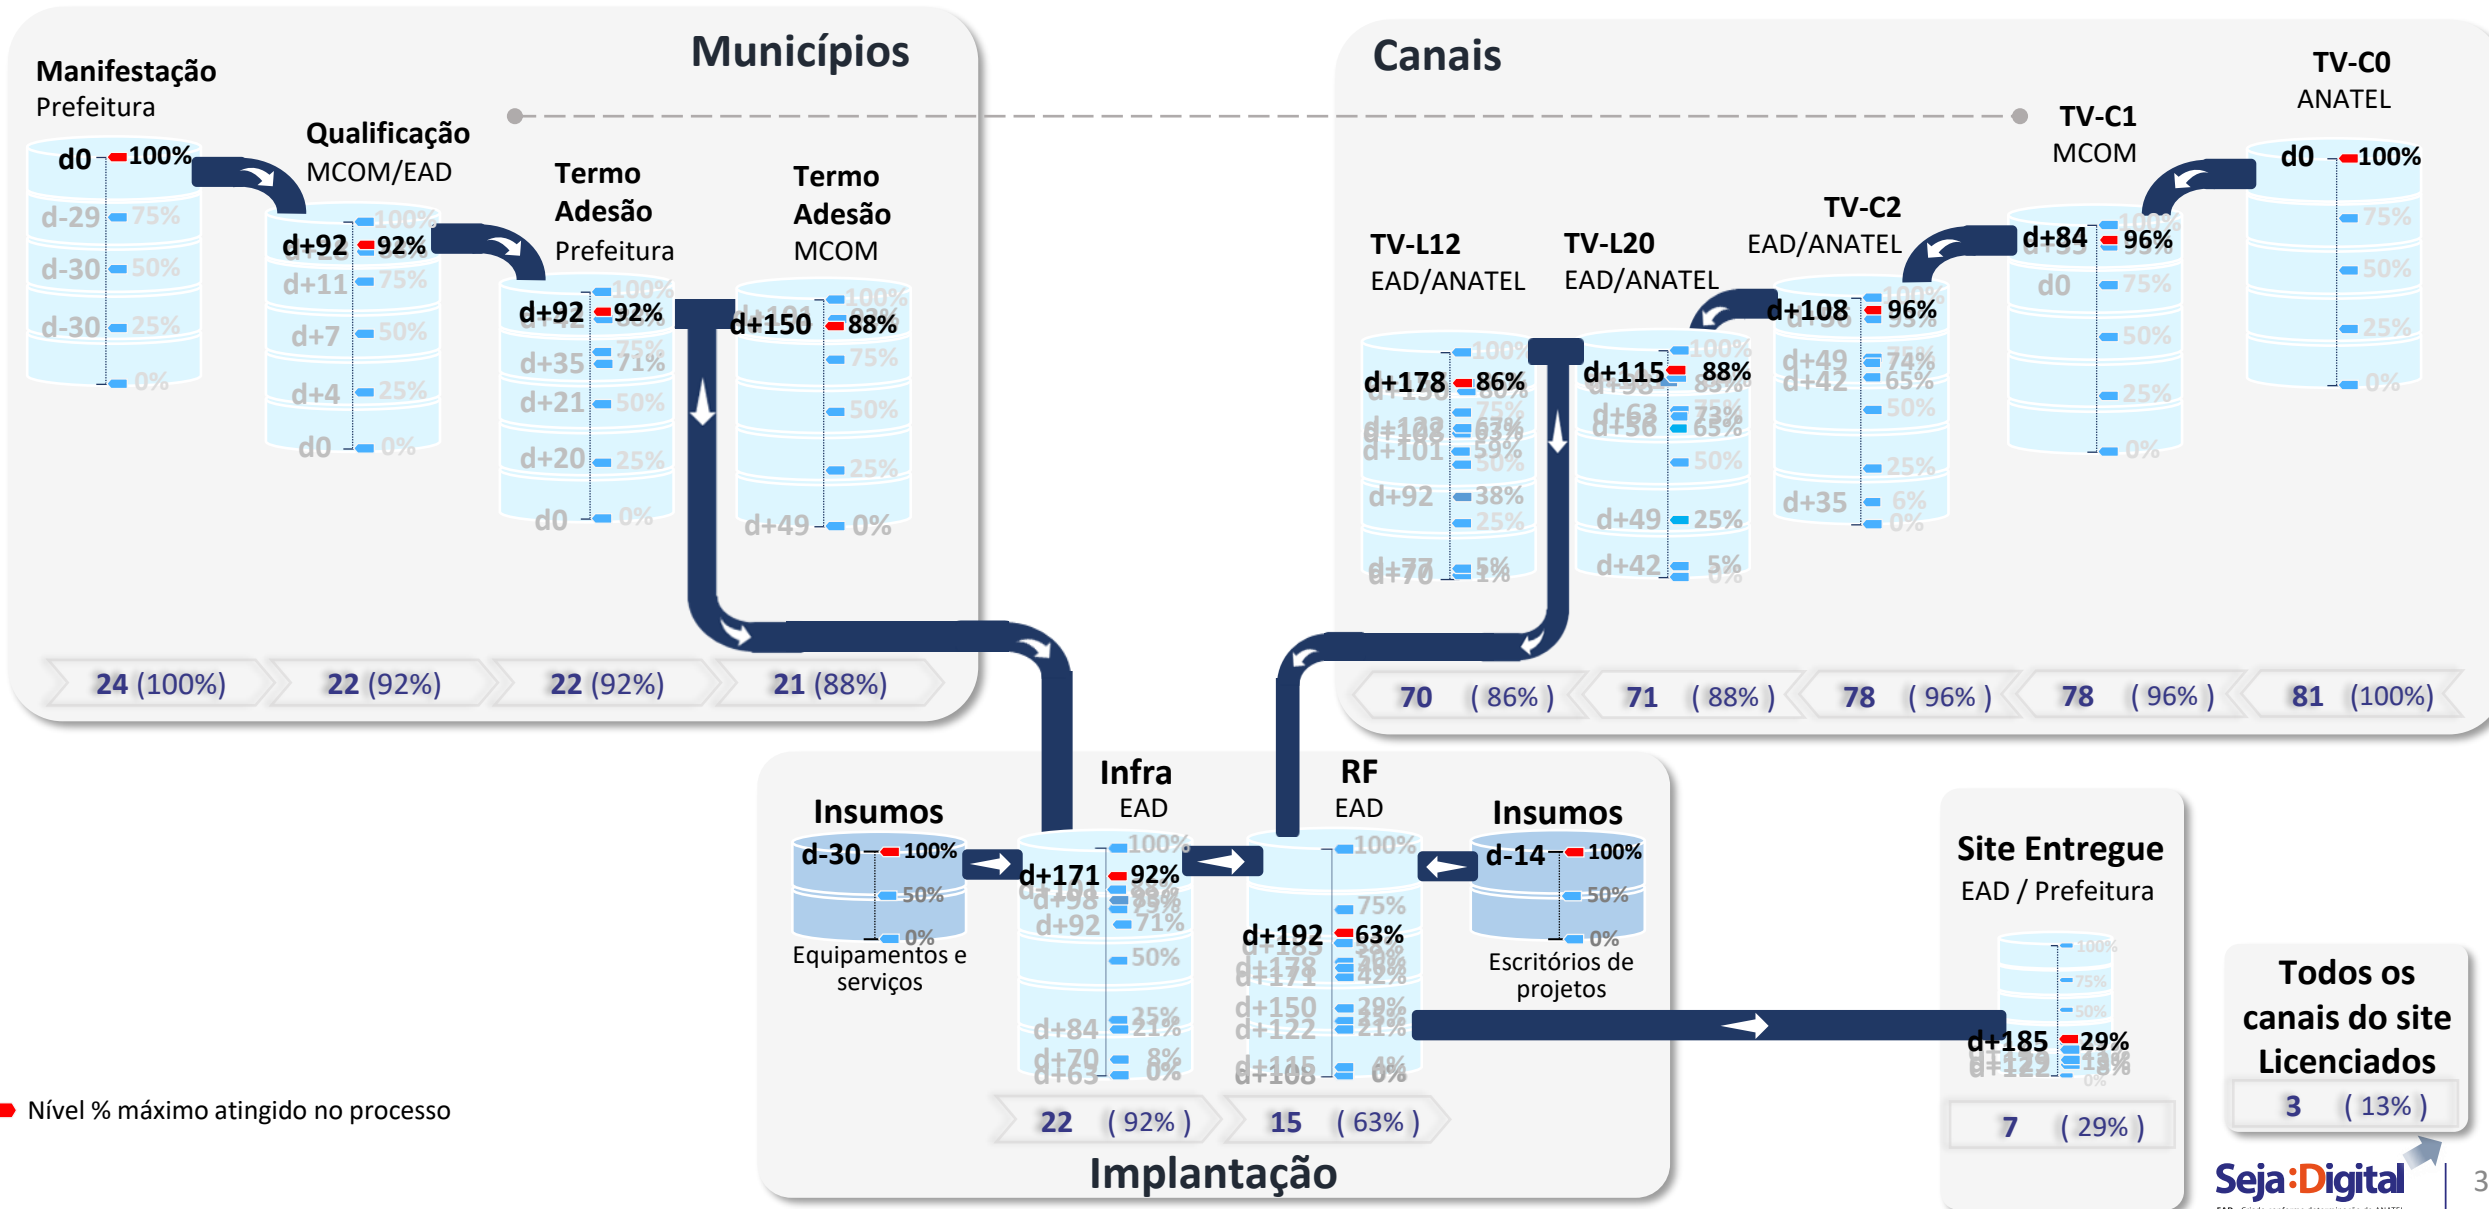

# FLUXO | FASE 1.1 Complemento | CE . PI . RN

24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

28/Fev/22  
Status d+192

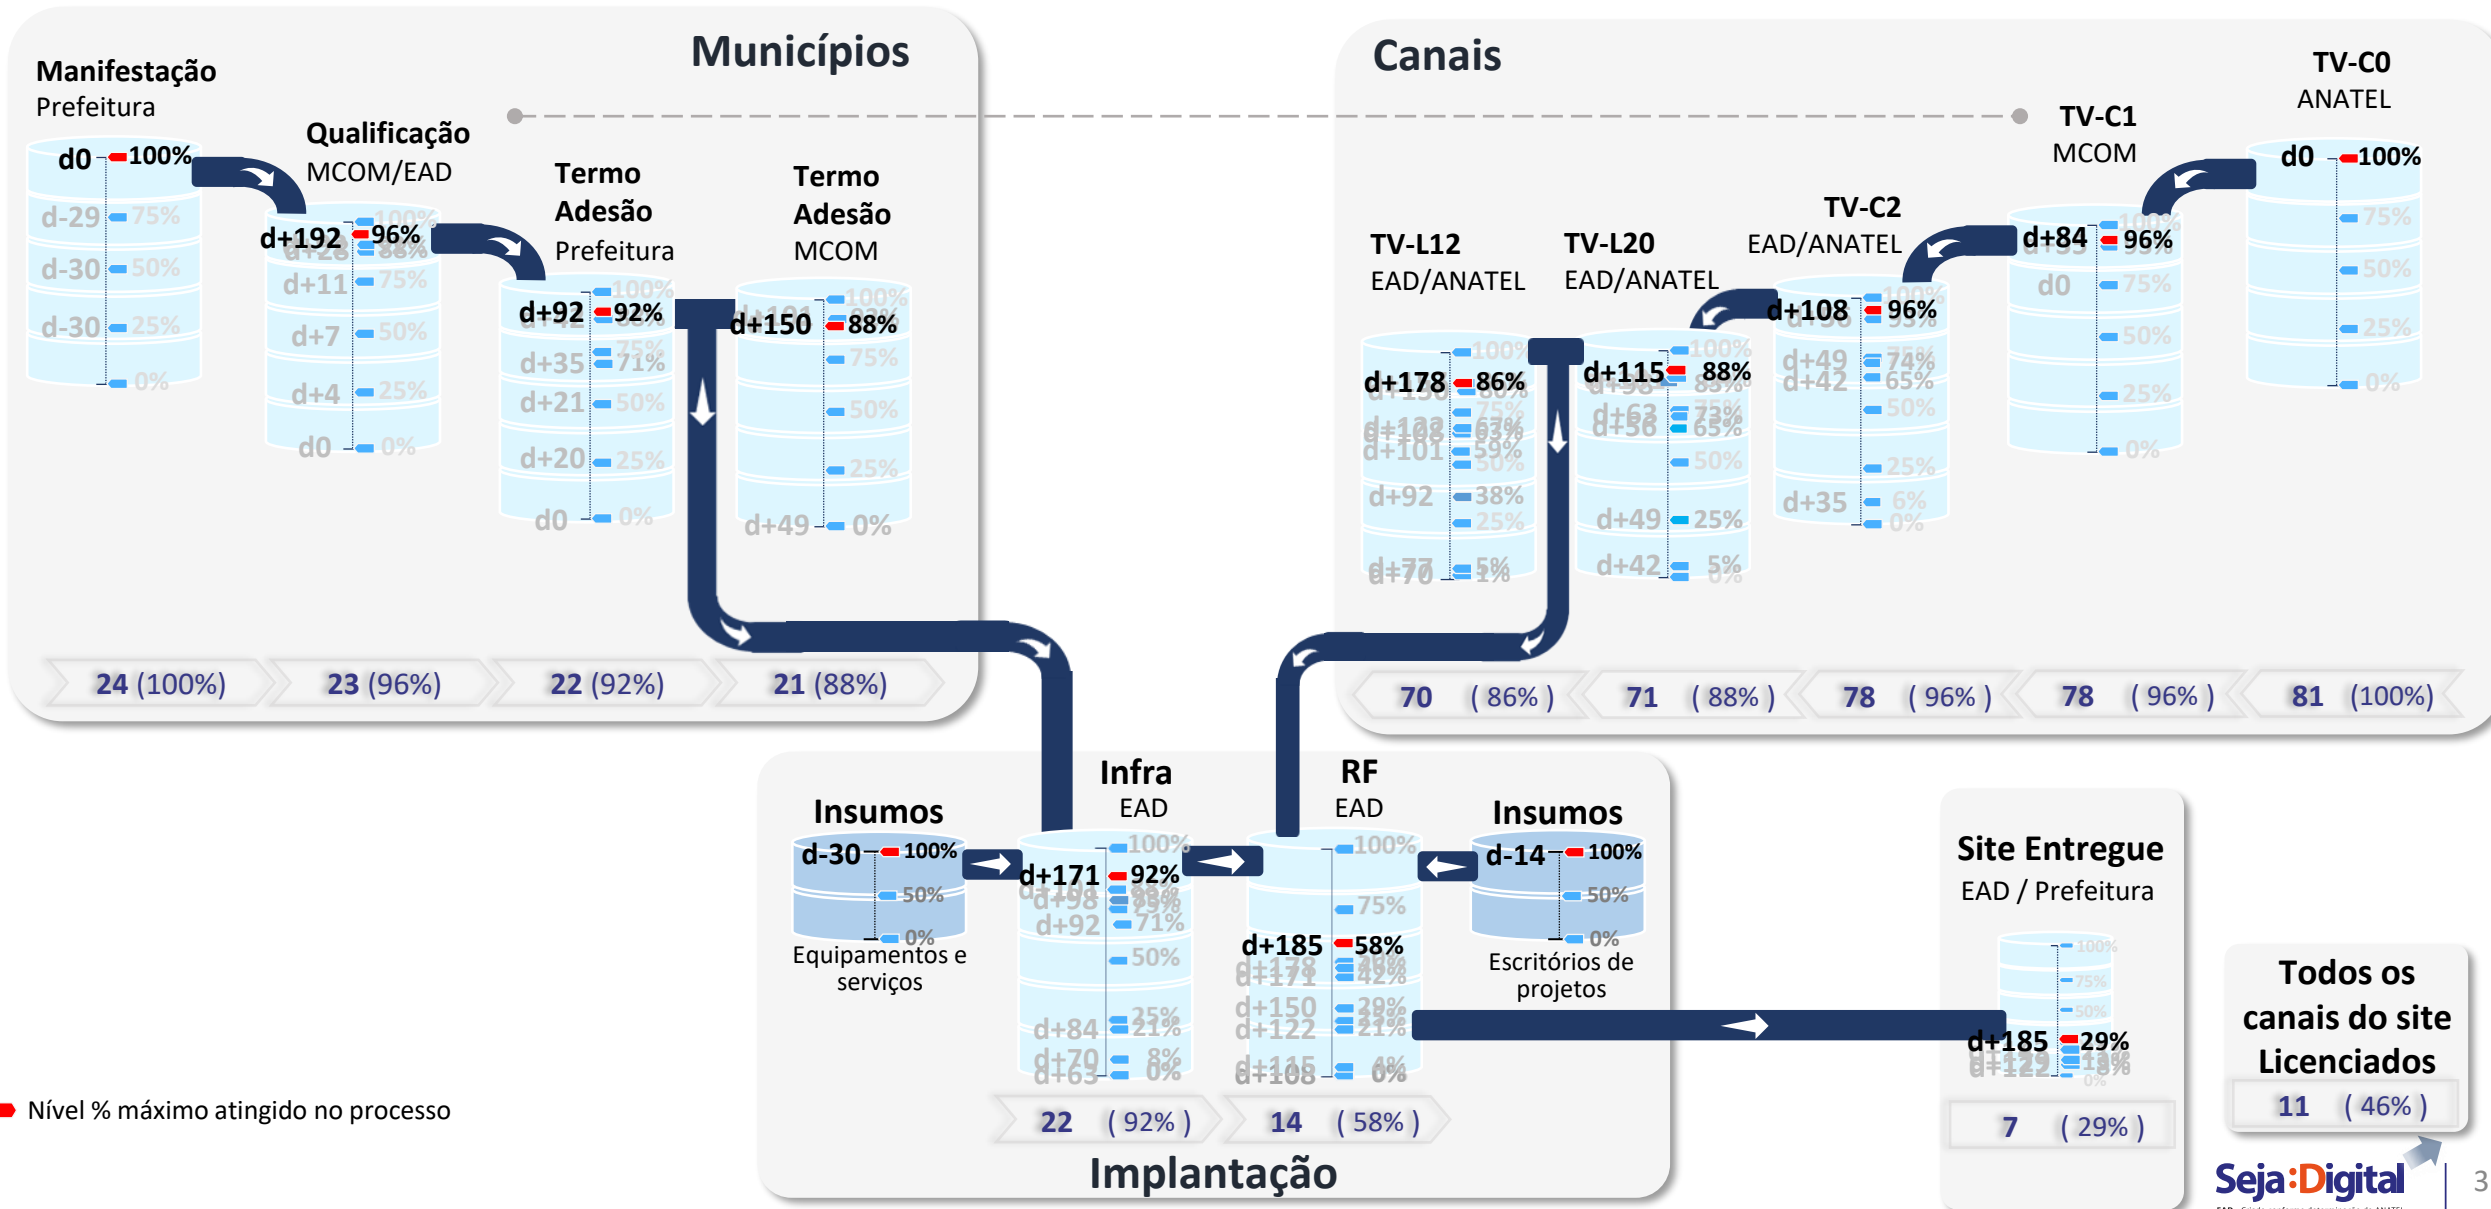


# QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.1 COMP. • 24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

28/Fev/22  
Status d+192

## Manifestação de interesse da entidade


Entidade



24 (100%)

## VTA positiva da entidade manifestante


EAD



24 (100%)

## Entidade manifestante qualificada


MCOM



23 (92%)

## Local Habilitado

Prefeitura / EAD



24 (100%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo



# PROJETO SERÁ SOBRESTADO NO MUNICÍPIO

FASE 1.1 COMP. • 24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

---

28/Fev/22

Status d+192

NÃO HÁ MUNICÍPIO NESSE CRITÉRIO

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO MUNICÍPIO

FASE 1.1 COMP. • 24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

28/Fev/22

Status d+192

FASE	UF	MUNICÍPIO	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.1 comp.	RN	Itaú	60 dias após término do Edital	18/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL

FASE 1.1 COMP. • 24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0


28/Fev/22  
Status d+192

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analogi	EDA	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.1 Comp	CE	Baixio	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO	60 dias após término do Edital	19/out/21	Entidade não qualificada

# FLUXO | FASE 1.2 | MA . PB

161 MUNICÍPIOS • 605 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

28/Fev/22  
Status d+185

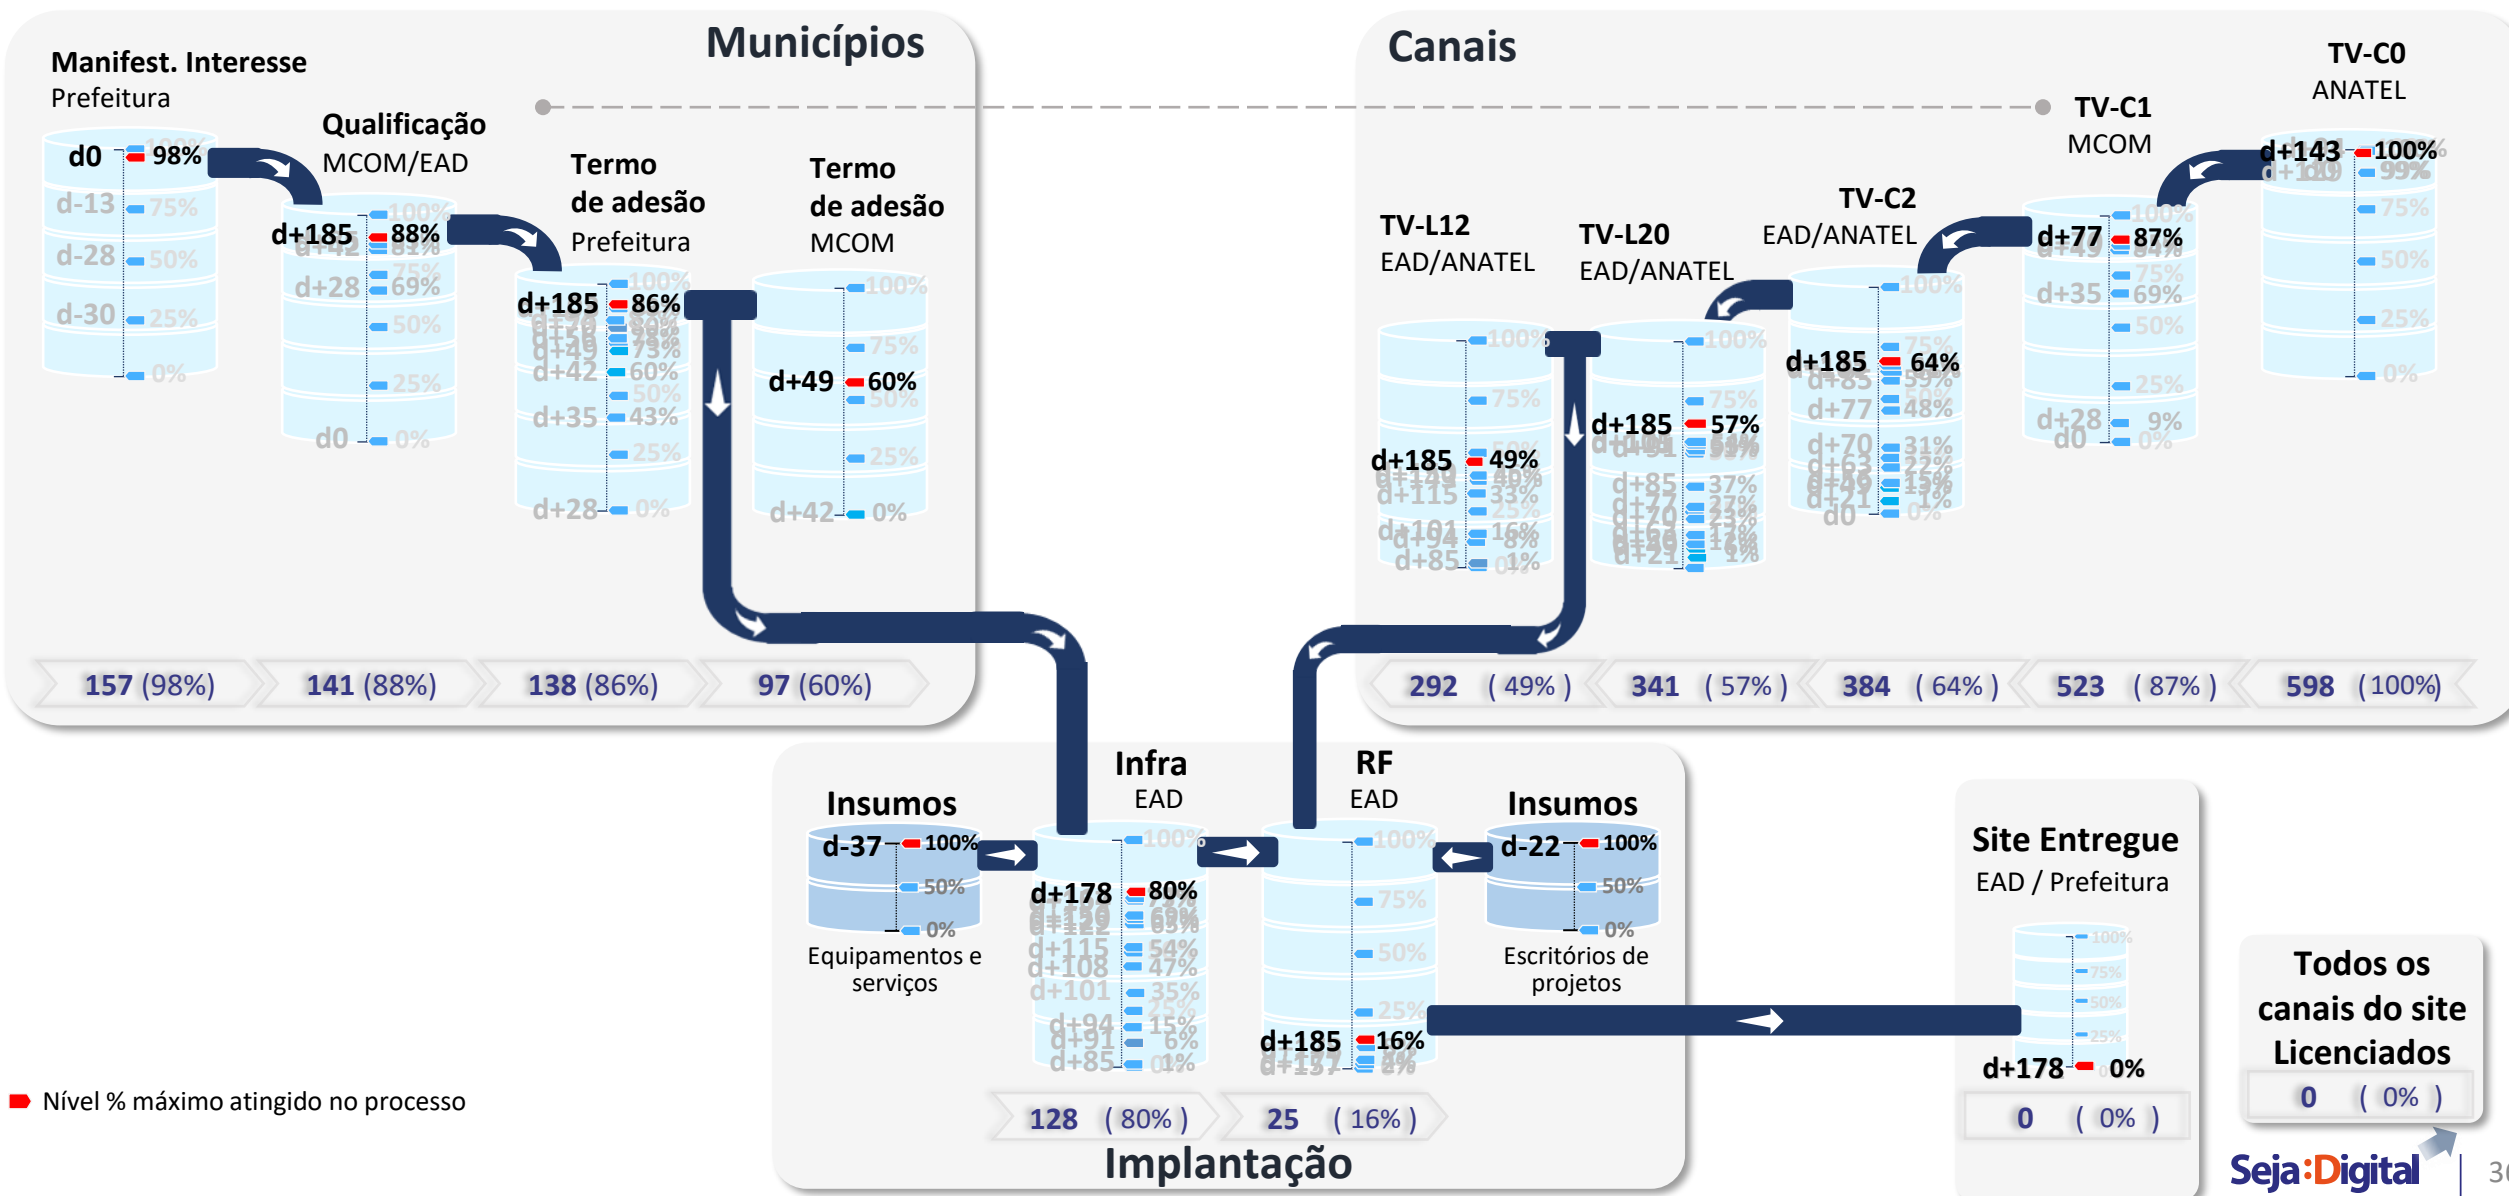

■ Nível % máximo atingido no processo

Todos os canais do site Licenciados  
0 (0%)


# QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 605 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

28/Fev/22  
Status d+185

## Manifestação de interesse da entidade


Entidade

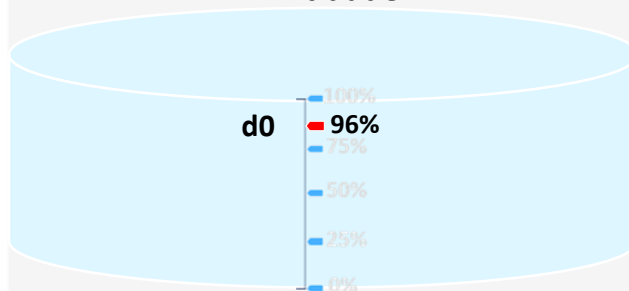

154 (96%)

## VTA positiva da entidade manifestante


EAD



154 (96%)

## Entidade manifestante qualificada


MCOM

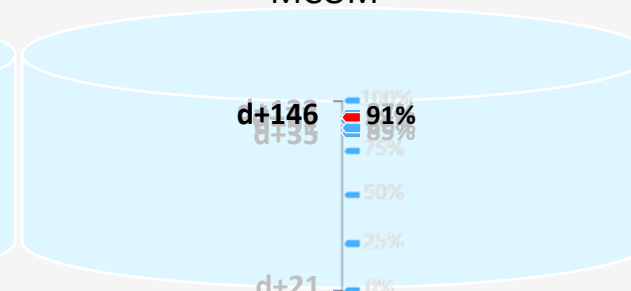

147 (91%)

## Local Habilitado

Prefeitura / EAD

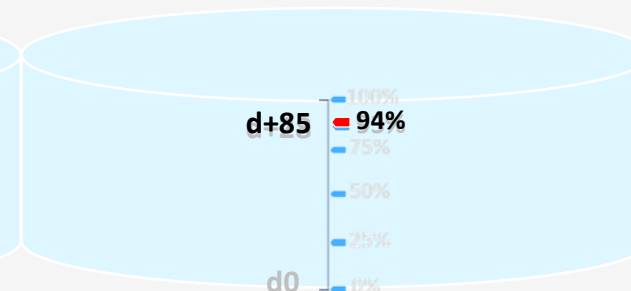

152 (94%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo

# PROJETO SERÁ SOBRESTADO NO MUNICÍPIO

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

28/Fev/22

Status d+185

FASE	UF	MUNICÍPIO	PRAZO DR4	Data de corte	MOTIVO
1.2	PB	Pilar	Edital	27/ago/21	Município não manifestou interesse
1.2	PB	Malta	Edital	27/ago/21	Município não manifestou interesse
1.2	PB	Serra Grande	Edital	27/ago/21	Município não manifestou interesse
1.2	PB	Sertãozinho	Edital	27/ago/21	Município não manifestou interesse
1.2	PB	Conceição	60 dias após término do Edital	26/out/21	Local não habilitado
1.2	MA	Marajá do Sena	60 dias após término do Edital	26/out/21	Local não habilitado
1.2	MA	Governador Luiz Rocha	60 dias após término do Edital	26/out/21	Local não habilitado

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO MUNICÍPIO

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

28/Fev/22

Status d+185

FASE	UF	MUNICÍPIO	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.2	PB	Belém	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	PB	Caaporã	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	PB	Cacimba de Dentro	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	PB	Condado	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	PB	Imaculada	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	PB	Jericó	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	PB	Santa Cruz	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	PB	São José de Piranhas	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	PB	São José dos Ramos	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	MA	Gonçalves Dias	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	MA	Graça Aranha	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	MA	Mirador	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	MA	São João dos Patos	60 dias após término do Edital	25/set/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.2	PB	Casserengue	A qualquer momento	17/dez/21	Desinteresse: Manifestação por e-mail (em 03/Set/21)

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (1/3)

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

28/Fev/22

Status d+185

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.2	MA	Anajatuba	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	MA	Anajatuba	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	MA	Barreirinhas	11	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO LTDA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	Coelho Neto	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	Governador Archer	7	TVMARANHAOCENTRALLTDA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	Itapecuru Mirim	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	MA	Lima Campos	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	Passagem Franca	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	MA	Passagem Franca	6	PREFEITURAMUNICIPALDEPASSAGEMFRANCA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	Santo Antônio dos Lopes	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	Santo Antônio dos Lopes	13	PREFEITURAMUNICIPALDESANTOANTONIODOSLOPES	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	Santo Antônio dos Lopes	2	PREFEITURAMUNICIPALDESANTOANTONIODOSLOPES	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	São Domingos do Maranhão	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	São Domingos do Maranhão	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	São Domingos do Maranhão	7	TVMARANHAOCENTRALLTDA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada



# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (2/3)

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

28/Fev/22

Status d+185

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.2	MA	Timbiras	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	Tutóia	7	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO LTDA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	MA	Vitória do Mearim	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	MA	Vitória do Mearim	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Alagoa Grande	19	TELEVISAO BORBOREMA S/A	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Alagoa Grande	33	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Alagoa Grande	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Areia	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	Qualquer momento		Excluir canal conforme subgrupo GT-TVD (01/Fev/22)
1.2	PB	Areia	13	USINA SANTA MARIA SA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Areia	15	PABLO COMUNICACOES LTDA EPP	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Areia	21	TELEVISAO BORBOREMA SA	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Bananeiras	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Bananeiras	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Barra de Santa Rosa	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Brejo do Cruz	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Coremas	26	FUNDACAO BRASIL ECOAR	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Cubati	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Dona Inês	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Gurinhém	4	TELEVISAO BORBOREMA S/A	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Ingá	7	FUNDACAO PADRE IBIAPINA	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Ingá	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Itabaiana	4	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE ITABAIANA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Itabaiana	8	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE ITABAIANA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Itabaiana	11	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE ITABAIANA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Itabaiana	13	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Juazeirinho	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Juazeirinho	14	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Livramento	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (3/3)

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

28/Fev/22


Status d+185

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógi	EDA	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.2	PB	Mataraca	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Piancó	29	FUNDACAO BRASIL ECOAR	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Picuí	21	FUNDACAO BRASIL ECOAR	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Picuí	22	TELEVISAO BORBOREMA S/A	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Pocinhos	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Princesa Isabel	14	TELEVISAO BORBOREMA S/A	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Queimadas	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Queimadas	8	FUNDACAO PEDRO AMERICO	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Queimadas	33	FUNDACAO BRASIL ECOAR	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Queimadas	40	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Remígio	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Rio Tinto	2	PRINTSTEL ENGENHARIA LTDA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Rio Tinto	7	AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Rio Tinto	30	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST MARISCHEN	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	São Bento	25	FUNDACAO BRASIL ECOAR	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	São Bento	40	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	São Bento	48	PRINTSTEL ENGENHARIA LTDA	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Serra Branca	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Serra Branca	14	TELEVISAO BORBOREMA S/A	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade
1.2	PB	Serraria		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	60 dias após término do Edital	26/out/21	Canal inviável
1.2	PB	Taperoá	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	60 dias após término do Edital	26/out/21	Entidade não qualificada
1.2	PB	Teixeira	8	MUNICIPIO DE TEIXEIRA	Edital	27/ago/21	Sem manifestação da entidade

# FLUXO | FASE 1.3 | AL . BA . PE . SE

322 MUNICÍCIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = d0

28/Fev/22  
Status d+143

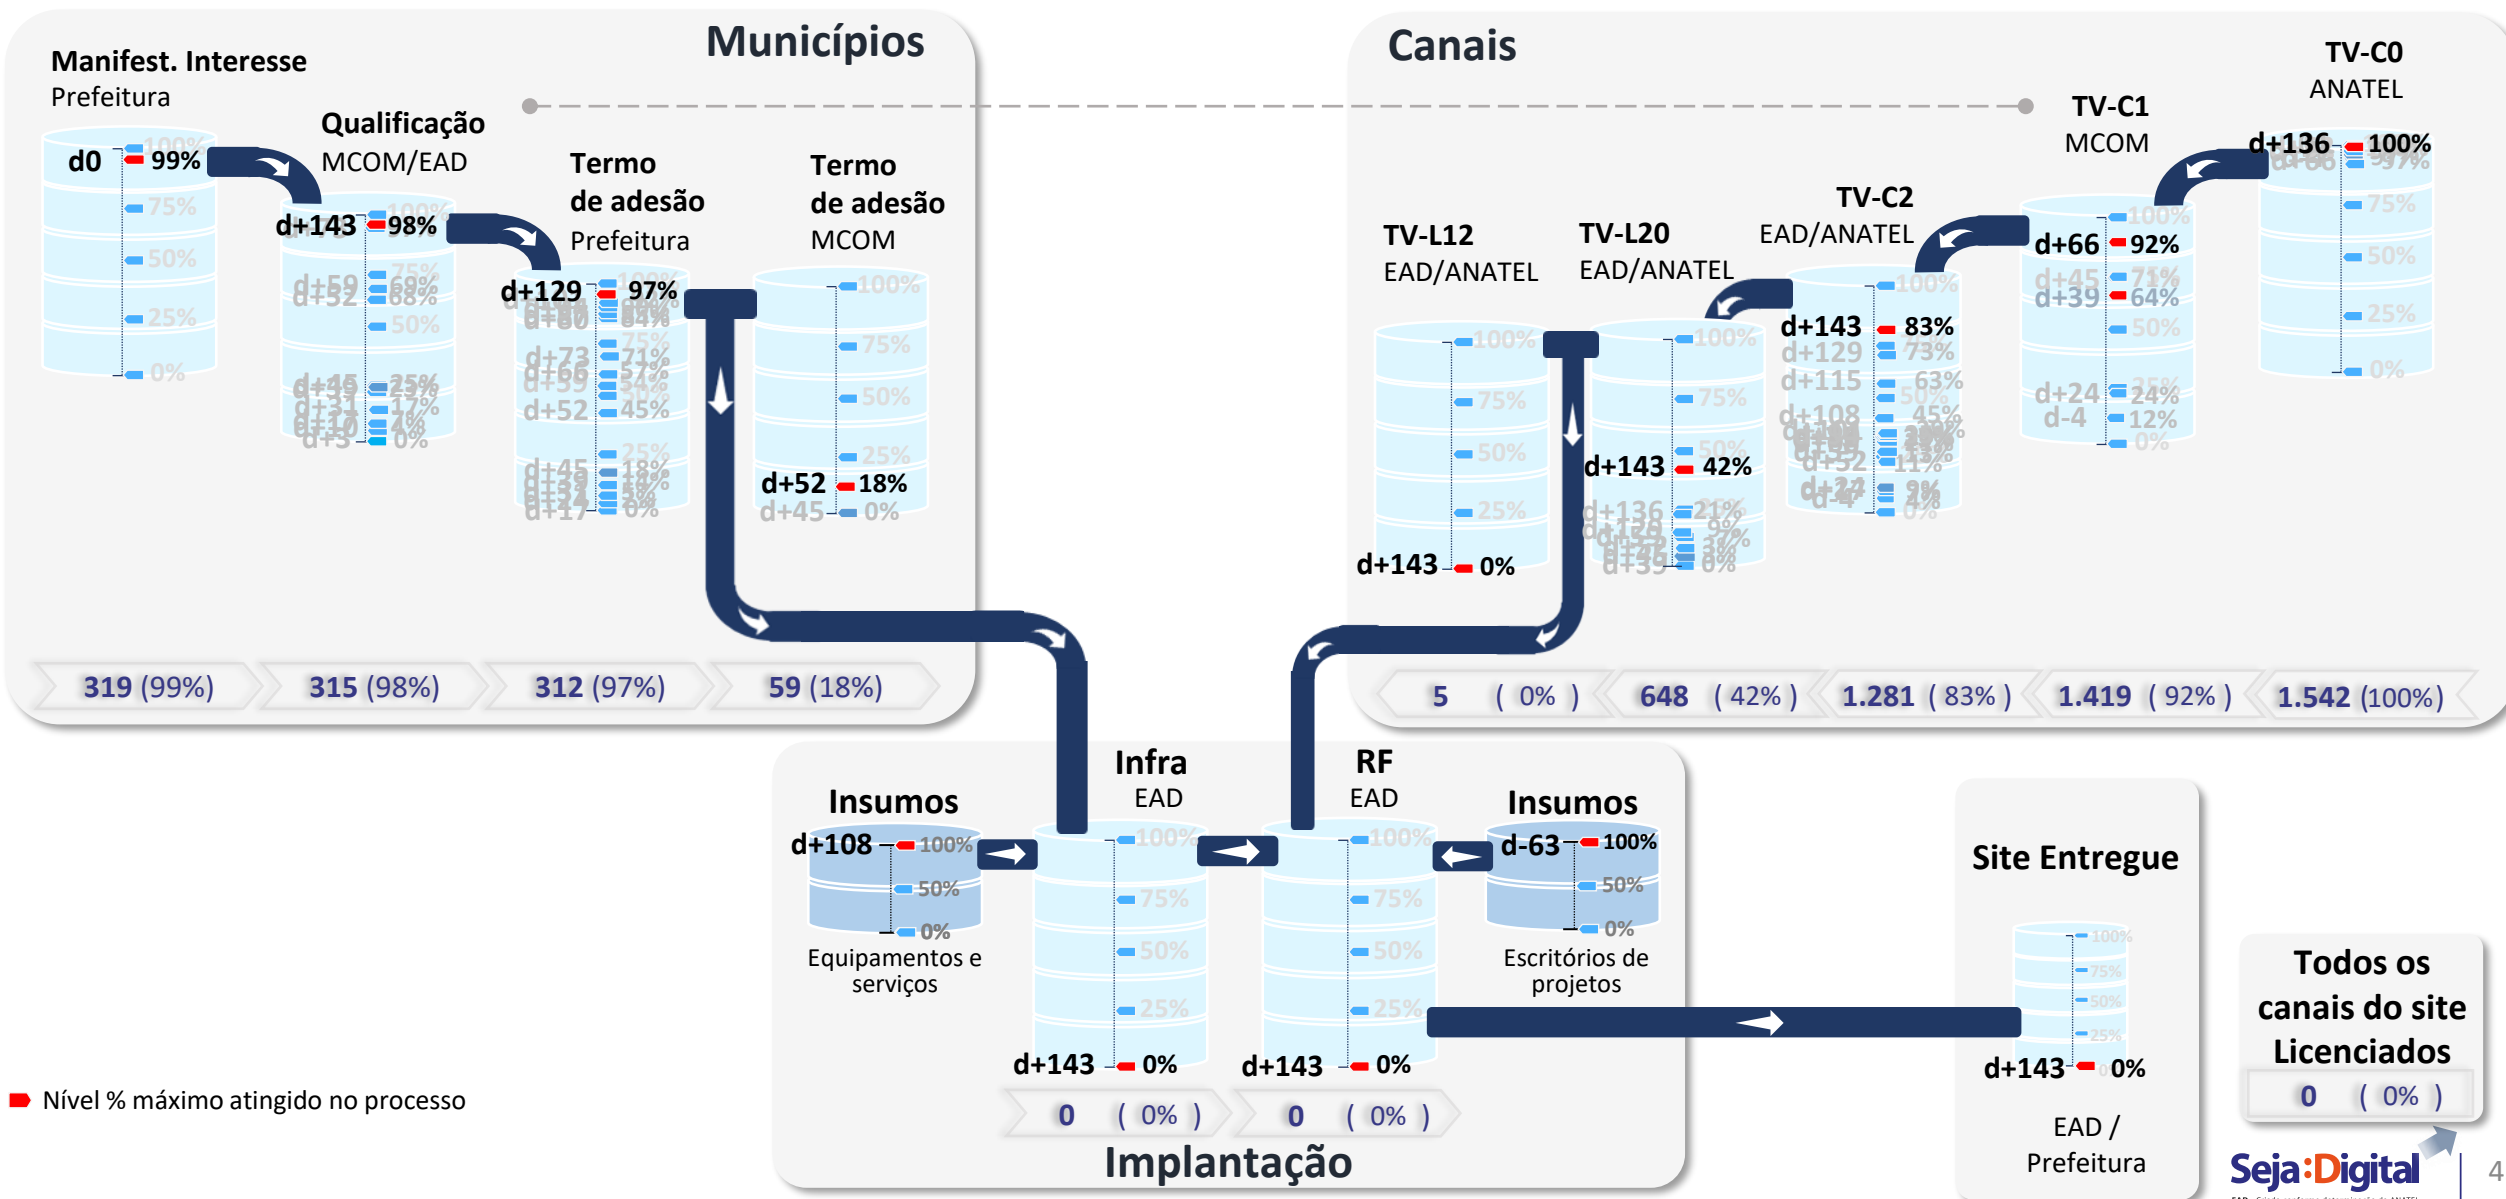


# QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRA EM 08/OUT/21 = d0

28/Fev/22  
Status d+143

## Manifestação de interesse da entidade


Entidade



322 (100%)

## VTA positiva da entidade manifestante


EAD



322 (100%)

## Entidade manifestante qualificada


MCOM



320 (99%)

## Local Habilitado

Prefeitura / EAD



319 (99%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo

# PROJETO SERÁ SOBRESTADO NO MUNICÍPIO

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = do

28/Fev/22

Status d+143

FASE	UF	MUNICÍPIO	PRAZO DR4	Data de corte	MOTIVO
1.3	AL	Craibas	Edital	08/out/21	Município não manifestou interesse
1.3	AL	Traipu	Edital	08/out/21	Município não manifestou interesse
1.3	BA	Lajedo do Tabocal	Edital	08/out/21	Município não manifestou interesse
1.3	PE	Paudalho	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Local não habilitado

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO MUNICÍPIO

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = d0

28/Fev/22

Status d+143

FASE	UF	MUNICÍPIO	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.3	BA	Coaraci	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.3	PE	Iguaracy	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.3	BA	Cafarnaum	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.3	PE	Frei Miguelinho	30 dias após o encaminhamento	13/jan/22	Termo de adesão não assinado

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (1/4)

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = do

28/Fev/22

Status d+143

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.3	AL	Água Branca	27	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Belém	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Branquinha	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Campo Alegre	26	TELEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Capela	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Ibateguara	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Ibateguara	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	AL	Igreja Nova	15	F S M COMUNICACAO LTDA - EPP	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Igreja Nova	46	FUNDACAO BRASIL ECOAR	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Mata Grande	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Murici	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	AL	Murici	30	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST MARISCHEN	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	AL	Murici	47	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Olho d'Água das Flores	35	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Passo de Camaragibe	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO CAMARAGIBE	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	AL	Piranhas	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	AL	Piranhas	27	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	São José da Laje	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAJE	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	São Luís do Quitunde	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO QUITUNDE	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	São Luís do Quitunde	30	TVF COMUNICACOES LTDA - ME	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	AL	São Luís do Quitunde	49	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Teotônio Vilela	27	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	AL	Viçosa	2	TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	AL	Viçosa	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	BA	Alcobaça	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	BA	Aurelino Leal	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINDO LEAL	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	BA	Belmonte	9	INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	BA	Boa Vista do Tupim	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	BA	Cachoeira	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (2/4)

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = d0

28/Fev/22

Status d+143

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de corte	MOTIVO
1.3	BA	Cachoeira	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	BA	Capela do Alto Alegre	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO ALEGRE	Qualquer momento		VTA negativa
1.3	BA	Castro Alves	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	BA	Curaçá	11	TELEVISAO BAHIA S.A.	Qualquer momento		Excluir canal conforme subgrupo GT-TVD (08/Fev/22)
1.3	BA	Igaporã	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	BA	Igaporã	10	TELEVISAO BAHIA S.A.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	BA	Igaporã	10	TV ARATU S/A	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	BA	Itaju do Colônia	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	BA	Ituberá	10	ITUBERÁ PREFEITURA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	BA	Lapão	5	TELEVISAO BAHIA S.A.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	BA	Mirangaba	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	BA	Pintadas	11	TELEVISAO BAHIA S.A.	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	BA	Ubaira	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIRA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	BA	Valença	34	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Araripina	20	SISTEMA ASSOCIADO DE COMUNICACAO S.A.	Qualquer momento		VTA negativa
1.3	PE	Barra de Guabiraba		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	PE	Belém de Maria		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	PE	Belém de Maria	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	PE	Bom Conselho	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	PE	Bom Conselho	28	ELO COMUNICACAO LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	PE	Brejo da Madre de Deus	16	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Brejo da Madre de Deus	43	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Caetés	41	NOSSO LAR SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA-ME	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Caetés		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	PE	Cortês	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	PE	Custódia	11	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A EPC	Qualquer momento		Excluir canal conforme subgrupo GT-TVD (08/Fev/22)
1.3	PE	Glória do Goitá	19	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Glória do Goitá	30	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST MARISCHEN	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade



# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (3/4)

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = do

28/Fev/22

Status d+143

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de conclusão	MOTIVO
1.3	PE	Glória do Goitá	40	NOSSO LAR SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA-ME	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Glória do Goitá	42	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S. A. (GLOBOPAR)	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Glória do Goitá		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	PE	Gravatá	15	TELEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Gravatá	21	TV NEWS - CANAL BRASILEIRO DE COMUNICACAO LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Gravatá	32	REDE 21 COMUNICACOES S.A.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Gravatá	41	SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Gravatá	42	TELEVISAO CIDADE MODELO LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Gravatá	43	FUNDACAO DE APOIO A GERACAO, PRODUCAO, CRIACAO E DIFUSAO DE RADIO E	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Gravatá		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	PE	Ibirajuba		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	PE	João Alfredo	4	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A EPC	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Palmares	32	REDE 21 COMUNICACOES S.A.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Palmares	44	TELEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Palmares	48	SISTEMA ASSOCIADO DE COMUNICACAO S.A.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Palmares		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	PE	Panelas	16	ELO COMUNICACAO LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	PE	Panelas	16	ELO COMUNICACAO LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	PE	Panelas	21	ELO COMUNICACAO LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Passira	43	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Primavera		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	PE	São Benedito do Sul		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	PE	São Bento do Una	41	F S M COMUNICACAO LTDA - EPP	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	São José do Egito	19	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Serra Talhada	21	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Tabira	14	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Triunfo	7	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A EPC	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade

\* Conforme diretrizes do DR4, item VI, página 7

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (4/4)

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = d0

28/Fev/22


Status d+143

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de corte	MOTIVO
1.3	PE	Triunfo	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	PE	Vertente do Lério	13	REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Vertente do Lério		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	PE	Vertentes		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	PE	Vicência	15	FUNDAÇÃO DE APOIO A GERAÇÃO, PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	PE	Vicência	50	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A. (GLOBOPAR)	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Carira	21	TELEVISÃO ATALAIA LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Carmópolis	16	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST MARISCHEN	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Gararu	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Itabaianinha	17	TELEVISÃO ATALAIA LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Itabaianinha	49	TELEVISÃO FENIX LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Itabaianinha		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	SE	Itabi		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	SE	Neópolis	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Nossa Senhora das Dores		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Canal inviável
1.3	SE	Poço Redondo	9	RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA	60 dias após término do Edital	07/dez/21	Entidade não qualificada
1.3	SE	Poço Redondo	38	TELEVISÃO ATALAIA LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Poço Redondo	43	TELEVISÃO FENIX LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Poço Verde	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Riachão do Dantas	11	MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Riachão do Dantas	13	MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Riachão do Dantas	23	TELEVISÃO ATALAIA LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Simão Dias	39	TELEVISÃO ATALAIA LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade
1.3	SE	Simão Dias	47	TELEVISÃO FENIX LTDA	Edital	08/out/21	Sem manifestação da entidade

# FLUXO | FASE 1.4 | MG

470 MUNICÍCIOS • 2.016 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

28/Fev/22  
Status d+109

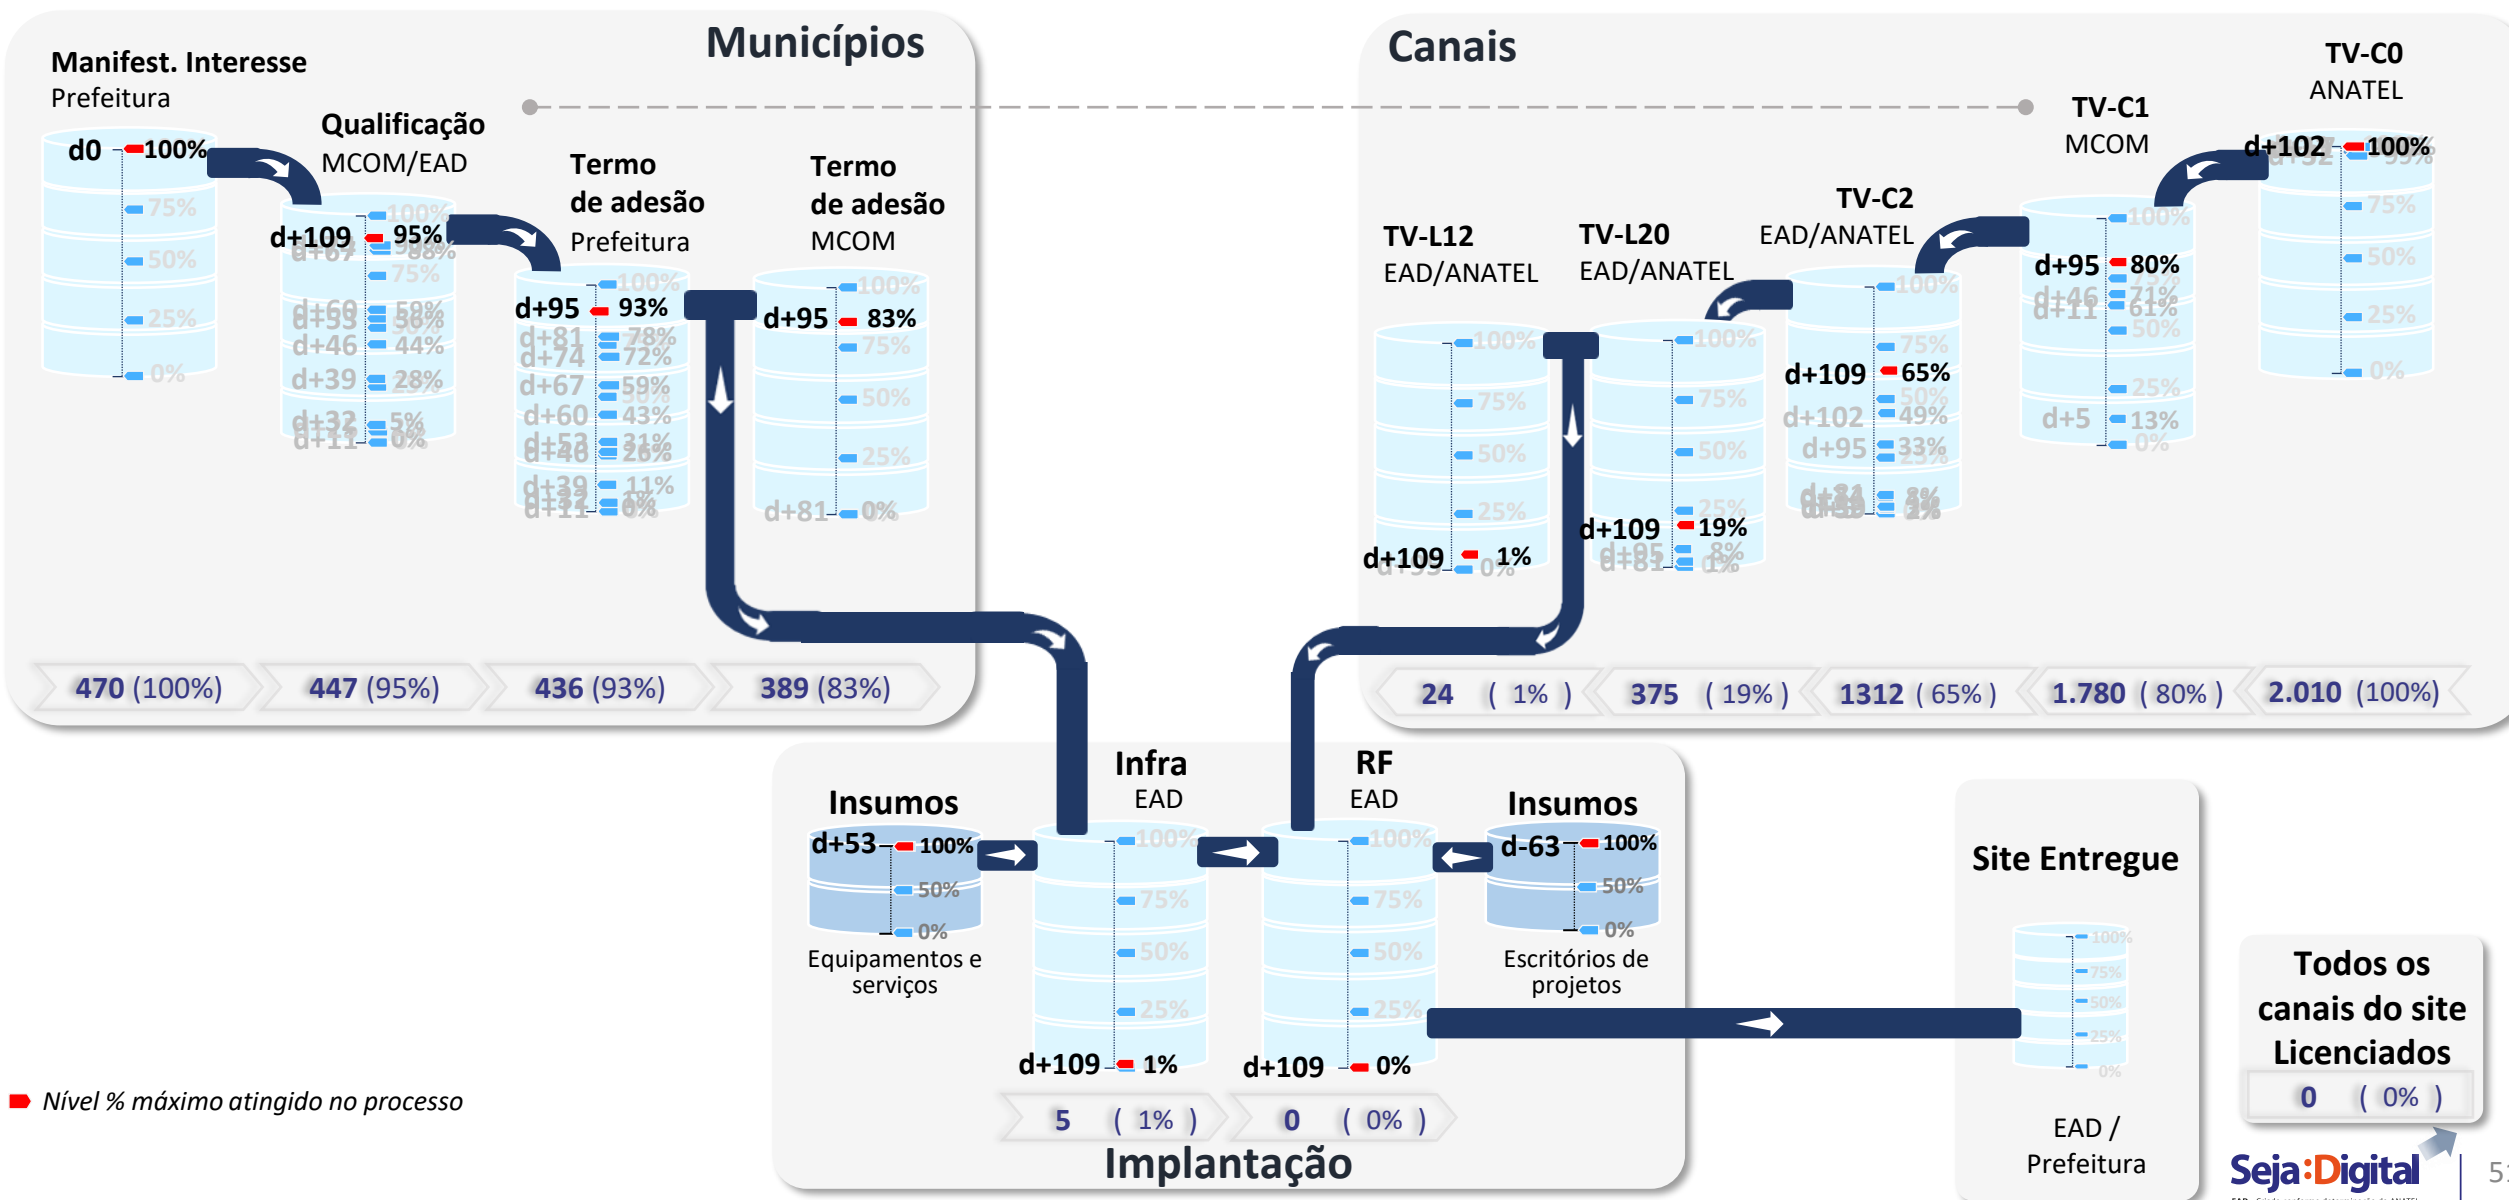

Todos os canais do site Licenciados  
0 (0%)


# QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.016 CANAIS • EDITAL ENCERRA EM 11/NOV/21 = d0

28/Fev/22  
Status d+109

## Manifestação de interesse da entidade


Entidade



466 (99%)

## VTA positiva da entidade manifestante


EAD



466 (99%)

## Entidade manifestante qualificada


MCOM



461 (98%)

## Local Habilitado

Prefeitura / EAD



460 (98%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo

# PROJETO SERÁ SOBRESTADO NO MUNICÍPIO

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

---

28/Fev/22

Status d+109

NÃO HÁ MUNICÍPIO NESSE CRITÉRIO

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO MUNICÍPIO

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

28/Fev/22

Status d+109

FASE	UF	MUNICÍPIO	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.4	MG	Água Boa	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Bom Jesus do Amparo	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Cachoeira de Pajeú	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Cachoeira Dourada	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Diogo de Vasconcelos	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Entre Rios de Minas	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Itambé do Mato Dentro	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Manhumirim	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Matipó	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Medina	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Moeda	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Morro do Pilar	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Munhoz	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Pedras de Maria da Cruz	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Santo Antônio do Rio Abaixo	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	São Romão	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Tabuleiro	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade
1.4	MG	Vermelho Novo	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Sem qualificação de nenhuma entidade

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (1/7)

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = do

28/Fev/22

Status d+109

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.4	MG	Abadia dos Dourados	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Abaeté	21	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Abaeté	50	FUNDAÇÃO EDUCAT E CULT JOSE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Aimorés	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Aimorés	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Além Paraíba	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Alto Caparaó	29	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Alto Rio Doce	13	AMERICA FUTEBOL CLUBE (Sindicato...)	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Arceburgo	14	FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Arceburgo	45	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DO SUDOESTE MINEIRO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Baependi	13	MUNICÍPIO DE BAEPENDI	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Baependi	30	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL ALTERNATIVA DE RADIODIFUSÃO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Bandeira do Sul	24	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Bicas	9	SERVICO SOCIAL TV DE BICAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Bicas	31	TV JUIZ DE FORA S/A	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Boa Esperança	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Boa Esperança	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Boa Esperança	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Boa Esperança	18	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Bom Despacho	11	FUNDAÇÃO EDUCAT E CULT JOSE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Bom Despacho	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Bom Despacho	28	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Bonfinópolis de Minas	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Bueno Brandão	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Bueno Brandão	31	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA BENEFICENTE DE BUENO BRANDAO	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Cabo Verde	24	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Caldas	31	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Caldas	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	Qualquer momento		VTA negativa
1.4	MG	Cambuquira	19	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL ALTERNATIVA DE RADIODIFUSÃO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada

\* Conforme diretrizes do DR4, item VI, página 7

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (2/7)

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = do

28/Fev/22

Status d+109

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.4	MG	Campanário	6	MUNICIPIO DE CAMPANARIO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Campestre	26	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Canaã	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Canaã	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Carai	29	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Carandá	7	MUNICIPIO DE CARANDAI	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Carandá	11	MUNICIPIO DE CARANDAI	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Carandá	30	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Carangola	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Carangola	28	FUNDACAO CRISTIANO VARELLA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Carlos Chagas	6	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Carmo da Mata	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Carmo da Mata	12	ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA DE CARMO DA MATA	Qualquer momento		VTA negativa
1.4	MG	Carmo de Minas	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Carmópolis de Minas	6	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Carneirinho	24	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Central de Minas	12	MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Centralina	7	REDE VITORIOSA DE COMUNICACOES LTDA	Qualquer momento		VTA negativa
1.4	MG	Centralina	13	REDE VITORIOSA DE COMUNICACOES LTDA	Qualquer momento		VTA negativa
1.4	MG	Chiador	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Conceição de Ipanema	34	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Conceição do Mato Dentro	14	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Conceição do Rio Verde	20	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL ALTERNATIVA DE RADIODIFUSAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Conselheiro Pena	46	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Cordislândia		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Canal inviável
1.4	MG	Corinto	46	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Coronel Murta	12	MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Córrego Danta	39	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Cristina	22	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL ALTERNATIVA DE RADIODIFUSAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada

\* Conforme diretrizes do DR4, item VI, página 7



# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (3/7)

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

28/Fev/22

Status d+109

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de corte	MOTIVO
1.4	MG	Crucilândia	41	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Delta	50	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Desterro de Entre Rios	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Divinésia	2	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Dores do Indaiá	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Dores do Indaiá	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Douradoquara	13	MUNICIPIO DE DOURADOQUARA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Douradoquara	27	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Engenheiro Caldas	16	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Ervália	9	ERVALIA PREFEITURA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Ervália	17	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Espinosa	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Estrela do Sul	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Francisco Sá	26	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Gouveia	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Grão Mogol	24	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Grupiara	6	MUNICIPIO DE GRUPIARA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Guaraniá	6	GREMIO ESPORTIVO ALUMINAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Guaranésia	51	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Iapu	35	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Ibiraci	28	IBIRACI PREFEITURA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Ibitiúra de Minas	18	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Igaratinga	43	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Ipuiúna	2	MUNICIPIO DE IPUIUNA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Ipuiúna	30	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Iraí de Minas	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Itacarambi	8	MUNICIPIO DE ITACARAMBI	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Itamarati de Minas	7	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Itambacuri	7	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade

\* Conforme diretrizes do DR4, item VI, página 7

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (4/7)

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = do

28/Fev/22

Status d+109

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.4	MG	Itambacuri	7	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Itambacuri	30	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Itanhandu	38	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL ALTERNATIVA DE RADIODIFUSAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Itanhomi	16	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Itapagipe	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Itapagipe	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Itapeva	9	Televisão Sul de Minas S/A.	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Itueta	9	MUNICIPIO DE ITUETA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Jaíba	26	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Jequeri	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Jequitai	7	SOCIEDADE DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE JEQUITAI	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Joáima	2	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Joaquim Felício	24	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Juruaia	15	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Lajinha	46	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Lamim	9	MUNICIPIO DE LAMIM	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Leme do Prado	49	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Limeira do Oeste	30	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Malacacheta	18	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Maria da Fé	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Maria da Fé	20	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL ALTERNATIVA DE RADIODIFUSAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Mato Verde	5	MUNICIPIO DE MATO VERDE	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Mato Verde	16	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Mendes Pimentel	38	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Minas Novas	13	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Minduri	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Miradouro	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Mirai	43	FUNDACAO CRISTIANO VARELLA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Moema	30	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade

\* Conforme diretrizes do DR4, item VI, página 7

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (5/7)

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

28/Fev/22  
Status d+109

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Análogo	EDA	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.4	MG	Monte Alegre de Minas	16	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Monte Alegre de Minas	6	RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Mutum	21	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Muzambinho	29	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Nova Serrana	34	FUNDACAO EDUCAT E CULT JOSE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Nova Serrana	36	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Novo Cruzeiro	21	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Onça de Pitangui	25	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Pains	14	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Palma	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Paraisópolis	2	FUNDACAO SEculo VINTE E UM	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Passa Quatro	11	TV CLUBE DE PASSA QUATRO	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Passa Quatro	17	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL ALTERNATIVA DE RADIODIFUSAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Passa Quatro	14	SISTEMA DE COMUNICACAO VALE MINAS S/C LTDA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Peçanha	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PECANHA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Pedralva	24	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL ALTERNATIVA DE RADIODIFUSAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Pedralva		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Canal inviável
1.4	MG	Perdizes	36	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Perdões	49	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Piedade de Ponte Nova		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Canal inviável
1.4	MG	Pirajuba	27	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Pirapetinga	47	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Pitangui	23	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Pitangui	51	FUNDACAO EDUCAT E CULT JOSE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Planura	44	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Pompéu	40	FUNDACAO EDUCAT E CULT JOSE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Pouso Alto	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Pouso Alto	24	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL ALTERNATIVA DE RADIODIFUSAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Pratápolis	34	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade

\* Conforme diretrizes do DR4, item VI, página 7

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (6/7)

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

28/Fev/22

Status d+109

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de corte	MOTIVO
1.4	MG	Pratápolis	43	PRATAPOLIS PREFEITURA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Presidente Olegário	10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Presidente Olegário	16	SOCIEDADE DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PRESIDENTE OLEGARIO	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Resplendor	10	SOCIEDADE DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE RESPLENDOR	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Rio Paranaíba	24	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Rio Pardo de Minas	25	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Rio Pardo de Minas	2	SOCIEDADE DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE RIO PARDO DE MINAS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Rio Piracicaba	8	S/A MINERACAO DA TRINDADE-SAMITRI	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Rio Vermelho	26	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Sabinópolis	19	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Santa Bárbara do Tugúrio	11	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Santa Juliana	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Santa Juliana	17	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Santa Maria do Suaçuí	46	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Santa Rita de Minas	3	ASSOCIACAO CULTURAL EDUCACIONAL DA VERTENTE DO CAPARAO	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Santo Antônio do Gramma	16	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Santo Antônio do Itambé	45	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Santo Antônio do Itambé	33	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Santo Antônio do Monte	20	FUNDAÇÃO EDUCAT E CULT JOSE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	São Gotardo	4	CENTRO CULTURAL DE SAO GOTARDO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	São Gotardo	7	RADIO IBIA LTDA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	São João da Mata	28	SOCIEDADE DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE SAO JOAO DA MATA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	São João Evangelista	25	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	São José do Goiabal	5	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	São Pedro da União	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	São Thomé das Letras		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Canal inviável
1.4	MG	Serra do Salitre	36	SOCIEDADE DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE SERRA DO SALITRE	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Serrania	18	SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA S. A.	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Serrania	27	TELEVISAO SOCIEDADE LIMITADA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada

\* Conforme diretrizes do DR4, item VI, página 7

# PROJETO NÃO SERÁ IMPLANTADO NO CANAL (7/7)

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0


28/Fev/22  
Status d+109

FASE	UF	MUNICÍPIO	Canal Analógico	EDA	PRAZO DR4	Data de co	MOTIVO
1.4	MG	Serrania	51	FUNDACAO TELEVISAO EDUCATIVA DE POCOS DE CALDAS	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Serrania		CAMARA DOS DEPUTADOS	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Canal inviável
1.4	MG	Serro	13	SERRO PREFEITURA	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Serro	23	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Simão Pereira	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO PEREIRA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Soledade de Minas	9	TELEVISAO SUL DE MINAS S/A	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Soledade de Minas	45	TV MINAS SUL LTDA	Qualquer momento		RDF licenciou o canal
1.4	MG	Varzelândia	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELANDIA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Varzelândia	34	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Vazante	7	MUNICIPIO DE VAZANTE	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada
1.4	MG	Vazante	9	ASSOCIACAO VAZANTINA DE ESPORTE, CULTURA, ARTE E ECOLOGIA	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Vazante	26	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Virginópolis	21	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Edital	11/nov/21	Sem manifestação da entidade
1.4	MG	Volta Grande	17	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	60 dias após término do Edital	10/jan/22	Entidade não qualificada

# FLUXO | FASE 2 | ES . RJ . PR . SC . RS

344 MUNICÍPIOS • 1.663 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JAN/22 = d0

28/Fev/22  
Status d+38

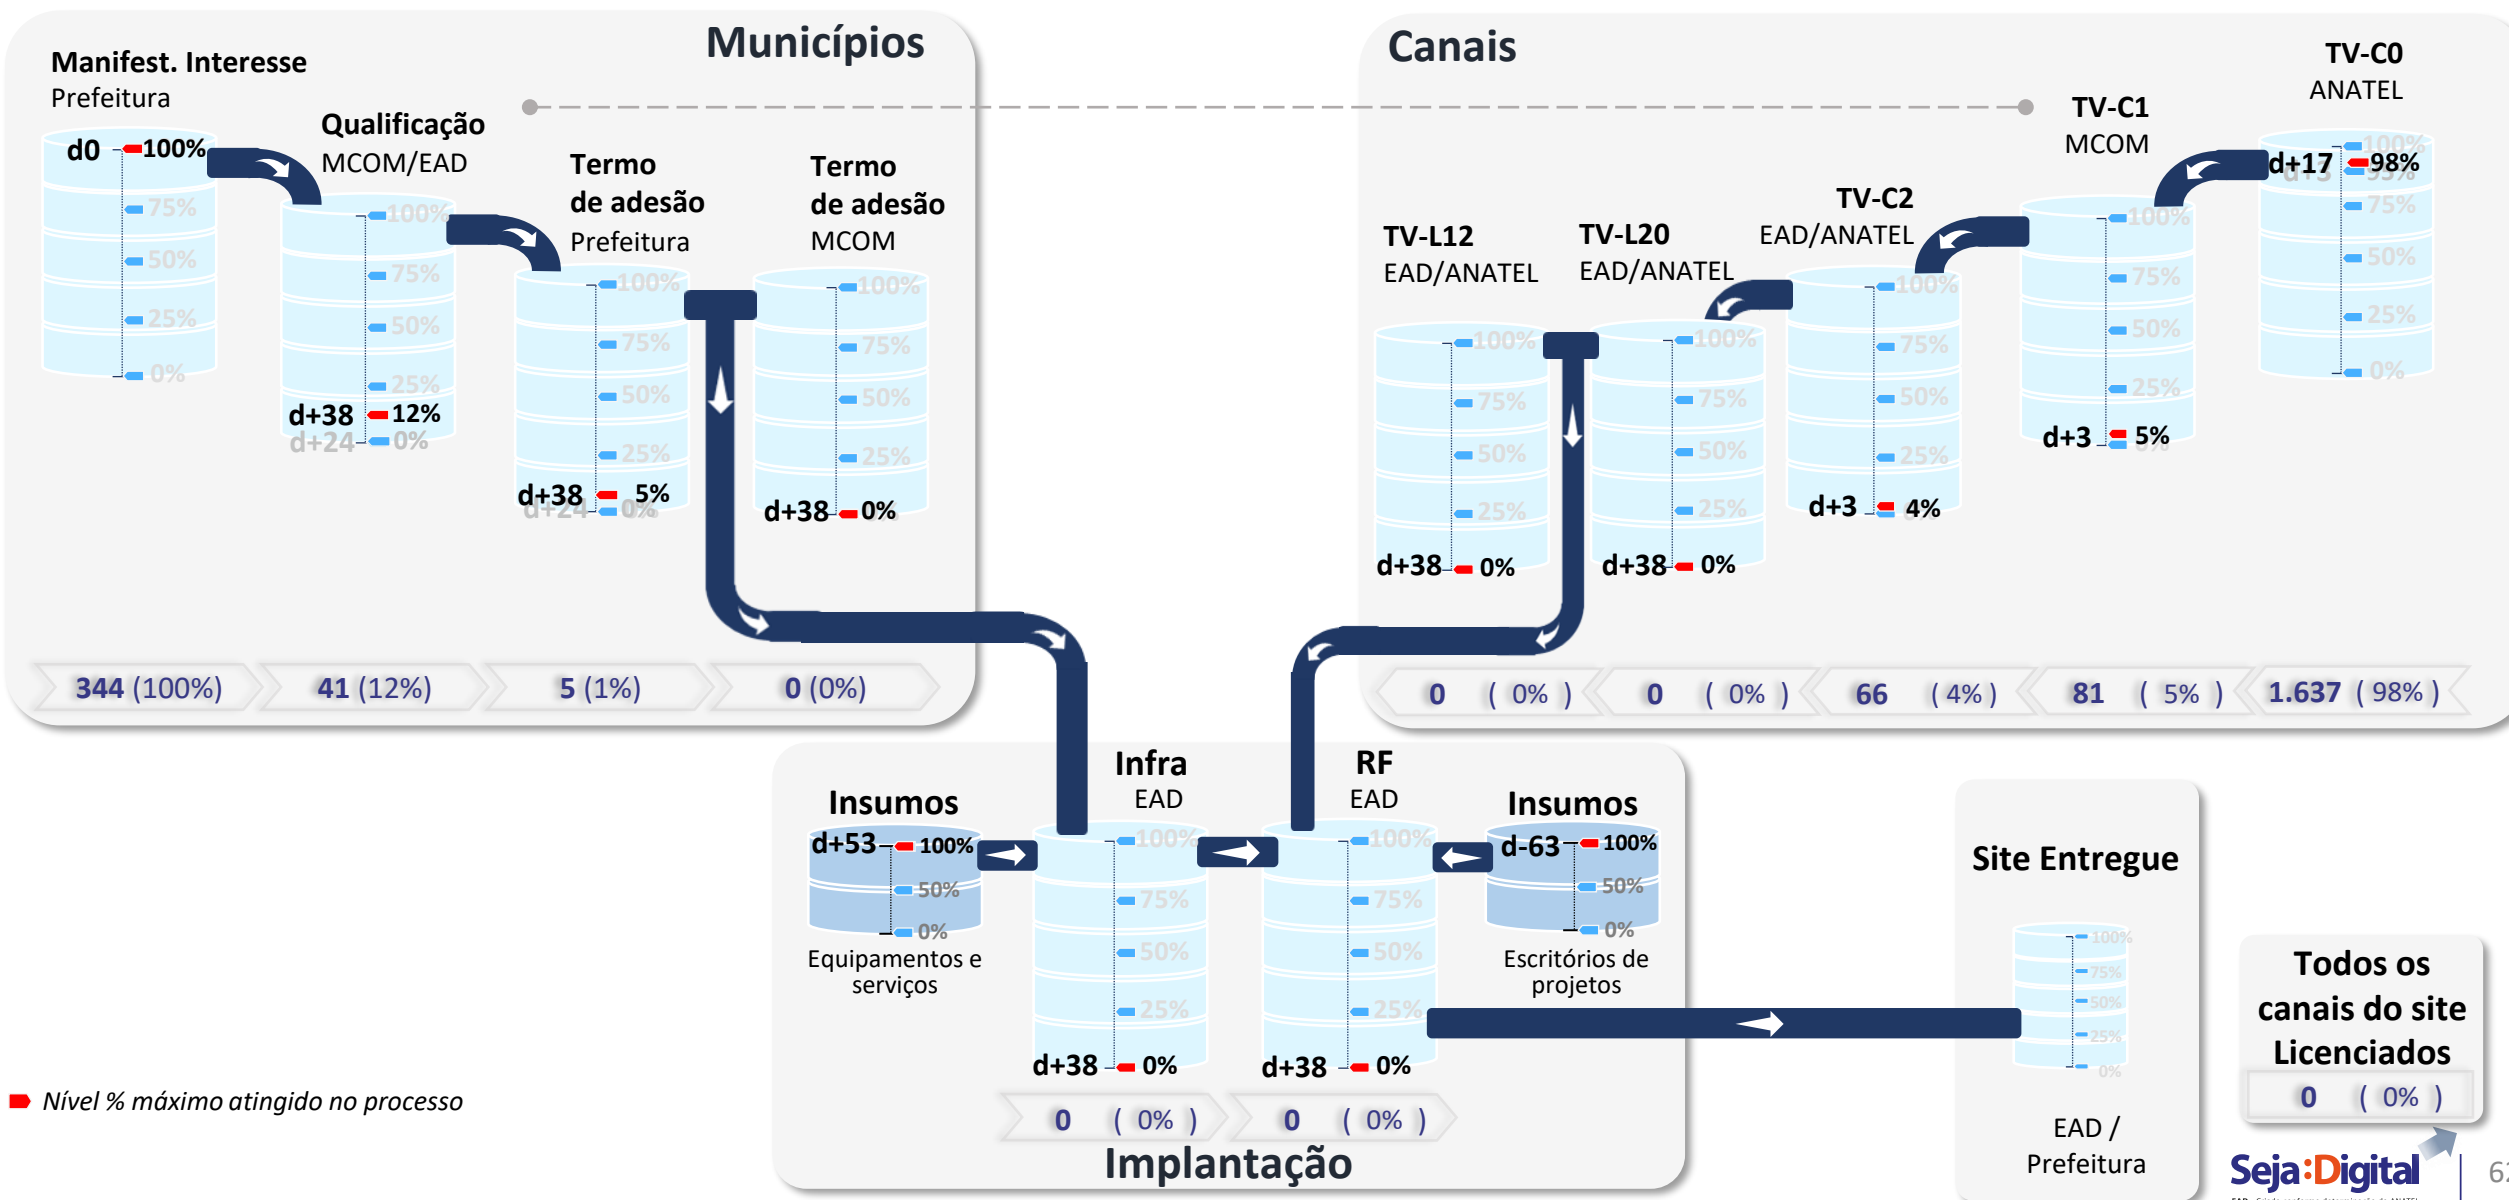

# QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO


FASE 2 • 344 MUNICÍPIOS • 1.663 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JAN/22 = d0

28/Fev/22

Status d+38

## Manifestação de interesse da entidade


Entidade



344 (100%)

## VTA positiva da entidade manifestante


EAD



343 (100%)

## Entidade manifestante qualificada


MCOM



164 (48%)

## Local Habilitado

Prefeitura / EAD




315 (92%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

■ Nível % máximo atingido no processo

# FLUXO TIPO

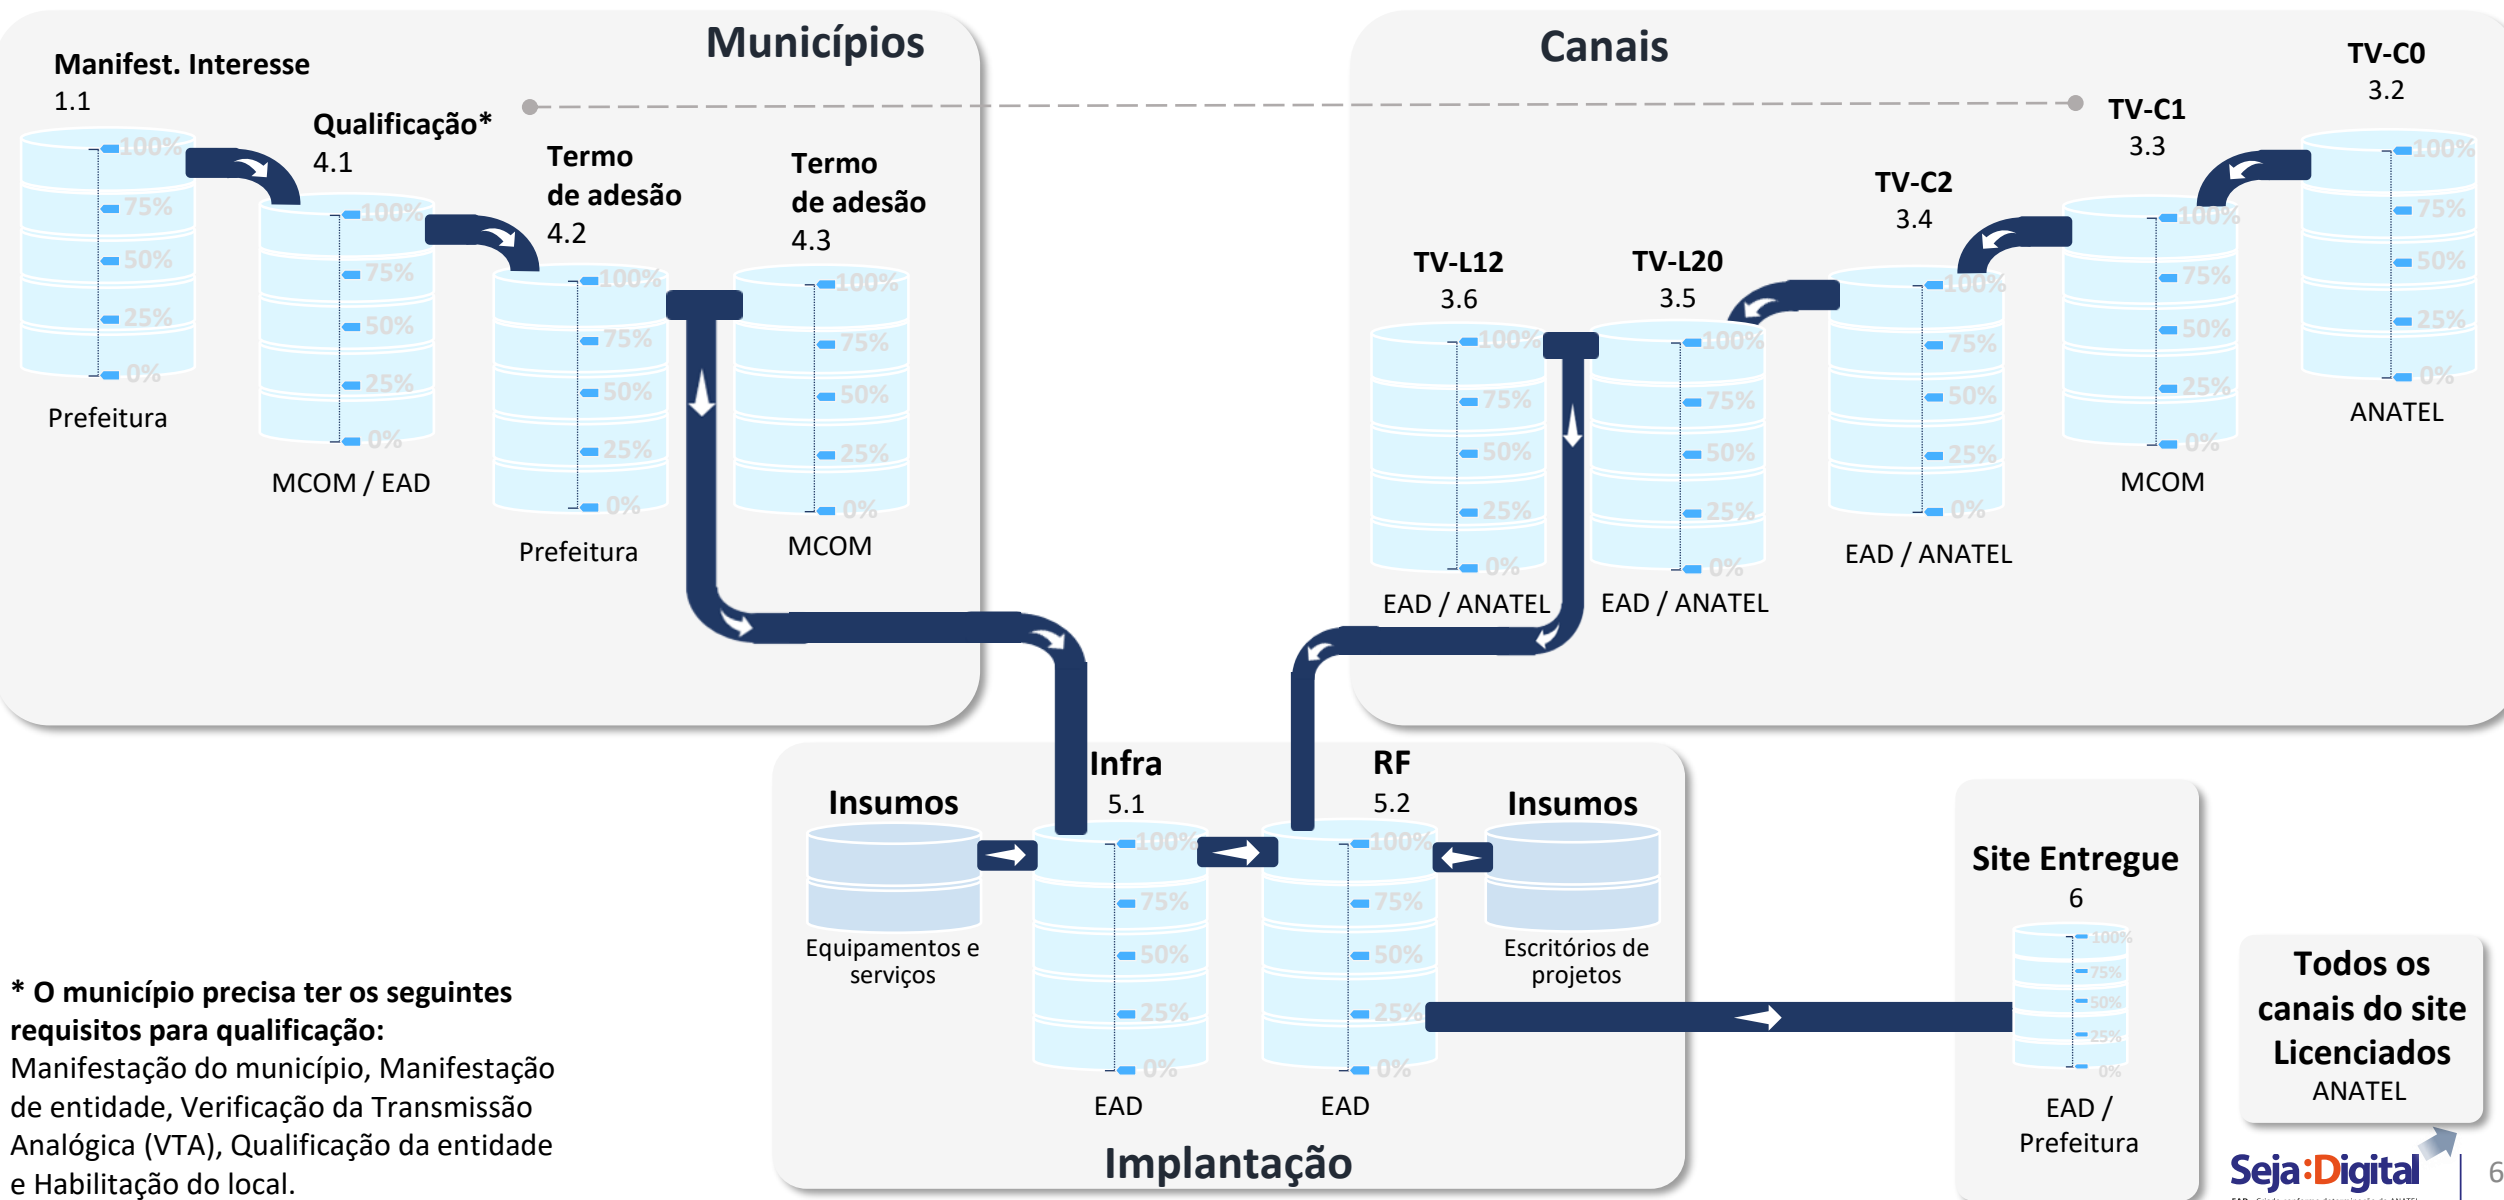


\* O município precisa ter os seguintes requisitos para qualificação:  
 Manifestação do município, Manifestação de entidade, Verificação da Transmissão Analógica (VTA), Qualificação da entidade e Habilitação do local.



# QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Manifestação de  
interesse da  
entidade**


2.1



Entidade

**VTA positiva da  
entidade  
manifestante**


2.2



EAD

**Entidade  
manifestante  
qualificada**


2.3



MCOM

**Local  
Habilitado**


1.2



Prefeitura / EAD

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

# ESTEIRA

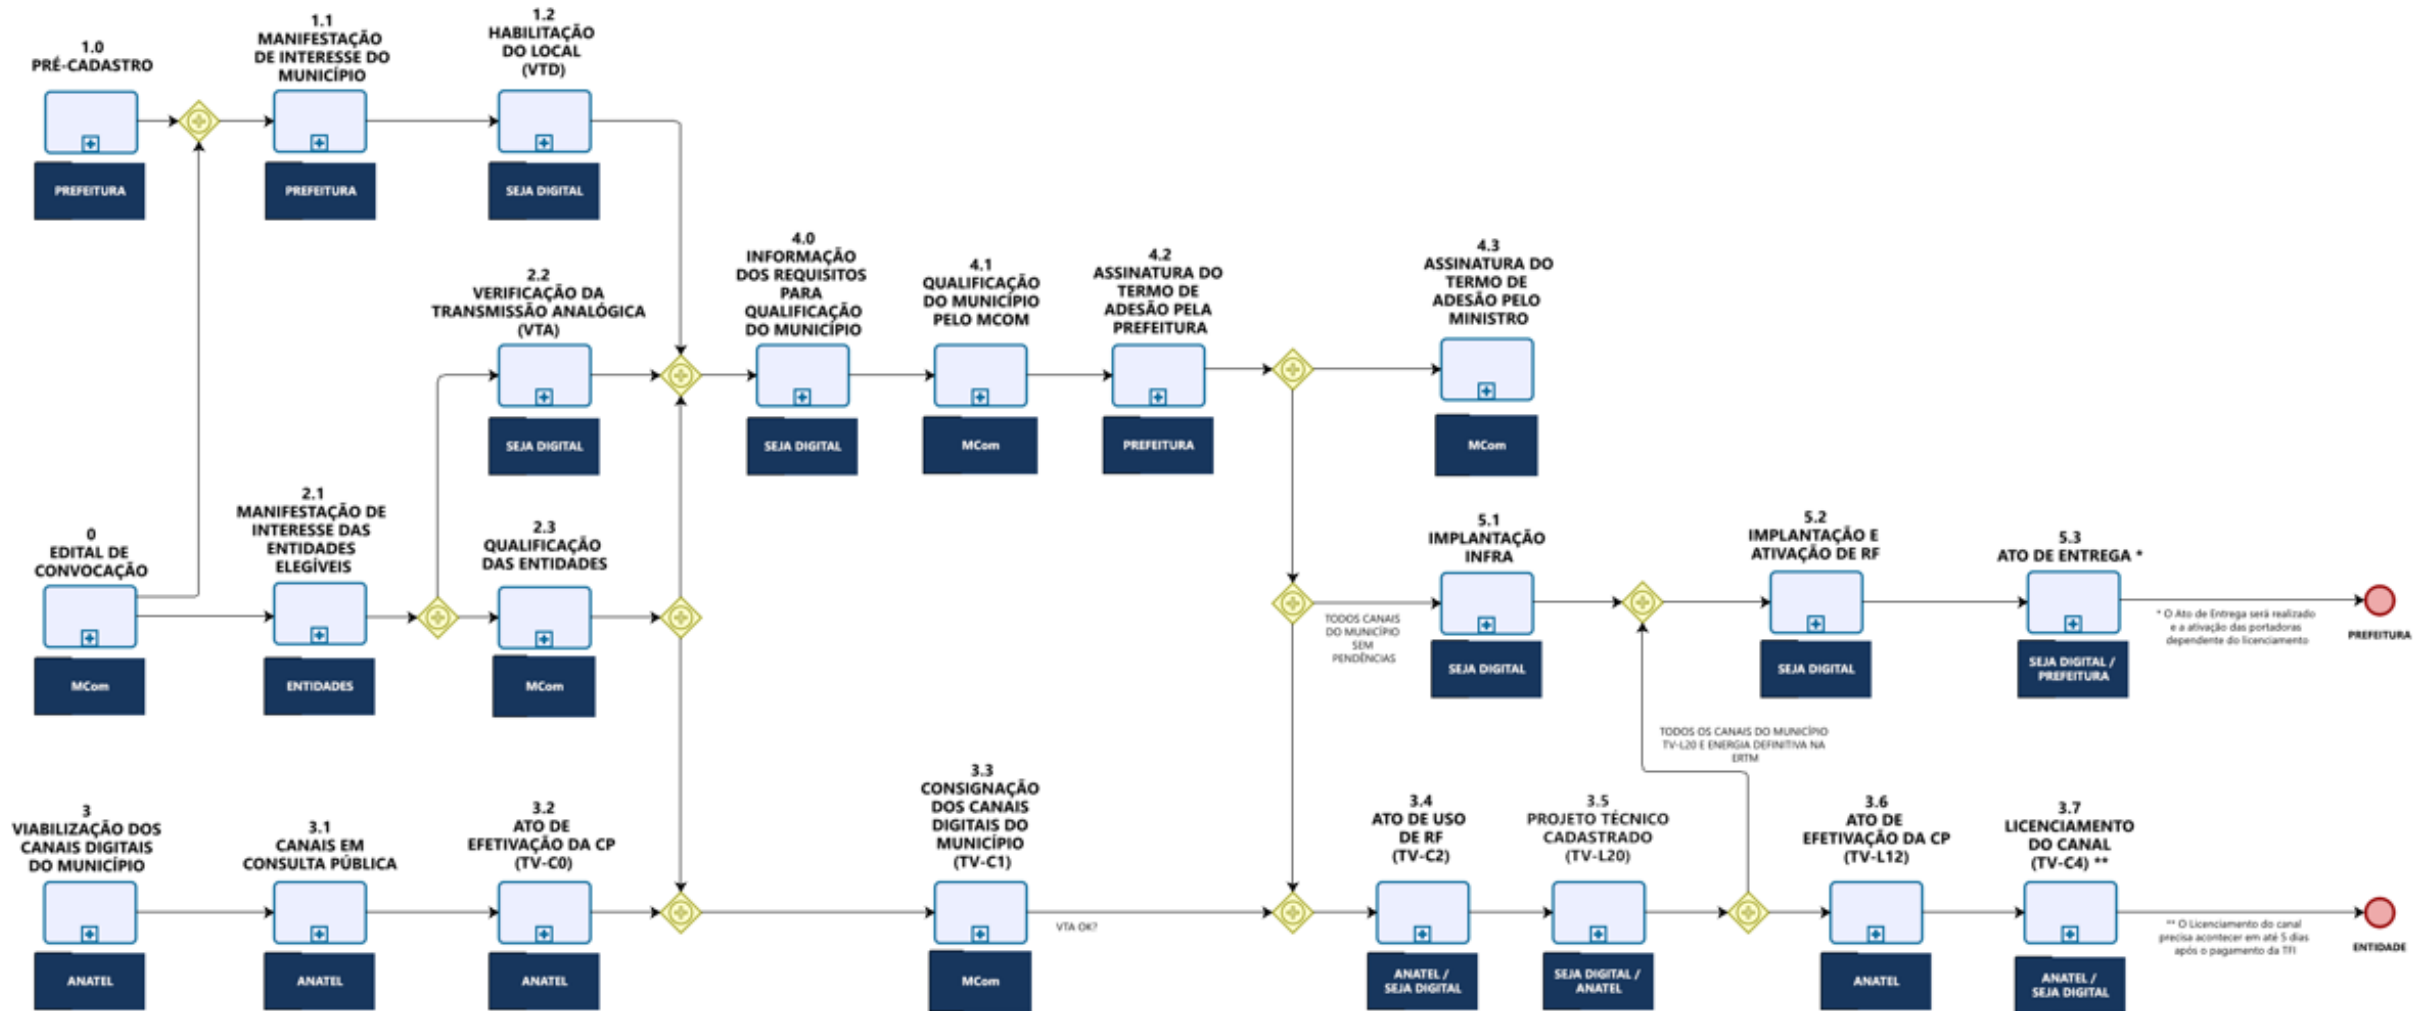

**Seja:Digital** 

EAD - Criada conforme determinação da ANATEL
