



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED

Data: 12 de setembro de 2023 (terça-feira).

Horário: 11h às 13h.

Local: Hotel Royal Tulip - Brasília-DF / Plataforma Teams.

LISTA DE PRESENÇA MEMBROS DO GIRED:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	PRESENTE NA REUNIÃO?
Presidente do GIRED - Anatel	---	Moisés Queiroz Moreira	Sim
Secretário Executivo do GIRED - Anatel	---	Vinicius Oliveira Caram Guimarães	Sim
Ministério das Comunicações	Titular	Titular da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica	Não
	Suplente	Titular do Departamento de Radiodifusão Pública, Comunitária e Estatal	Sim
Representante dos Radiodifusores	Titular	João Camilo Junior	Sim
	Suplente	Wagner de Sousa Bastos	Não
	Titular	Flávio Lara Resende	Sim
	Suplente	Luiz Carlos Abrahão	Sim
	Titular	Raymundo Costa Pinto Barros	Não
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	Sim
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	Sim
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	Sim
Proponentes Vencedoras	Titular - Telefônica	José Gonçalves Neto	Não
	Suplente - Telefônica	Marcus Vinicius Brunetti	Sim
	Titular - Claro	Antônio Oscar Petersen	Sim
	Suplente - Claro	Monique Pereira Ibitinga de Barros	Sim
	Titular - Algar Telecom	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	Sim
	Suplente - Algar Telecom	Neiva Miranda Coelho	Não
	Titular - Tim	Mario Girasole	Sim
	Suplente - Tim	Marcelo Concolato Mejias	Sim

PARTICIPANTES EXCEPCIONAIS:

Nome	Representando	Entidade
Israel Franke Silva	Wagner de Sousa Bastos	EBC

OUTROS PARTICIPANTES:

Nome	Entidade
Alex Pires de Azevedo	Anatel
Antônio Carlos Martelleto	EAD
Carlos Saldanha	EAD
Cíntia da Conceição Landim	Anatel (Terceirizada)
Cristiane Lavandoski Mano Freitas	EAD
Erica Souza Neves	Claro
Gunnar Bedicks	EAD
Henrique Gomes Pinheiro	Anatel
Karine Medeiros Dias	Anatel
Kely Alves Costa	Anatel (Terceirizada)
Luis Renato Giffoni Rodrigues	Anatel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel
Marina Cruz Vieira Villela Soares	Anatel
Martin Jales Hon	Anatel

Oséias Fonseca de Aguiar	Anatel
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Paulo Vaggione	EAD
Reinaldo Bizerril Camargo	EAD
Renato de Campos Ribeiro	EAD
Sebastião Sérgio de Oliveira Junior	Tim
Sidney Azeredo Nince	Anatel
Takeshi Ikeda	Anatel

ASSUNTOS:**1. SAUDAÇÃO INICIAL.**

O **Presidente do GIRED, Conselheiro Moisés Queiroz Moreira**, cumprimentou a todos e deu início à 91ª Reunião Ordinária do GIRED e destacou a participação como, ouvintes, de representantes da Radiodifusão e das prestadoras, conforme solicitação das mesmas e passou para o item 1 da Pauta.

2. ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2023.

O **Presidente do GIRED, Conselheiro Moisés Queiroz Moreira**, questionou aos presentes se haveria ajustes em relação à minuta de Ata encaminhada.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED**, declarou aprovada a Ata da 90ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de agosto de 2023.

3. ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD).

O **Presidente do GIRED** solicitou que o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** fizesse uma breve apresentação quanto ao Informe da EAD.

O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** cumprimentou a todos e projetou uma apresentação acerca do Informe da EAD. Sobre o tópico **Ativação do LTE**, informou que faltam 79 cidades a ativar com o LTE no 700 MHz, o que, em termos populacionais, representa praticamente zero, e que, em agosto de 2023, foram ativadas 6 cidades. Registrou que esta atividade já vem em ritmo bem lento nos últimos tempos. No tocante às fontes interferentes no LTE, relatou que, do total de 7.059 registros de 1º de julho de 2017 a 31 de agosto de 2023, no mês de agosto, foram registrados apenas 2 casos, sendo 1 de radiação restrita e outro de outras fontes não caracterizadas.


O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** destacou que encerrarão as atividades de mitigação de TV no LTE no dia 30 de setembro de 2023, com a finalização dos itens 12-IX, 12-X e 12-XII do Anexo II-B do Edital, conforme o *slide* abaixo reproduzido:

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE MITIGAÇÃO DE TV NO LTE NO DIA 30/SET/23


- Serão concluídas as atividades relacionadas a mitigação de interferências de TV no LTE.
- Estarão finalizados os itens 12-IX, 12-X e 12-XII do Anexo-II-B do Edital.
- A partir de 1º de Outubro de 2023, as operadoras informarão diretamente à Anatel caso alguma interferência de TV no LTE seja identificada. O procedimento será o mesmo que já vem sendo utilizado para que as operadoras informem à Anatel sobre "outras fontes interferentes".

No **Projeto TV Digital**, a EAD realizou os seguintes destaques:

(i) Na esteira dos municípios, projetou o seguinte *slide*, sem tecer comentários:

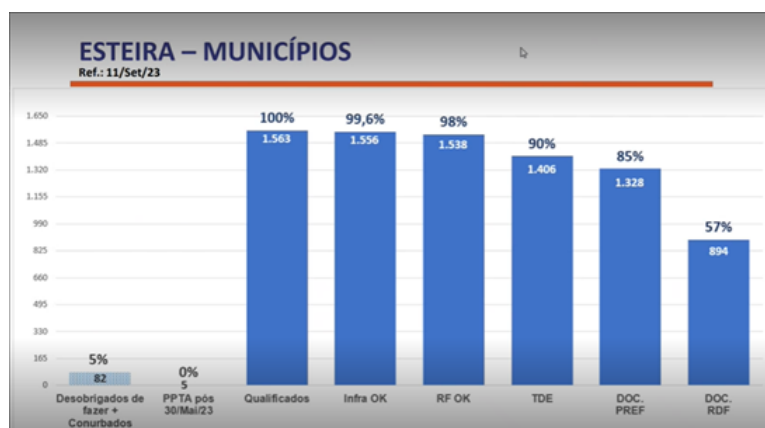

(ii) Na esteira de canais, projetou o *slide* abaixo reproduzido destacando que o projeto se encontra praticamente concluído, com 99,8% de projetos cadastrados e 96% de canais licenciados:

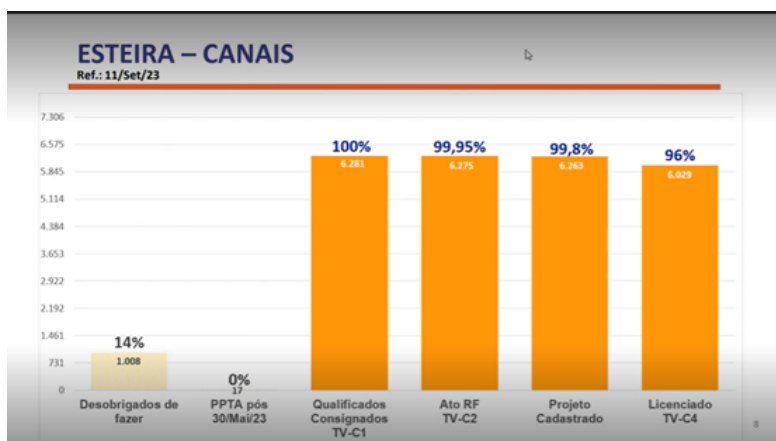


(iii) No Quadro PDB – TV DIGITAL, apresentou uma visão geral do programa sob a ótica dos municípios que demonstra a sua situação atual, com o destaque para os seguintes números:

- O total geral de 1.650 municípios;
- 80 municípios com desobrigação de fazer e 5 com pendências junto às Prefeituras do local;
- Total de 1.540 municípios entregues, excluindo, do total geral, os 85 municípios com desobrigação de fazer e 5 com pendências junto às Prefeituras;
- Faltam 7 municípios para conclusão da Infra e 25 municípios para a conclusão da RF;

(iv) Ainda quanto ao Quadro PDB – TV DIGITAL, apresentou outra visão geral do programa sob a ótica dos canais que demonstra a sua situação atual, com destaque para o que está concluído, o que está em execução, ou seja no chamado *pipeline* (141 canais), e para os canais avulsos que foram qualificados depois da implantação da estação já ter sido feita em determinada localidade.

(v) No *status* dos cercamentos, projetou o seguinte *slide*, sem tecer comentários:

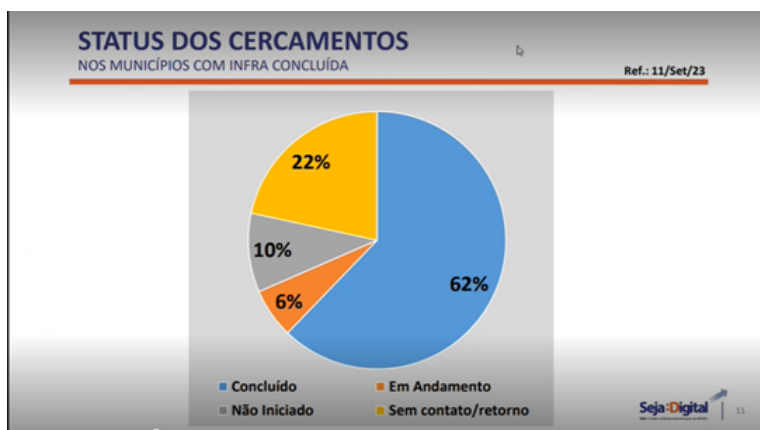

(vi) Sobre as adequações nas ERTMs, a EAD reportou os dados constantes do *slide* abaixo, sem tecer comentários:

Descrição	Qtd. de casos
Engenharia de Produto	369
Manutenções	701
Sinistro	17

(vii) Nos demais assuntos do PDB, assinalou os projetos avulsos:

- Canais avulsos: finalização de 20 canais em julho, 35 canais em agosto e 13 em setembro, devendo chegar ao número de 69 para completar o projeto que corre em paralelo com a implantação das infraestruturas.
- Filtros 5G: a previsão de executar 591 até o final de setembro de 2023, sendo que até a presente data já foram executados 242.

(viii) Sobre a distribuição de kits, apresentou o *slide* a seguir com um quadro resumo em cada uma das fases do projeto, destacando que 64% dos municípios foram finalizados, 38% dos municípios estão em processo de instalação ou programados até o final do mês de setembro, 5 municípios que apresentaram problema de local estão em planejamento e 80 municípios com desobrigação de fazer para os quais não acontecerá a distribuição de kits:

DISTRIBUIÇÃO DE KITS																
STATUS																
Ref.: 11/Set/23																
FASE	Municípios						Beneficiários						Apoios realizados (Mun. Finalizado)			
	Total	Finalizado	% Tot.	Programado	% Tot.	Em Planej.	Total	Finalizado	% Tot.	Programado	% Tot.	Em Planej.	% Tot.	% Finalizado		
Fases 1.1/1.2	240	238	15%	1	0,1%	1	0,1%	986.621	975.142	20%	4.739	0%	6.740	0,1%	331.682	34%
Fase 1.3	318	294	19%	23	1%	1	0,1%	1.885.487	1.738.113	35%	139.558	3%	7.816	0,2%	644.288	37%
Fase 1.4	463	436	28%	27	2%			904.456	863.724	17%	40.732	1%		0,0%	209.454	24%
Fase 2	331	0	0%	330	21%	1	0,1%	488.095	0		487.495	10%	600	0,0%		
Fase 3	207	0	0%	205	13%	2	0,1%	644.884	0		641.324	13%	3.560	0,1%		
Fase 4	11	0	0%	11	1%			32.441	0		32.441	1%				
Total Qualificados	1.570	968	62%	597	38%	5	0%	4.941.984	3.576.979	72%	1.346.289	27%	18.716	0%	1.185.424	33%
Desobrigação de Fazer	80							283.958								
Total Geral	1.650	1.048	64%	597	36%	5	0%	5.225.942	3.860.937	74%	1.346.289	26%	18.716	0%	1.185.424	33%

Em seguida, o Sr. Antônio Carlos Martelletto apresentou os *slides* abaixo com a descrição dos canais desqualificados após a liberação da 90ª Reunião Ordinária do GIRED, bem como daqueles implantados que foram desobrigados de fazer nessa mesma reunião:

CANAIS DESQUALIFICADOS APÓS DELIBERAÇÃO DA 90ª RO DO GIRED										
Código IBGE	UF	Município	Nome EDA (Digital)	Faixa da estação (digital)	CANAL DIGITAL	Fase	TDE finalizado	Era canal avulso	Equipamento comprado	Equipamento implantado
2110708	MA	São Domingos do Maranhão	TV ITAPICURU LTDA	50441947190	36	1.2	Sim	Sim	Não	Não
2501104	PB	Areia	PABLO COMUNICACOES LTDA - EPP	50445851651	15	1.2	Sim	Sim	Não	Não
2110302	MA	Santo Antônio dos Lopes	TV ITAPICURU LTDA	50443089191	36	1.2	Sim	Sim	Não	Não
4206603	SC	Guarujá do Sul	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA	50442520506	20	2	Sim	Não	Sim	Sim

CANAIS IMPLANTADOS QUE FORAM DESOBRIGADOS DE FAZER CONFORME 90ª RO DO GIRED							
Código IBGE	UF	Município	CANAL DIGITAL	Fase	TDE finalizado	Equipamento comprado	Equipamento implantado
2109106	MA	Presidente Dutra	36	1.2	Sim	Sim	Sim
2610509	PE	Passira	20	1.3	Sim	Sim	Sim
5005202	MS	Ladário	32	3	Sim	Sim	Sim

O Sr. Antônio Carlos Martelletto relatou também os cinco casos dos municípios que estão em PPTA após 30 de maio de 2023, conforme a descrição contida no *slide* a seguir:

MUNICÍPIO EM PPTA PÓS 30/MAI/23 Ref.: 11/Set/23

FASE	Cod. IBGE	UF	Municípios	STATUS	Detalhe Pendência
Fase 1.2	2111102	MA	São João dos Patos	PPTA pós corte	COMAR - Em análise
Fase 1.3	2917300	BA	Ituberá	PPTA pós corte	COMAR - Projeto negado (sem indicação)
Fase 3	5107776	MT	Santa Terezinha	PPTA pós corte	COMAR - Projeto negado (redução da altura da torre)
Fase 2	4217006	SC	São Ludgero	PPTA pós corte	Prefeitura solicitou mudança de local (sem indicação)
Fase 3	1101104	RO	Itapuã do Oeste	PPTA pós corte	Prefeitura solicitou mudança de local (sem indicação)

Por fim, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** informou que a proposta de equalização do contrato de telesupervisão a fim de garantir um prazo idêntico para todas as estações implantadas por mais um período determinado ainda está em análise jurídica e aguarda-se uma definição breve sobre o tema.

Dando continuidade à apresentação, a EAD passou a reportar sobre as suas atividades no **Projeto Norte Conectado**, projetando o *slide* abaixo reproduzido com as atividades planejadas:

ATIVIDADES PLANEJADAS

- **Transição MCOM – Backbone**
 - ✓ Assinatura do Termo de Declaração e Entrega
 - ✓ Transferência da Licença de Operação e Termos de Cessão de Uso
 - ✓ Transferência técnica da infraestrutura
- **Transição MCOM – Rede Metropolitana**
 - ✓ Concluir ativação Parintins e Oriximiná
 - ✓ Assinatura do Termo de Declaração e Entrega II
 - ✓ Transferência técnica da infraestrutura

O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** informou que a EAD entende que há uma dificuldade por parte do Ministério de receber a infraestrutura até que o operador neutro esteja completamente constituído e, assim, foi feita uma proposta de Sustentação Temporária da Infraestrutura atrelada à assinatura dos Termos de Declaração e Entrega do *Backbone* e da Rede Metropolitana, pelo período de outubro a dezembro de 2023, no valor aproximado de 2,5 milhões de reais, cujos termos estão sob análise no grupo.

O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** relatou que o projeto está praticamente concluído, faltando apenas a implantação de duas Redes Metropolitanas, conforme o *status* apresentado no *slide* seguinte:

ETAPAS - STATUS

#	ETAPAS	ESCOPO	DT ou ESPECIFICAÇÃO	RFP	CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO
1	EH-Estudo Viabilidade Rota (EVR)	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
2	RFI Turnkey	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
3	Licenciamento e Autorizações	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
4	Cabo Óptico Subaquático	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
5	EH-Estudo Rota Aprimorada (ERA)	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
6	Serviços de Lançamento, ISP (LIP)	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
7	Calha de Ancoragem (AMH)	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
8	Data Center Modular (DCM)	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
9	Sistema Transmissão Óptica (STO)	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
10	Rede Metropolitana Óptica (RMO)	OK	OK	OK	OK	EM EXECUÇÃO-SET/23
11	Termo Entrega ao MCOM (Backbone)	OK	OK	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO - NÃO ASSINADO
12	Termo Entrega ao MCOM (Rede Metropolitana)	OK	OK	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	EM EXECUÇÃO-SET/23

Ato contínuo, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** comunicou que hoje foi colocado no *site* da Seja Digital o Relatório de Avaliação Socioambiental do Projeto da Infovia O1 que consta a avaliação das emulações implantadas no projeto, incluindo o mapeamento de um conjunto de Objetivos e Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O **Presidente do GIRED** fez uma intervenção para comentar que o sobredito relatório ficou muito bem feito e parabenizou a EAD pela elaboração desse documento.

Em seguida, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** reportou a visão sobre o Relatório Final das atividades da EAD, conforme o *slide* abaixo reproduzido:

Descrição	Atividade		Visão Auditada 30/Set	Visão Auditada 31/Out		Visão Auditada 30/Nov
	Operacionais	Administrativas		Corte Set/23	Corte Out/23	
Mitigação TV no LTE	x	x	0	100%	0	0
Termo de Adesão		x	0	100%	0	0
TDE		x	198	87%	50	0
Implantação ERTM (municípios)	x	x	30	98%	0	0
Municípios em pendência (PPTA) após 30/Mai/23	x	x	5	66,7%	?	?
Licenciamento de canais		x	831	87%	175	0
Distribuição de kits	x	x	596	62%	1*	0*
Acesso aos documentos - Prefeituras		x	261	83%	75	0
Acesso aos documentos - Radiodifusores		x	688	56%	200	0
Sobras de estoque (TX e RX)		x	--	--	--	TBD
Canais licenciados não implantados		x	--	--	--	TBD
Norte Conectado	x	x	TBD	100%	TBD	TBD
Auditoria Demonstrações Financeiras		x	Parcial			TBD
Encerramento dos contratos operacionais		x				X

Nesse *slide*, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** destacou as três frentes de projetos e a parte administrativa-financeira que será objeto de parecer de Auditoria Independente e fez os seguintes comentários:

- (i) Mitigação TV no LTE, na linha de cor azul, informou que está 100% executado, com pendências operacionais e administrativas que se encerrarão até o final do mês de setembro;
- (ii) Tv Digital, nas linhas na cor salmão, informou que a implantação de 98% das ERTMs nos municípios está prevista para até o final do mês de setembro;
- (iii) Norte Conectado, na linha de cor cinza, informou que está 100% executado; e
- (iv) No final de setembro, será apresentado o relatório da auditoria com período de corte em agosto de 2023.

Ao final de sua apresentação, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** concluiu que o projeto está praticamente concluído, faltando apenas questões marginais na TV DIGITAL e no Norte Conectado, que depende da aceitação por parte do Ministério.

Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** questionou aos membros do Grupo se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado e parabenizou a todos pela conclusão do projeto.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** registrou que, conforme apresentado pelo **Sr. Antônio Carlos Martelletto**, encerram-se então as obrigações primárias no que compete aos itens 12-IX, 12-X e 12-XII do Anexo II-B do Edital nº 002/2014-SOR/SPR/CDANATEL. Pelas projeções do Projeto TV Digital, os números são relevantes e importantes, em especial para radiodifusão com 93% de adesão e desses 98% a serem concluídos.

Afirmou que, quanto ao projeto Norte Conectado, faltam 2 Redes Metropolitanas para conclusão das atividades, o que ocorrerá até o fim do mês de setembro.

O **Presidente do GIRED** registrou que, conforme já determinado na 87ª Reunião Ordinária do GIRED, realizada no dia 28 de abril de 2023, a EAD deverá apresentar ao GIRED, até o dia 30 de setembro de 2023, o relatório final de execução das atividades, relatório contábil e parecer formulado por auditoria independente no intuito de que os documentos sejam apreciados pelo grupo executivo e submetidos ao Conselho Diretor com vistas à aprovação do encerramento das atividades da EAD e do GIRED.

Não havendo manifestações, e considerando que neste item não há deliberações, o **Presidente do GIRED** passou para o item 3 da Pauta.


4. ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL NORTE CONECTADO (GT-NORTE).

O **Presidente do GIRED** concedeu a palavra ao **Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-NORTE**, para que fizesse sua apresentação.

O **Sr. Sidney Azeredo Nince** cumprimentou, inicialmente, a todos e, em seguida, informou que faria uma breve apresentação sobre o andamento do Projeto Norte Conectado referente à Infovia 01 (Santarém/PA – Manaus/AM), projetando o *slide* abaixo reproduzido que mostra o mapa da referida infovia, no qual é especificada a rota expressa entre Manaus e Santarém, e as quatro rotas ramificadas, em vermelho, atendendo a quatro municípios, sendo três no Pará e um no Amazonas:



Na sequência, o Sr. Sidney Azeredo Nince apresentou o Cronograma da Infovia 01 (Santarém/PA – Manaus/AM), que detalha as diversas etapas, nos termos do slide a seguir transcrito:

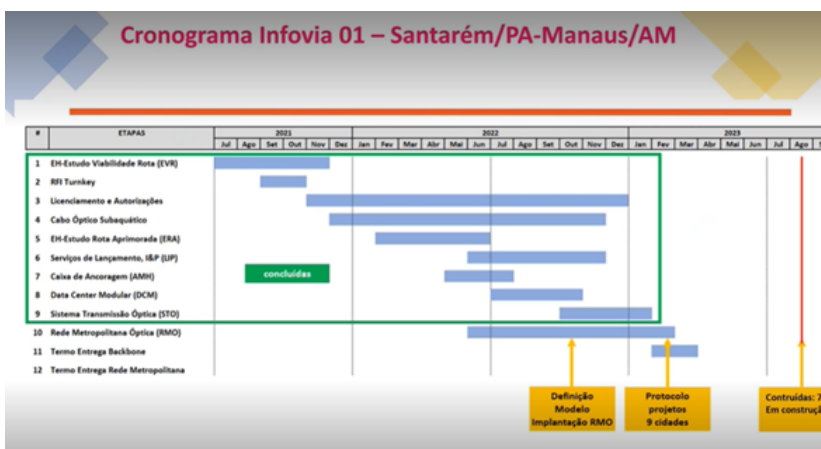


Sobre o Cronograma em apreço, o Sr. Sidney Azeredo Nince informou que:

- (i) Nove etapas já foram concluídas;
- (ii) Em relação às Redes Metropolitanas, que, dos nove municípios, sete estariam construídas e dois em construção com a previsão de conclusão até a sexta-feira desta semana;
- (iii) Teriam os dois Termos de Entrega, sendo um o Termo de Entrega do Backbone que já teria sido encaminhado ao Ministério para assinatura, e outro é o Termo de Entrega das Redes Metropolitanas que será elaborado e encaminhado ao Ministério após a conclusão final de todas as Redes Metropolitanas.


Na sequência, o Sr. Sidney Azeredo Nince apresentou um diagrama da rede óptica que mostra suas capacidades e distâncias em cada município, conforme slide abaixo:



Prosseguindo com o seu relato, o Sr. Sidney Azeredo Nince apresentou registros fotográficos, abaixo reproduzidos, que ilustram a balsa de lançamento, o navio que trouxe o cabo da fábrica, o transbordo, bem como fotos de algumas estações, do container, das caixas de ancoragem e a instalação de células fotovoltaicas para fins de consumo de energia gerada através dessas placas solares:

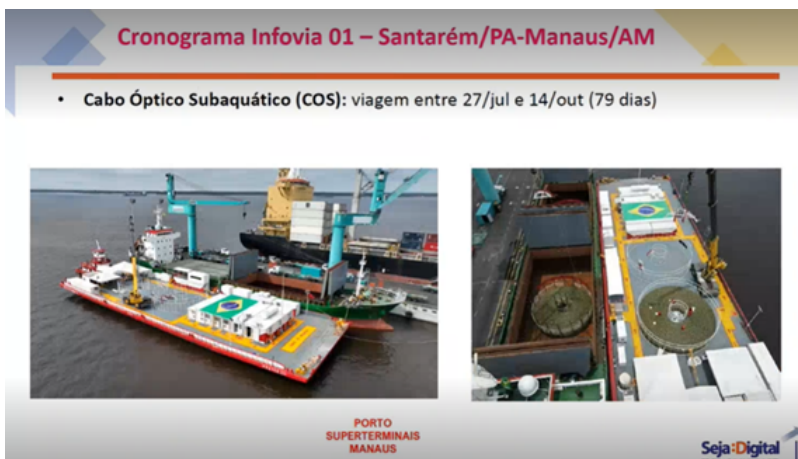

Na sequência, o Sr. Sidney Azeredo Nince apresentou o Fluxograma da Infovia 01 (Santarém/PA – Manaus/AM), abaixo reproduzido, que mostra as diversas etapas e os documentos técnicos que foram aprovados:

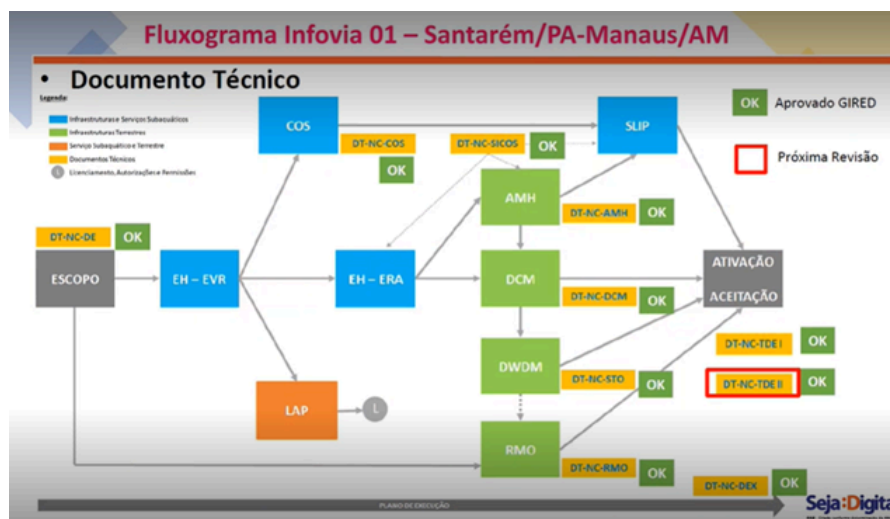

Acerca do Fluxograma em apreço, o Sr. Sidney Azeredo Nince ressaltou que resta ainda e por último a elaboração do Documento de Entrega das Redes Metropolitanas, registrando, no entanto, que o texto desse documento já teria sido aprovado pelo GIREED, restando, assim, apenas o preenchimento dos quantitativos de cada Rede Metropolitana, o que ocorrerá em breve após a conclusão das instalações.

O Sr. Sidney Azeredo Nince passou então a reportar a *status* das atividades, realizando a leitura das informações contidas no *slide* a seguir transcrito:

Status Atividades

1 Licenciamento Ambiental, Autorizações e Permissões:

- IBAMA
- ✓ Emitida Licença de Operação, publicada 30/08/23.

2 Rede Metropolitana Óptica:

- Equatorial Energia-PA
- ✓ Curuá, Juruti, Óbidos e Terra Santa executadas;
- ✓ Oriximiná em execução (até 15/09/23).
- Amazonas Energia-AM
- ✓ Autazes, Itacoatiara e Urucurituba executadas;
- ✓ Parintins em execução (até 15/09/23).

➢ 176 pontos atendidos (137 Km) – 132 escolas públicas, 12 pontos RNP, 11 hospitais, 9 Fóruns, 9 prefeituras, 3 pontos Defesa.

O **Presidente do GIRED** questionou se as distribuidoras de energia elétrica já teriam autorizado e se não teria mais alguma pendência. O **Sr. Sidney Azeredo Nince** respondeu que já houve a autorização e que não teriam mais pendências, esclarecendo que a instalação somente é iniciada após a autorização do projeto.

Concluindo o tema, o **Sr. Sidney Azeredo Nince** projetou o seguinte *slide* que aborda o *status* das atividades relacionadas à transição do *Backbone* e das Redes Metropolitanas do MCOM/RNP, realizando a sua leitura integral:

Status Atividades

3 Transição Backbone MCOM/RNP:

- MCOM – Assinatura Termo de Declaração e Entrega (encaminhado 18/07/23, 53500063635/2023);
- MCOM – Transferência Termos de Cessão de Uso;
- EAD/MCOM/RNP – Transferência técnica da infraestrutura para Consórcio Operador;
- MCOM - Transferência da Licença de Operação;

4 Transição Redes Metropolitanas MCOM/RNP:

- EAD – Elaborar Termo de Declaração e Entrega;
- MCOM/RNP – Plano de Aceitação;
- MCOM/RNP - Transferência física de sobressalentes;
- MCOM/RNP - Transferência de hospedagem da gerência das redes;
- EAD/MCOM/RNP - Alinhamento fornecedores sobre garantias.

Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** questionou aos membros do GIRED se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações e considerando que neste item não há deliberações, o **Presidente do GIRED** informou que gostaria de ressaltar a necessidade de que o Ministério assine o Termo de Entrega do cabo óptico subaquático encaminhado no dia 18 de julho de 2023, concluindo a aceitação definitiva da infraestrutura, o que viabilizará a plena utilização da importante rede de transporte pela população dos municípios atendidos.

O **Presidente do GIRED** salientou também que sejam iniciadas as devidas contratações de serviços de banda larga para os 176 pontos de atendimento cujas conexões físicas foram concluídas, resultando no efetivo atendimento da política pública.

O **Presidente do GIRED** solicitou à **Sra. Daniela Naufel Schettino** que intercedesse para que o Ministério assine, considerando que o Presidente inclusive já teria inaugurado, com a presença da imprensa, o que colocaria o Grupo em uma situação vulnerável, uma vez que o Consórcio já está consolidado e que essa assinatura formalizaria tudo, afirmando que, se fosse possível realizar essa formalização antes de setembro, seria muito importante.


A **Sra. Daniela Naufel Schettino** manifestou-se em resposta ao Presidente do GIRED, informando que internalizará a solicitação no Ministério.

Ato contínuo, **Presidente do GIRED** passou para o item 4 da Pauta.


5. ITEM 4 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL TV DIGITAL (GT-TV DIGITAL).

O **Presidente do GIRED** concedeu a palavra ao **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar, Coordenador Substituto do GT-TV DIGITAL**, para que fizesse sua apresentação.

O **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** cumprimentou, inicialmente, a todos e, em seguida, informou que, desde a última Reunião, o grupo se reuniu uma vez para realizar a sua 31ª Reunião no dia 11 de setembro de 2023, na qual foram debatidos os seguintes temas:




Em seguida, o **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** passou a reportar informações sobre a efetividade do projeto, de acordo com os dados contidos no *slide* abaixo reproduzido:

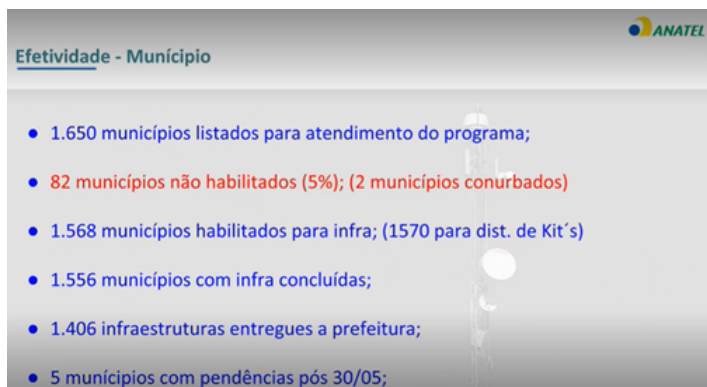

No que se refere ao tema em apreço, o **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** destacou que:


- Dos 82 municípios não habilitados, isto é, não tiveram a instalação física da infraestrutura, sendo que 2 municípios se referem ao caso de Minas Gerais, isto é, municípios conurbados, e que estariam cobertos pela infraestrutura do outro município e foram objeto de distribuição de kits de conversores;
- Das 8 infraestruturas que estão pendentes hoje, uma teria sido liberada na data de ontem, consoante comentado pelo **Sr. Antônio Carlos Martelletto**, que seria o município de Poconé que se encontra em transição, podendo ser concluído no início do mês de outubro, e que as 7 outras pendências seriam concluídas ainda este mês, conforme comentado pela EAD.

Com relação ao licenciamento de canais, o **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** projetou o *slide* a seguir transcrito, realizando a sua leitura integral:

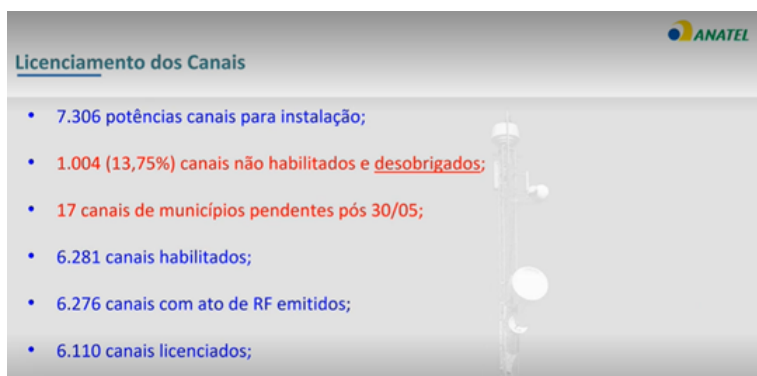

Sobre o licenciamento de canais, o **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** informou que a diferença de canais com ato de RF não emitidos refere-se a alguns casos em que estaria ocorrendo a troca de canal e que estaria no fluxo regulatório.

Na sequência, o **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** lembrou que, após a deliberação ocorrida na 90ª Reunião Ordinária do GIRED, a EAD foi desobrigada de instalar 1.004 canais, e projetou o *slide* abaixo reproduzido que retrata os 4 canais que o Ministério estaria desqualificando do programa:



Canais Desqualificados após deliberação da 90ª RO do GIRED

Código IBGE	UF	Município	Nome EDA (Digital)	Fidel da estação (digital)	CANAL DIGITAL	Fase	TDE finalizado	Era canal avulso	Equipamento comprado	Equipamento implantado
2110708	MA	São Domingos do Maranhão	TV ITAPICURU LTDA	50441947190	36	1.2	Sim	Sim	Não	Não
2501104	PB	Areia	PABLO COMUNICACOES LTDA - EPP	50445851651	15	1.2	Sim	Sim	Não	Não
2110302	MA	Santo Antônio dos Lopes	TV ITAPICURU LTDA	50443089191	36	1.2	Sim	Sim	Não	Não
4206603	SC	Guarujá do Sul	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA	50442520506	20	2	Sim	Não	Sim	Sim

- A desobrigação da EAD de instalar a será traga para deliberação na próxima reunião do GIRED.

Acerca do assunto em tela, o **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** esclareceu que os canais dos municípios de São Domingos do Maranhão, Santo Antônio dos Lopes e Guarujá do Sul, foram desqualificados porque já teriam outra outorga com a mesma programação básica, de modo que não faria sentido manter dois canais com a mesma programação básica; e que o município de Areias foi desqualificado por inviabilidade do canal de RF mesmo. Ressaltou que essas quatro situações são novas e que foram colocadas ao grupo na data de ontem e serão trazidas para deliberação do GIRED em sua próxima Reunião.

Ainda no que diz respeito à desqualificação de canais, o **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** apresentou 3 casos que estariam dentro dos 1.004 municípios já desobrigados, mas que o equipamento teria ido à campo e instalado junto com outro da tabela anterior, e projetou o *slide* abaixo:




Canais Desqualificados após deliberação da 90ª RO do GIRED

Código IBGE	UF	Município	CANAL DIGITAL	Fase	TDE finalizado	Equipamento comprado	Equipamento implantado
2109106	MA	Presidente Dutra	36	1.2	Sim	Sim	Sim
2610509	PE	Passira	20	1.3	Sim	Sim	Sim
5005202	MS	Ladário	32	3	Sim	Sim	Sim

- Deve a EAD recolher os equipamentos já instalados e adequar a documentação entregue as prefeituras.

O **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** ressaltou que, nesse ponto, o **GT-TV DIGITAL** tem orientado a EAD a recolher os equipamentos sob o argumento de que não faria sentido mantê-los *in loco* e que poderia ser objeto de algum questionamento por algum órgão de controle. Desse modo, informou que a orientação é para recolher os equipamentos e adequar a documentação para as Prefeituras de pronto, para que não fique nada pendente.

Em seguida, o **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** projetou o *slide* a seguir transcrito que mostra os municípios em PPTA (pendências) e outros com pedido para PDB, informando que os 5 municípios seriam os casos que estão pendentes hoje com a execução da infraestrutura, pelas razões abaixo:



Municípios em PPTA (pendências) e outros com pedido para PDB


FASE	Cod. IBGE	UF	Municípios	STATUS	Detalhe Pendência
Fase 1.2	2111102	MA	São João dos Patos	PPTA pós corte	COMAR - Em análise
Fase 1.3	2917300	BA	Ituberá	PPTA pós corte	COMAR - Projeto negado (sem indicação)
Fase 3	5107776	MT	Santa Terezinha	PPTA pós corte	COMAR - Projeto negado (redução da altura da torre)
Fase 2	4217006	SC	São Ludgero	PPTA pós corte	Prefeitura solicitou mudança de local (sem indicação)
Fase 3	1101104	RO	Itapuã do Oeste	PPTA pós corte	Prefeitura solicitou mudança de local (sem indicação)

- No último mês, 5 municípios resolveram as pendências.
- Está sob a responsabilidade da EAD avaliar a possibilidade de concluir as instalações dentro do prazo estabelecido pelo GIRED.

Quanto a esse tema, o **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** lembrou que esses municípios assinaram o TA dentro do prazo de 30 de maio, que havia sido deliberado na Reunião nº 78, salvo engano de sua parte. Nesse cenário, esclareceu que eles tinham sido habilitados, mas entraram com pendência, sendo que o número era bem maior, chegando a 15, e afirmou que a EAD veio trabalhando para resolver as pendências, e reiterou que, na data de ontem, foi resolvida pendência com relação ao município de Poconé e que, por sua vez, entrou na esteira de instalação, e afirmou que os 5 municípios apresentados acima ainda estão nesse *status* de pendência. Consignou ainda que, dado o cronograma que está chegando em sua fase final, o que o grupo vem falando desde o início, quando a EAD começou a apresentar essa situação, e para que a entidade fizesse todo o esforço possível para tentar viabilizar a instalação e que fosse realizada uma avaliação de que, a partir de determinado momento, ela não conseguiria mais instalar. Afirmou que isso é o que o grupo vem

reforçando à entidade e que ela tem que informar ao **GIRED** e ao **GT-TV DIGITAL** o momento em que não há mais tempo hábil para instalar e que ela seja, portanto, desobrigada por meio de deliberação dessas situações em específico. Registrou, nesse cenário, que o grupo estaria aguardando a EAD fazer essa sinalização para que a decisão seja tomada.

O **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** passou a reportar informações sobre a Telesupervisão, projetando o *slide* abaixo:



Relativamente ao tema, informou que foi realizada uma consulta à Procuradoria sobre a possibilidade dessa contratação, considerando o encerramento da EAD, para saber quem ficaria com a responsabilidade do contrato e que assumiria o controle/acompanhamento dessa solução. Afirmou que, no grupo, sempre abordam que o radiodifusores devem se movimentar para assumir, pois, mesmo sendo um ano, daqui a um ano eles teriam que assumir essa responsabilidade de supervisionar as estações para garantir a efetividade do programa no novo prazo.

Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** questionou aos membros do GIRED se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.

Concedida a palavra, o **Sr. Flávio Lara Resende** afirmou que o seu setor reconhece o que foi feito pela Anatel e pela EAD e que, conforme comentado pelo próprio **Presidente do GIRED**, havia uma expectativa muito inferior ao que aconteceu e que entendia ser importante registrar isso e dizer que o setor agradece ao trabalho muito bem feito.

O **Presidente do GIRED** manifestou sua concordância com o **Sr. Flávio Lara Resende** e afirmou que o trabalho da Anatel contou com aproximadamente 7.000 canais liberados e que, em nenhum lugar do mundo, teria sido viabilizado tanto canal quanto aqui no Brasil.

O **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** solicitou a palavra para complementar sua manifestação e informou que, por conta do município de Poconé que entrou na esteira de instalação agora, terá então a distribuição de kits somente no próximo mês. Seguiu afirmando que um evento reportado pela EAD é que dois municípios do Rio Grande do Sul foram afetados pelas recentes tragédias climáticas, de modo que pode ser que a atividade de distribuição que está programada para este mês nesses dois municípios, Roca Sales e Muçum, seja afetada. Diante disso, asseverou que a EAD deverá verificar se tem condições ou não de concluir este mês, pois pode ser que tenha que reprogramar essa distribuição de kits para o próximo mês, de modo que está sob a avaliação da entidade essa questão que foi trazida na reunião de ontem.

Não havendo mais manifestações, o **Presidente do GIRED** informou que gostaria de destacar o grau de complexidade que foi a gestão deste projeto, com muitos atores envolvidos, muitas atividades críticas que dependiam de atores diferentes, e parabenizou mais uma vez a todos que contribuíram para a efetividade do Projeto Adicional de TV Digital.

O **Presidente do GIRED** parabenizou também os servidores da Anatel e do Ministério das Comunicações que otimizaram seus procedimentos e analisaram um volume enorme de processos em um tempo recorde, mostrando a capacidade institucional de inovação e de engajamento, bem como a capacidade técnica e de comprometimento dos servidores na execução das políticas públicas setoriais. Seguiu parabenizando as Associações e Entidades Representantes dos Radiodifusores que movimentaram seus associados a contribuírem significativamente no projeto. Parabenizou também os gestores e colaboradores da EAD, que foram eficientes na gestão de toda esteira operacional que viabilizou a instalação de infraestrutura de torre em 1.563 municípios, o licenciamento e a ativação de 6.281 canais, cobrindo com o sinal de televisão digital municípios que até 2021 ainda estavam excluídos desse processo de modernização do setor de radiodifusão, pavimentando, assim, o caminho para novas ondas de modernização.

O **Presidente do GIRED**, assim, considerando o prazo para conclusão do Projeto Adicional de TV Digital no dia 30 de setembro, determinou que a EAD decida, até sexta-feira dia 15 de setembro, se prosseguirá ou não com a instalação dos cinco municípios com pendências neste momento, e comunique a **Secretaria do GIRED** a decisão tomada.

O **Presidente do GIRED** consignou também que, considerando que o município de Poconé/MT tem a distribuição de kits programada para o mês de outubro, e considerando o impacto da tragédia que acometeu o estado do Rio Grande do Sul, que pode impactar a distribuição de kits nos municípios de Muçum e Roca Sales, determinou que a EAD avaliasse a necessidade de readequar a programação destes municípios até 15 de setembro e conclua a atividade de distribuição de kits no mês de outubro de 2023.

Finalmente, o **Presidente do GIRED**, reforçou a determinação de que sejam concluídas todas as atividades operacionais de recolhimento de equipamentos instalados para os canais que foram posteriormente desqualificados e a adequação documental das Prefeituras até dia 30 de setembro.

Ato contínuo, o **Presidente do GIRED** passou para o item 5 da Pauta.

6. ITEM 5 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.

O **Presidente do GIRED** questionou aos membros do GIRED presentes se possuíam algum assunto que quisessem tratar na presente Reunião.

O **Presidente do GIRED** agradeceu a todos os membros do GIRED e manifestou que foi muito emocionante vê-los de forma presencial.

O **Sr. Marcio Novaes**, o **Sr. Antônio Oscar Petersen**, o **Sr. Flávio Lara Resende**, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto**, a **Sra. Daniela Naufel Schettino**, o **Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães** e demais presentes manifestaram os seus sinceros agradecimentos pela condução brilhante e de excelência do Grupo realizada pelo **Conselheiro Moisés Queiroz Moreira** enquanto **Presidente do GIRED** e ressaltaram que ele fará muita falta no GIRED.

O **Presidente do GIRED** agradeceu a todos pelas palavras e frisou que o sucesso do GIRED se deu graças às equipes maravilhosas que fizeram parte deste projeto.

Não havendo mais manifestações e considerando que neste item não há deliberações, o **Presidente do GIRED** passou para o item 6 da Pauta.

7. ITEM 6 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2023.

O **Presidente do GIRED** propôs que a próxima Reunião Ordinária do GIRED seja realizada no dia 17 de outubro de 2023 (terça-feira) às 10:00h, de forma remota, e questionou aos membros do GIRED se estariam todos de acordo com essa data.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** definiu a data da 92ª Reunião Ordinária do GIRED para o dia 17 de outubro de 2023 (terça-feira) às 10:00h, de forma presencial.

Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o **Presidente do GIRED** agradeceu a presença de todos os membros e declarou encerrada a 91ª Reunião Ordinária do Grupo.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Naufel Schettino, Usuário Externo**, em 17/10/2023, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Samir Amando Granja Nobre Maia, Usuário Externo**, em 17/10/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 17/10/2023, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira de Lara Resende, Usuário Externo**, em 18/10/2023, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Vinicius Brunetti, Usuário Externo**, em 18/10/2023, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **João Camilo Júnior, Usuário Externo**, em 18/10/2023, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Oliveira Caram Guimarães, Secretário do Grupo**, em 19/10/2023, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Moisés Queiroz Moreira, Conselheiro**, em 31/10/2023, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **MARIO GIRASOLE, Usuário Externo**, em 29/11/2023, às 20:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10862195** e o código CRC **7DA03092**.
