



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED

Data: 22 junho de 2026 (segunda-feira)

Horário: 08h57 às 10h38

Local: Plataforma Teams.

LISTA DE PRESENÇA MEMBROS DO GIRED:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	PRESENTE NA REUNIÃO?
Presidente do GIRED - Anatel	---	Octávio Penna Pieranti	SIM
Secretário Executivo do GIRED - Anatel	---	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Ministério das Comunicações	Titular	Titular da Secretário de Comunicação Social Eletrônica	SIM
	Suplente	Titular Secretário de Telecomunicações	NÃO
Representante dos Radiodifusores	Titular	Daniel Torres Abravanel	NÃO
	Suplente	Bráulio Costa Ribeiro	NÃO
	Titular	Flávio Lara Resende	NÃO
	Suplente	Luiz Carlos Abrahão	SIM
	Titular	Raymundo Costa Pinto Barros	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO

Proponentes Vencedoras	Titular	Wender Almeida de Souza	NÃO
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	SIM
	Titular - Telefônica	José Gonçalves Neto	NÃO
	Suplente - Telefônica	Anderson Emanuel Azeredo de Gonçalves	NÃO
	Titular - Claro	Antônio Oscar de Carvalho Petersen Filho	NÃO
	Suplente - Claro	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular - Algar Telecom	Hugo Vidica Mortoza	NÃO
	Suplente - Algar Telecom	Erica Rocha de Paula Lima	NÃO
	Titular - Tim	Mario Girasole	NÃO
	Suplente - Tim	Marcelo Concolato Mejias	NÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

Nome	Entidade
Alex Pires de Azevedo	Anatel
Chirlene Silva Sampaio de Oliveira	Anatel
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Cristian Charles Marlow	Anatel
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Kim Moraes Mota	Anatel
Luis Renato Giffoni Rodriguês	Anatel
Marcos Estevo de Oliveira Correa	Anatel
Marcos Baeta	Anatel
Túlio Miranda Barros	Anatel
Antonio Celso Guimaraes Teixeira	Anatel
Ana Eliza	GLOBO
Francisco Cperes	GLOBO
Sebastião Sérgio de Oliveira Junior	Tim

Daniela Naufel Schettino	MCOM
Thyago de Oliveira Braun Guimaraes	MCOM
Carlos Saldanha	Sejadigital
Paulo Vaggione	Sejadigital
Fernando Cesar Araujo	Sejadigital
Renato de Campos Ribeiro	Sejadigital
Gunnar Bedicks	Sejadigital
Melissa Carvalho Coelho	Claro
Gabriela Telles de Vasconcellos Klarmann Porto	Algar
Marcus Vinicius Brunetti	Telefônica

ASSUNTOS:**1. SAUDAÇÃO INICIAL**

O **Presidente do GIRED, Sr. Octávio Penna Pieranti**, cumprimentou a todos e declarou aberta a 105ª Reunião Ordinária do GIRED, passando, na sequência, para o item 1 da Pauta.

2. ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026.

O **Presidente do GIRED** informou que não foram recebidas solicitações ou manifestações sobre a minuta da Ata previamente circulada e, desta forma, questionou aos membros do GIRED se existiria algum ajuste em relação à versão encaminhada do documento.


Diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a Ata da 27ª Reunião Extraordinária do GIRED, realizada no dia 03 de junho de 2026.

Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou para o item 2 da Pauta.

3. ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD).


O **Presidente do GIRED** concedeu a palavra ao **Sr. Renato** para que fizesse uma apresentação quantos aos informes da EAD, em virtude de imprevisto do **Sr. Antônio Carlos Martelletto**, impossibilitando a sua participação na presente Reunião Ordinária.

O **Sr. Renato** cumprimentou, inicialmente, os membros presentes, e, na sequência, passou a reportar os informes referentes às atividades da EAD, destacando, em primeiro passo, os projetos do **GT-SMP**, relatando o *status* do Leilão 02, com a exibição do slide abaixo:

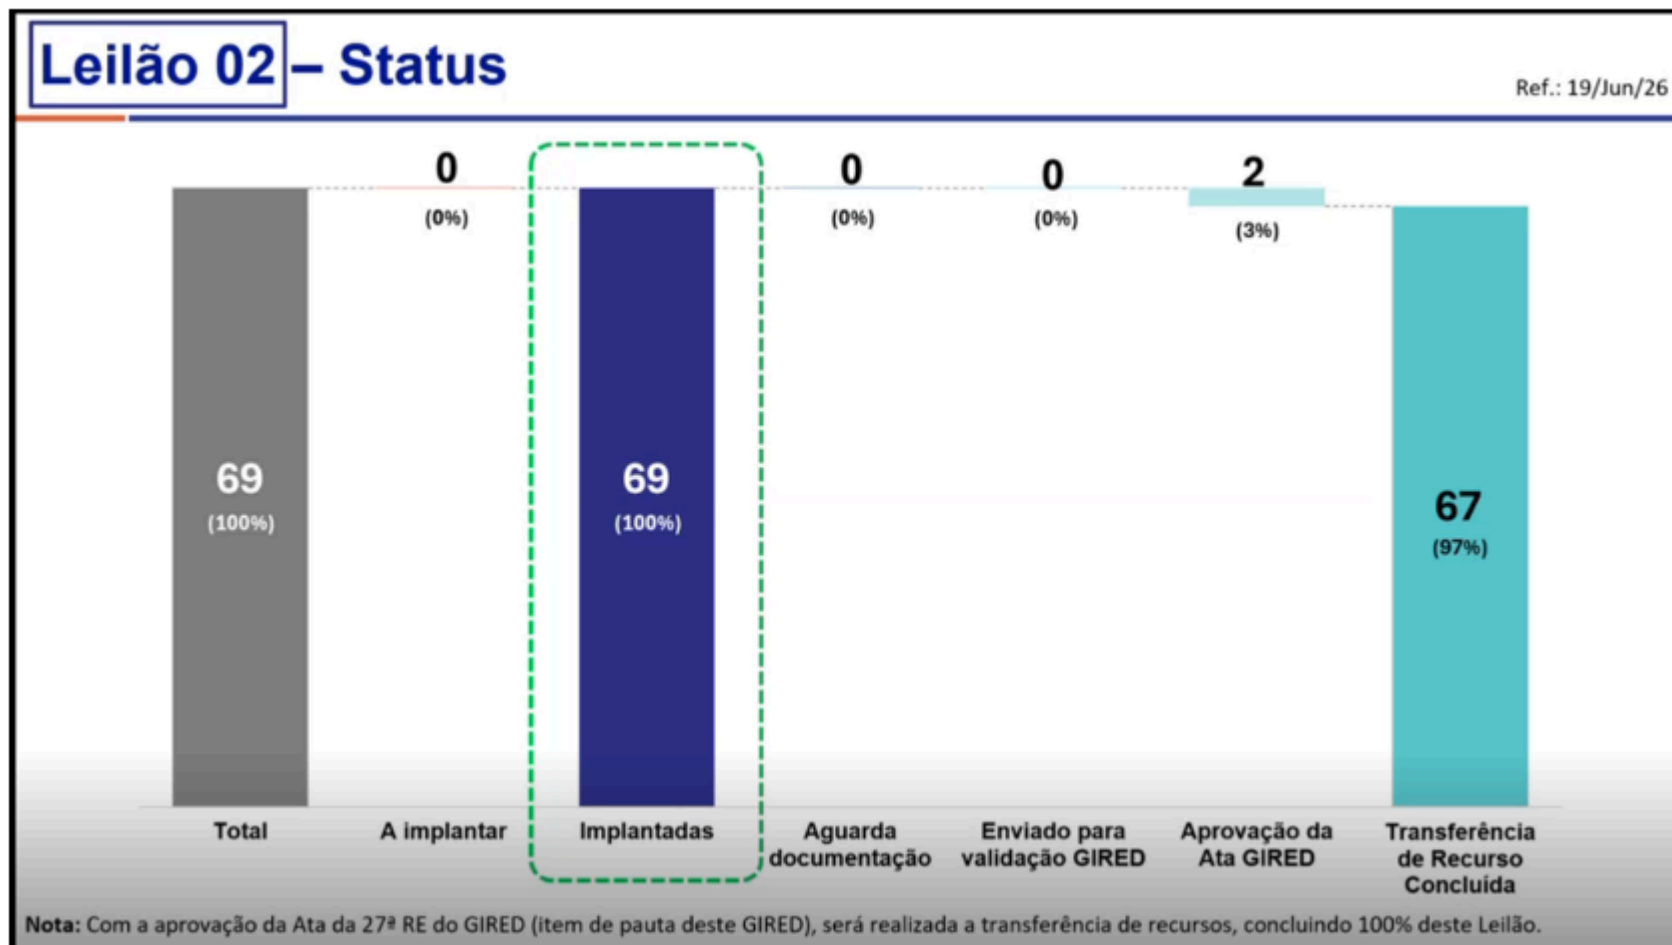


Explicou que as 69 localidades do Leilão 02 e serão feitas as transferências dos recursos das 2 últimas localidades, completando, assim, o referido Leilão em sua totalidade.

Ato contínuo, quanto ao Leilão 03, o **Sr. Renato** exibiu o *status* do Anexo II e Anexos III, IV e V na forma dos slides a seguir:

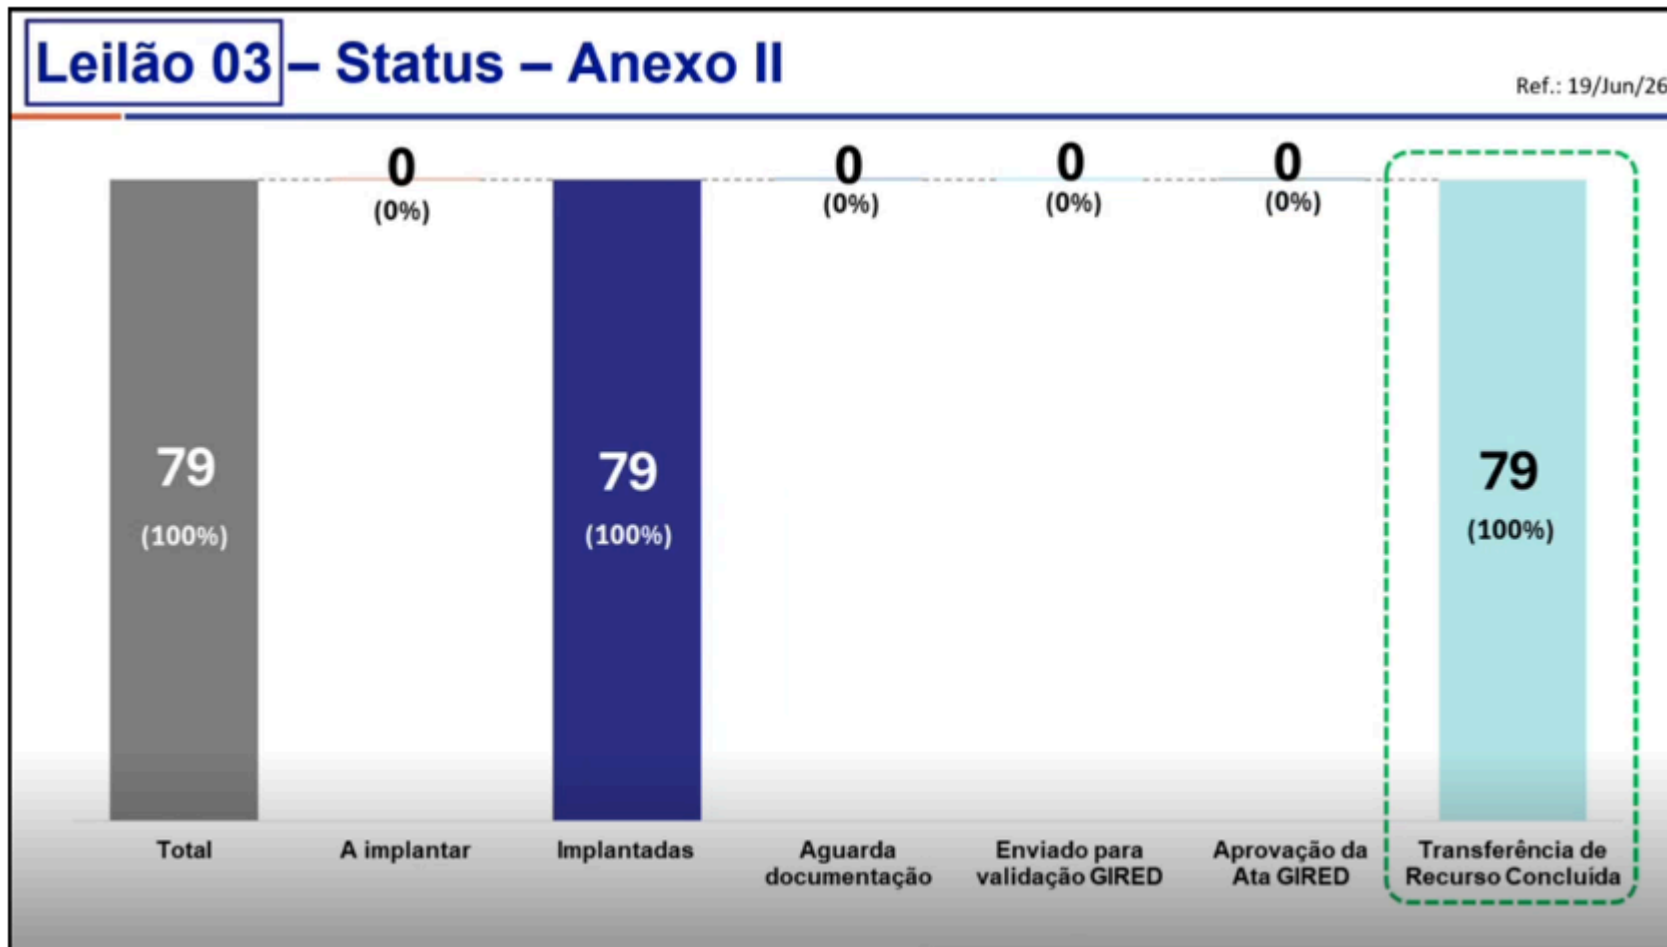


Na sequência, compartilhou com o Grupo as informações acerca do *status* do Leilão 03 – Anexo II e Anexos III, IV e V:

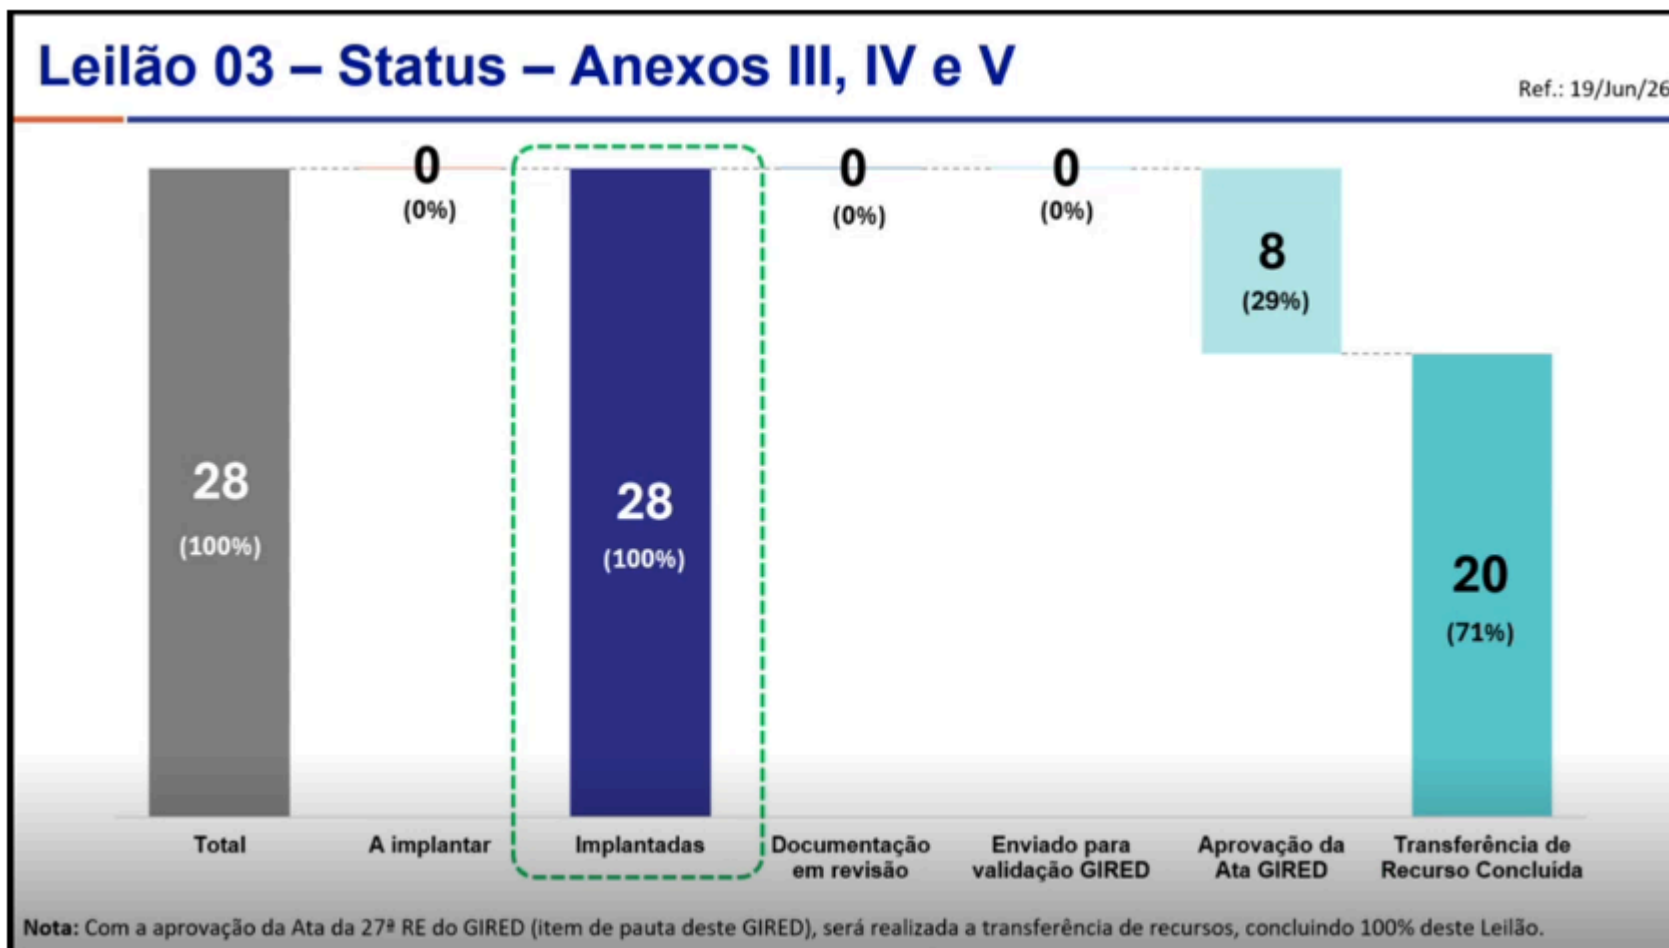

Passou então a exibir um quadro com as informações consolidadas dos três leilões realizados. Destacou que todas as etapas, desde a seleção, a assinatura dos termos, os atestos pelo GIREd e as últimas transferências dos recursos que serão realizadas nesta semana, foram concluídas, totalizando 235 localidades contempladas.

A seguir, o **Sr. Renato de Campos Ribeiro** apresentou as informações gerais acerca da realização do Leilão 04. Informou que estão na fase de realização da seleção que iniciou no dia 22 de maio e termina no dia 25 de junho. Para tanto exibiu o slide abaixo reproduzido que detalha as fases da etapa de realização da seleção:

Leilão 04 – Fluxo da Realização da Seleção

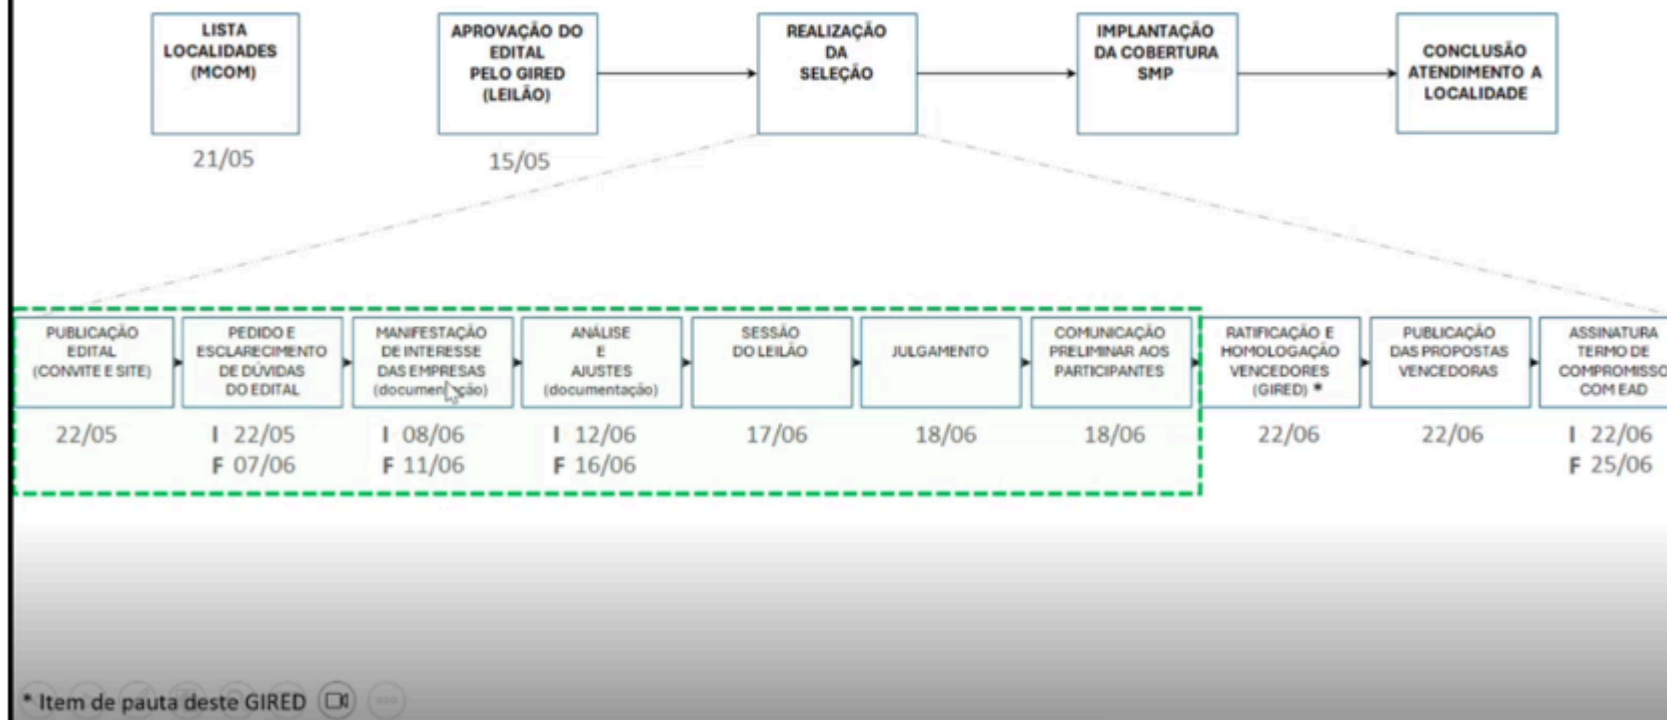

Passou a relatar aos membros do GIRED as etapas que ainda não haviam sido reportadas no Grupo. Informou que sete empresas manifestaram o interesse na participação do Leilão 04 e todas elas carregaram a documentação que foi verificada pela EAD. A sessão do Leilão 04 ocorreu no último dia 17 de junho, das 9h às 13h, na sala de situação do Ministério das Comunicações, em Brasília-DF.

Sobre a apuração do Leilão 04, o **Sr. Renato de Campos Ribeiro** exibiu o slide abaixo reproduzido que resume o resultado obtido:

Leilão 04 – Resultado após apuração



Leilão 04 - 17/06/2026



Empresas	Que apresentaram lances	7
Propostas	Recebidas	113
Localidades	Localidades contempladas	112
	Localidades não contempladas	2
	Com maior concorrência	0
Prazo	Localidade com menor prazo de implantação	80 Dias
Deságio propostas	Total apresentado	3,0%
	Maior apresentado em uma localidade	13,0%
	Valor em R\$ do deságio total	R\$ 539.343,37
	Valor em R\$ a ser transferido pela EAD	R\$ 19.934.782,87

Nota: As informações deste painel são preliminares e estão sujeitas a alterações até que sejam validadas pela EAD e ratificadas pelo GIREL para a devida divulgação oficial, nos termos do item 10.2 do Edital 004/2026.

EAD criada conforme determinação da ANATEL

O **Sr. Renato de Campos Ribeiro** destacou que, como o total das 113 propostas ultrapassou orçamento de 20 milhões desse Leilão, foi necessária a aplicação do item 9.7 do Edital (critério do maior deságio e menor IDH). Assim, com esse critério, a localidade de Vila de Volta Grande/SC não foi contemplada uma vez que não houve deságio e tinha o maior IDH.

Ainda sobre o resultado do Leilão 04, o **Sr. Renato de Campos Ribeiro** informou que uma localidade não recebeu lance e o saldo remanescente ficou em R\$ 65.217,13. O slide abaixo trouxe os destaques sobre o Leilão 04:

Leilão 04 – Aplicação do Item 9.7 do Edital

REGRA DE PRIORIZAÇÃO — ITEM 9.7

GATILHO DE APLICAÇÃO

Saldo insuficiente para contemplar todas as Localidades do Anexo II com lances válidos.

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO COMPOSTA

Maior deságio + Menor IDH → Soma das posições nos respectivos rankings.

CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA

Menor pontuação total tem preferência na classificação final.

LIMITE DE APLICAÇÃO — ITEM 9.7.2

Os critérios são aplicados somente enquanto houver saldo suficiente para contemplar integralmente a próxima Localidade.

LOCALIDADE NÃO CONTEMPLADA

Vila de Volta Grande / SC

Priorização pelo critério composto (maior deságio + menor IDH).

LOCALIDADE SEM LANCE VÁLIDO

Outro Verde / PR

Nenhuma proposta válida registrada para esta Localidade.

SALDO REMANESCENTE

R\$ 65.217,13

Insuficiente para contemplar integralmente a próxima Localidade.

EAD criada conforme determinação da ANATEL

O **Sr. Renato de Campos Ribeiro** reportou que, na última reunião do GT-SMP, realizada na sexta-feira passada, ultrapassada a sessão do leilão, foi identificada a situação de que uma das localidades contempladas já se encontrava em processo de licenciamento. Em razão dessa circunstância e em atenção à política pública, o GT-SMP propôs a substituição da referida localidade.

Em conformidade com os requisitos estabelecidos nos itens 9.8 e 9.9 do Edital, o **Sr. Renato de Campos Ribeiro** relatou que a substituição foi realizada pela primeira localidade não contemplada em razão da insuficiência de recursos. Registrou que a proposta foi acordada entre a Anatel e o Ministério das Comunicações e será submetida ao GIREL para homologação como resultado final do leilão.

Por fim, consignou que o resultado final do leilão permanecerá contemplando 112 (cento e doze) localidades, conforme relação constante dos 5 slides abaixo reproduzidos:

Leilão 04 – Resultado

Anexo II (1/5)

#	Anexo II - Localidades de Antecipação	Propostas recebidas	Melhor proposta	Valor (R\$)	Deságio (R\$)	Prazo (dias)	Data/hora do lance
1	Anexo II - 1 - Barra do Choça - BA - Barra Nova	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 10:05:25
2	Anexo II - 2 - Canindé de São Francisco - SE - Capim Grosso	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 10:05:01
3	Anexo II - 3 - Astorga - PR - Santa Zelina	1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	281.323,87	31.258,21	188	17/06/2026 10:18:56
4	Anexo II - 4 - Campos dos Goytacazes - RJ - Três Vendas	1	TIM S.A.	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 10:30:51
5	Anexo II - 5 - Vitória da Conquista - BA - São Sebastião	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	143.760,00	12.531,04	188	17/06/2026 12:46:08
6	Anexo II - 6 - Careiro - AM - Purupuru	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	150.195,69	6.095,35	187	17/06/2026 09:15:52
7	Anexo II - 7 - São Gabriel da Cachoeira - AM - Lauretê	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:28:45
8	Anexo II - 8 - Novo Repartimento - PA - Belo Monte do Pará	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:34:15
10	Anexo II - 10 - Cachoeira - BA - Santiago do Iguaçu	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	143.760,00	12.531,04	188	17/06/2026 12:42:59
11	Anexo II - 11 - Sengés - PR - Ouro Verde	0	sem proposta	-	-	-	-
12	Anexo II - 12 - Itaituba - PA - Creporizão	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:26:14
14	Anexo II - 14 - Vargem Alta - ES - Alto Castelinho	1	IEZI TELECOM LTDA	281.323,87	31.258,21	80	17/06/2026 09:28:24
17	Anexo II - 17 - Macaé - RJ - Trapiche ou Vila Paraíso	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	135.191,75	21.099,29	187	17/06/2026 09:19:12
18	Anexo II - 18 - Palmares do Sul - RS - Granja Getúlio Vargas	1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	281.323,87	31.258,21	188	17/06/2026 10:17:18
19	Anexo II - 19 - Santa Maria do Pará - PA - Tacioteua	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	150.195,69	6.095,35	187	17/06/2026 09:19:53
22	Anexo II - 22 - São Sebastião do Passé - BA - Lamarão do Passé	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	143.760,00	12.531,04	188	17/06/2026 12:43:56
23	Anexo II - 23 - Riachão do Jacuípe - BA - Vila Aparecida	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 10:07:06
24	Anexo II - 24 - Salvaterra - PA - Condeixa	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	150.195,69	6.095,35	187	17/06/2026 09:21:14
25	Anexo II - 25 - Mamborê - PR - Sede-Guarani	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:24:29
26	Anexo II - 26 - Uruará - PA - Alvorada	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:31:38
29	Anexo II - 29 - Penedo - AL - Comunidade Quilombola Tabuleiro dos Negros	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:58:57
30	Anexo II - 30 - Paulo Afonso - BA - Juá	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	143.760,00	12.531,04	188	17/06/2026 12:45:25
31	Anexo II - 31 - Ilhéus - BA - São José	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	143.760,00	12.531,04	188	17/06/2026 12:47:39

Reproduzir (Alt + K)



EAD criada conforme determinação da ANATEL

4.

Leilão 04 – Resultado

Anexo II (2/5)

#	Anexo II - Localidades de Antecipação	Propostas recebidas	Melhor proposta	Valor (R\$)	Deságio (R\$)	Prazo (dias)	Data/hora do lance
32	Anexo II - 32 - Caetité - BA - Maniçu	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:57:26
33	Anexo II - 33 - Dom Pedro - MA - Triângulo	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:57:00
34	Anexo II - 34 - Barreirinha - AM - Terra Preta do Limão	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	150.195,69	6.095,35	187	17/06/2026 09:24:58
35	Anexo II - 35 - Santo Antônio de Pádua - RJ - São Pedro de Alcântara	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	135.191,75	21.099,29	187	17/06/2026 09:25:30
36	Anexo II - 36 - Rio Negrinho - SC - Vila de Volta Grande	1	TIM S.A.	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 10:24:14
37	Anexo II - 37 - Vitória da Conquista - BA - Cabeceira da Jiboia	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	143.760,00	12.531,04	188	17/06/2026 12:46:46
38	Anexo II - 38 - Nanuque - MG - Vila Gabriel Passos	1	TIM S.A.	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 10:21:51
39	Anexo II - 39 - Piçarra - PA - Agrovila do PA Oziel Pereira ou Bamerindus	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	150.195,69	6.095,35	187	17/06/2026 09:26:11
40	Anexo II - 40 - Autazes - AM - Comunidade Urucurituba	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	150.195,69	6.095,35	187	17/06/2026 09:26:52
42	Anexo II - 42 - São João do Soter - MA - Agrovila do PA Pedras	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:55:39
43	Anexo II - 43 - Bacuri - MA - Portugal	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:54:38
44	Anexo II - 44 - Mazagão - AP - Agrovila do PA Maracá	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:30:23
45	Anexo II - 45 - João Lisboa - MA - Centro dos Carlos	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:54:05
46	Anexo II - 46 - São Francisco do Maranhão - MA - Mimoso	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:53:23
48	Anexo II - 48 - Cedral - MA - Parati	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:52:37
50	Anexo II - 50 - Natuba - PB - Piraúá	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:51:46
51	Anexo II - 51 - Governador Luiz Rocha - MA - São João da Mata	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:51:16
52	Anexo II - 52 - Itaúbal - AP - Carmo do Macacoari	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:32:28
53	Anexo II - 53 - Alcântara - MA - Comunidade Quilombola Raimundo Su	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:50:46
54	Anexo II - 54 - Governador Eugênio Barros - MA - Agricolândia	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:49:56
56	Anexo II - 56 - Bom Lugar - MA - Matinha I	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:48:40
57	Anexo II - 57 - Glória - BA - Aldeia Indígena Poço	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:48:04
58	Anexo II - 58 - Poção - PE - Gravatá dos Gomes	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:47:11

EAD criada conforme determinação da ANATEL

Leilão 04 – Resultado

Anexo II (3/5)

#	Anexo II - Localidades de Antecipação	Propostas recebidas	Melhor proposta	Valor (R\$)	Deságio (R\$)	Prazo (dias)	Data/hora do lance
59	Anexo II - 59 - Buri do Tocantins - TO - Vila União	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	135.191,75	21.099,29	187	17/06/2026 09:27:53
60	Anexo II - 60 - Tacaimbó - PE - Riacho Fechado	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:46:24
61	Anexo II - 61 - Bodocó - PE - Cacimba Nova	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:45:59
62	Anexo II - 62 - Cutias - AP - Gurupora	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:26:58
66	Anexo II - 66 - Macapá - AP - Santa Luzia do Pacul	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	135.191,75	21.099,29	187	17/06/2026 09:28:34
67	Anexo II - 67 - Pedra - PE - Horizonte Alegre	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:45:31
68	Anexo II - 68 - São João do Tigre - PB - Cacimbinha	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:44:59
69	Anexo II - 69 - Macapá - AP - Corre Água	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	135.191,75	21.099,29	187	17/06/2026 09:29:07
71	Anexo II - 71 - São Brás - AL - Jirau do Itiduba	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:44:32
72	Anexo II - 72 - Santa Cruz - PB - Casinha do Homem	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:43:47
73	Anexo II - 73 - Santa Maria da Boa Vista - PE - Agrovila do PA Aquarius	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:43:04
74	Anexo II - 74 - Parau - TO - Campo Alegre	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:29:20
75	Anexo II - 75 - Carrasco Bonito - TO - Centro dos Firminos	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	150.195,69	6.095,35	187	17/06/2026 09:21:51
76	Anexo II - 76 - Tartarugalzinho - AP - Agrovila do PA Cedro	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:31:00
77	Anexo II - 77 - Salgueiro - PE - Pau Ferro	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	143.760,00	12.531,04	188	17/06/2026 12:44:50
78	Anexo II - 78 - Boqueirão - PB - Marinho	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:41:52
79	Anexo II - 79 - Barra de Santana - PB - Santana	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:41:23
83	Anexo II - 83 - Picuí - PB - Santa Luzia do Picuí	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:40:47
84	Anexo II - 84 - Mogeiro - PB - Serra do Cabral	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:39:52
85	Anexo II - 85 - Rodelas - BA - Agrovila do PA Ari-8 Araticum	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:39:07
86	Anexo II - 86 - Laranjal do Jari - AP - Água Branca do Cajari	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:25:18
87	Anexo II - 87 - Santana dos Garrotes - PB - Pitombeira de Dentro	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:38:34
90	Anexo II - 90 - Rio Tinto - PB - Pacaré	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:38:06

EAD criada conforme determinação da ANATEL

Leilão 04 – Resultado

Anexo II (4/5)

#	Anexo II - Localidades de Antecipação	Propostas recebidas	Melhor proposta	Valor (R\$)	Deságio (R\$)	Prazo (dias)	Data/hora do lance
91	Anexo II - 91 - Rodelas - BA - Agrovila do PA AR-2	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:37:34
93	Anexo II - 93 - Taquaritinga do Norte - PE - Jerimum	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:36:36
94	Anexo II - 94 - Vitória do Jari - AP - Jarilândia	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:27:44
95	Anexo II - 95 - Tupanatinga - PE - Comunidade Quilombola Boqueirão	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:36:09
98	Anexo II - 98 - Junco do Seridó - PB - Bom Jesus	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:34:20
99	Anexo II - 99 - São José do Belmonte - PE - Agrovila do PA Terra Livre	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:33:22
100	Anexo II - 100 - Macapá - AP - Macedônia	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	135.191,75	21.099,29	187	17/06/2026 09:16:32
101	Anexo II - 101 - Venturosa - PE - Tará Velho	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:32:59
102	Anexo II - 102 - Itaubal - AP - Curicaca	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:33:15
103	Anexo II - 103 - Macapá - AP - Itamatatuba	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:21:33
107	Anexo II - 107 - Aragominas - TO - Reunidas	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	150.195,69	6.095,35	187	17/06/2026 09:17:44
108	Anexo II - 108 - Macapá - AP - São Tomé do Pacuí	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:22:32
111	Anexo II - 111 - Buriti Alegre - GO - Corumbazul	1	ALGAR TELECOM S/A	156.191,04	100,00	188	17/06/2026 09:56:23
112	Anexo II - 112 - Macapá - AP - Freguesia	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	135.191,75	21.099,29	187	17/06/2026 09:14:09
113	Anexo II - 113 - Solidão - PE - Pelo-Sinal	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:32:09
114	Anexo II - 114 - Ananás - TO - São João	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	135.191,75	21.099,29	187	17/06/2026 09:11:59
115	Anexo II - 115 - Triunfo - PB - Pilões	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:31:43
117	Anexo II - 117 - Macapá - AP - Limão do Curuá	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:23:44
118	Anexo II - 118 - Macapá - AP - Buritizal	1	CLARO S.A.	151.602,31	4.688,73	188	17/06/2026 09:18:17
119	Anexo II - 119 - Aragominas - TO - Agrovila do PA Quilombola Baviera	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	150.195,69	6.095,35	187	17/06/2026 09:13:22
120	Anexo II - 120 - São José do Piranhas - PB - Bom Jesus	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:31:11
121	Anexo II - 121 - Lajeado Novo - MA - Passagem Boa	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:30:31
122	Anexo II - 122 - Bom Lugar - MA - São Paulo Apóstolo	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:30:05

EAD criada conforme determinação da ANATEL

5.

Leilão 04 – Resultado

Anexo II (5/5)

#	Anexo II - Localidades de Antecipação	Propostas recebidas	Melhor proposta	Valor (R\$)	Deságio (R\$)	Prazo (dias)	Data/hora do lance
123	Anexo II - 123 - Joselândia - MA - Solta	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:29:15
124	Anexo II - 124 - Cidelândia - MA - São João do Andriobal	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:28:45
125	Anexo II - 125 - Joselândia - MA - Nova Vida	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:28:12
126	Anexo II - 126 - Bequimão - MA - Comunidade Quilombola Paricatua	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	312.582,04	0,04	188	17/06/2026 09:27:36
127	Anexo II - 127 - Macururê - BA - Salgado de Melão	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:26:41
128	Anexo II - 128 - Curaçá - BA - Poço de Fora	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	156.291,02	0,02	188	17/06/2026 09:24:42
129	Anexo II - 129 - Calmon - SC - Agorvila Do Pa Putinga	1	TIM S A	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 10:17:17
130	Anexo II - 130 - Rebouças - PR - Rodeio	1	TIM S A	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 10:33:20
131	Anexo II - 131 - Prudentópolis - PR - Barra Vermelha	1	(*)	-	-	-	-
132	Anexo II - 132 - Quitandinha - PR - Água Clara De Baixo	1	TIM S A	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 11:21:42
133	Anexo II - 133 - Rio Negro - PR - Fazendinha	1	TIM S A	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 10:08:59
134	Anexo II - 134 - Quedas Do Iguaçu - PR - Linha Mirim	1	TIM S A	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 10:05:14
135	Anexo II - 135 - Quedas Do Iguaçu - PR - Linha Novo Rumo	1	TIM S A	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 10:01:08
136	Anexo II - 136 - Rebouças - PR - Barra dos Andradas	1	TIM S A	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 09:58:24
137	Anexo II - 137 - Três Barras Do Paraná - PR - Santo Izidoro	1	TIM S A	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 09:39:50
138	Anexo II - 138 - Catanduvas - PR - Santa Cruz	1	TIM S A	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 09:34:04
139	Anexo II - 139 - Cândido De Abreu - PR - Rio Do Tigre	1	TIM S A	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 09:31:28
140	Anexo II - 140 - Missal - PR - Praia Arroio Natal	1	TIM S A	156.291,04	0,00	188	17/06/2026 09:26:51
141	Anexo II - 141 - Itacotiara - AM - Amatari	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	135.191,75	21.099,29	187	17/06/2026 09:15:07
142	Anexo II - 142 - Manaquiri - AM - Janauacá	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	150.195,69	6.095,35	187	17/06/2026 09:18:30
143	Anexo II - 143 - Marapanim - PA - Cruzador	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	150.195,69	6.095,35	187	17/06/2026 09:22:43
144	Anexo II - 144 - Guará - TO - Agrovila do PA Pedra Branca	1	TELEFONICA BRASIL S.A.	135.191,75	21.099,29	187	17/06/2026 09:23:40

Total Localidades com propostas: 113
Total Localidades com propostas contempladas: 112

Total R\$ Localidades contempladas: 19.934.782,87
Total R\$ Deságio Localidades contempladas: 539.345,37
Saldo R\$: 65.217,13

Nota:

(*) localidade substituída (GT-SMP)

EAD criada conforme determinação da ANATEL

Prosseguindo sobre as próximas etapas do Leilão 04, o **Sr. Renato de Campos Ribeiro** informou que, encerrada a sessão Leilão, teve início o procedimento previsto no Edital referente à comunicação preliminar dos resultados aos participantes. Esclareceu que, em 18 de junho, um dia após a realização da sessão, foi encaminhada comunicação às participantes com a divulgação dos resultados, ressaltando-se que a confirmação do resultado final está condicionada à homologação e ratificação pelo GIREL, que estão previstas para a presente reunião, após o que será realizada a publicação das propostas vencedoras. Ato contínuo, será aberto o prazo para assinatura dos Termos de Compromisso, com término previsto para 25 de junho.

O **Sr. Renato de Campos Ribeiro** registrou, ainda, que, após a assinatura dos Termos de Compromisso, terão início as etapas de implantação da cobertura, seguidas da verificação da documentação recebida pelo GIREL e, posteriormente, da transferência dos recursos.

Por fim, encerrado o informe do GT-SMP, o **Sr. Renato de Campos Ribeiro** passou a palavra ao **Sr. Gunnar Bedicks** para apresentação do *status* dos projetos conduzidos pelo GT-TV.

Atividades Concluídas

Atividade		2024					2025												2026											
		A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.2 Contratação do Agente Digital NMS	P R						J	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> <td>J</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.1 Mobilização das Prefeituras	P R						J	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> <td>J</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.3 Vistoria Técnica	P R						J	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> <td>J</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.4 Proposta para Readequações das Estações	P R						J	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> <td>J</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.7 Contratação e Implantação do NOC	P R						J	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> <td>J</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.8 Conexão das ERTMs Piloto ao NOC	P R						J	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> <td>J</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.12 Contratação das Assistências Técnicas	P R						J	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> <td>J</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.10 Disponibilização do Agente Digital NMS para as Entidades	P R						J	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> <td>J</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.15 Transição das Operações	P R						J	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> <td>J</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Atividades Concluídas


Atividade			2024					2025												2026											
			A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.5	Readequação das ERTMs Aprovadas no Gired	P R																													
3.1	Conexão das ERTMs ao NOC	P R																													

Atividades em Andamento


Atividade			2024					2025												2026												
			A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3.6	Implantação do sistema de monitoramento de sinais dos canais transmitidos (TBD)	P											m	j	j	a	s	o														
		R																														
3.11	Operação do NOC	P											m	j	j	a	s	o	n	d		j	f	m	a	m	j	j	a	s		
		R											!	!	j	a	s	o	n	d		j	f	m	a	m	j					
3.13	Serviços de Manutenção Preventiva	P											m	j	j	a	s	o	n	d		j	f	m	a	m	j	j	a	s		
		R											!	!	j	a	s	o	n	d		j	f	m	a	m	j					
3.14	Serviços de Manutenção Corretiva	P											m	j	j	a	s	o	n	d		j	f	m	a	m	j	j	a	s		
		R											!	!	j	a	s	o	n	d		j	f	m	a	m	j					
3.14	Conclusão do Projeto	P																													s	
		R																														

Em seguida, detalhou as informações sobre as estações, na forma dos *slides* abaixo reproduzidos:

Projeto de Manutenção PDB - 1.563 ERTMs - Status

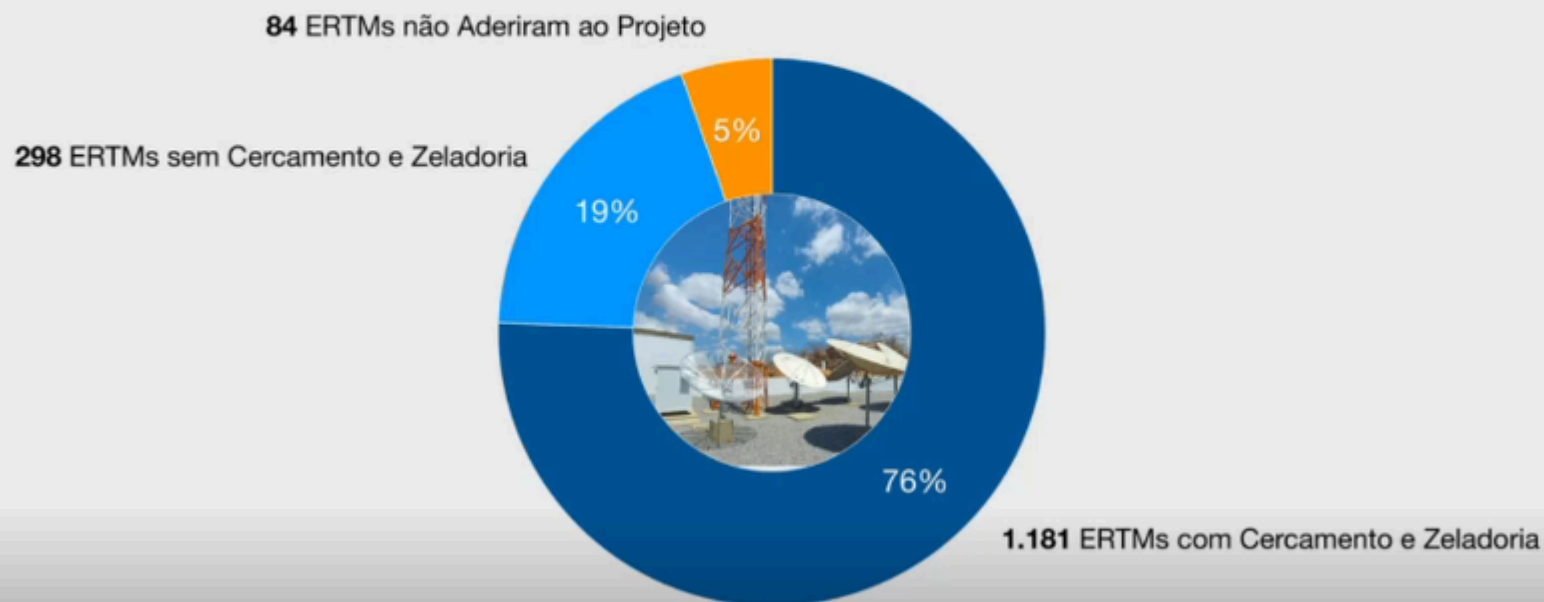

ERTMs Conectadas - Evolução das Conexões ao NOC e Recuperações

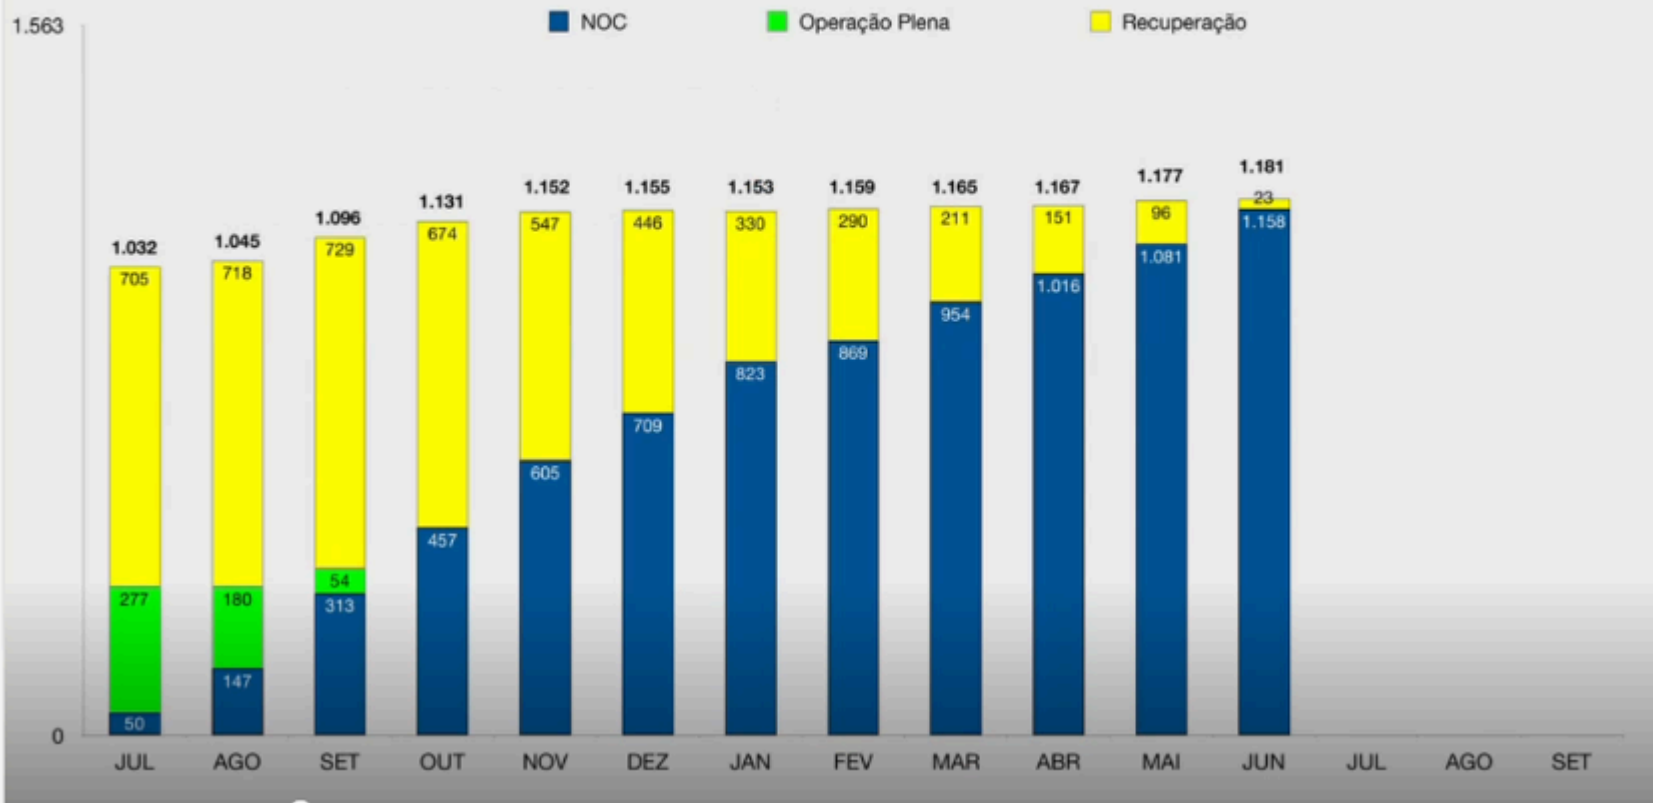

Em seguida, o Sr. Gunnar Bedicks passou à leitura dos 2 slides abaixo reproduzidos que demonstram o cumprimento da determinação constante do item 10 da Pauta da 97ª Reunião Ordinário do GIRED e da Meta 4 do DT1 – Diretrizes para a Gestão do Projeto:

Cumprimento da Determinação Constante do item 10 da Pauta da 97ª RO do GIRED

Em atendimento às diretrizes estabelecidas pelo GIRED para o Projeto de Manutenção de Estações Retransmissoras de TV Digital Multicanal (ERTM) e à deliberação do Item 10 da Pauta da 97ª Reunião Ordinária do GIRED, que aprovou a contratação da manutenção corretiva para as estações do Programa Digitaliza Brasil em operação parcial e que possuíam cercamento e zeladoria, a EAD informa que concluiu a execução das atividades correspondentes. Com isso, foram realizadas as intervenções corretivas necessárias à recuperação operacional dessas estações, permitindo sua integração ao NOC e sua incorporação às atividades de monitoramento e operação previstas no projeto, em conformidade com as diretrizes e deliberações aprovadas pelo GIRED.

Registra-se, para ciência e registro do GIRED, o cumprimento da determinação constante do item 10 da pauta da 97ª Reunião Ordinária.

Cumprimento da Meta 4, constante do DT1 - Diretrizes para a Gestão do Projeto

Em atendimento às diretrizes estabelecidas pelo GIRED para o Projeto de Manutenção de Estações Retransmissoras de TV Digital Multicanal (ERTM), previstas nos Documentos Técnicos DT1, DT2 e DT5, a EAD concluiu as atividades de readequação das estações que possuíam cercamento e zeladoria, cumprindo o item 4 das metas do projeto, que prevê a implementação das readequações das ERTMs, quando necessárias e após aprovação do GIRED.

As intervenções realizadas permitiram restabelecer as condições operacionais das estações contempladas, viabilizando sua integração ao ambiente de monitoramento e operação do projeto. Com a conclusão dessas atividades, considera-se integralmente cumprida a Meta 4 do Projeto de Manutenção, conforme estabelecido nos documentos que disciplinam sua gestão, execução e encerramento.

Registra-se, para ciência e acompanhamento do GIRED, o cumprimento da Meta 4 constante do DT1 – Diretrizes para a Gestão do Projeto.

Partindo para o Projeto Programa Brasil Digital (PBD), o **Sr. Gunnar Bedicks** exibiu, para fins de registro, as três listas recebidas do Ministério das Comunicações, totalizando 157 municípios:

Listas Recebidas do MCom - 157 municípios


Lista 1: 100 municípios 12/02/2025

Lista 2: 18 municípios 19/01/2026

Lista 3: 39 municípios 22/04/2026

UF	Município	UF	Município	UF	Município	UF	Município	UF	Município	UF	Município	UF	Município
AL	Arapiraca	BA	Vitória da Conquista	MG	Coronel Fabriciano	RO	Cacoal	AP	Ferreira Gomes	AL	Coruripe	GO	Goias
AL	Palmeira dos Índios	CE	Acarau	MT	Rondonópolis	RO	Guajará-Mirim	AP	Oiapoque	AL	Penedo	MT	Alta Floresta
AL	Porto Calvo	CE	Aracati	MT	Sapezal	RO	Jaru	MA	Araloses	AL	São Miguel dos Campos	MT	Barra do Garças
AM	Amaturá	CE	Camocim	PB	Cuité	RO	Rolim de Moura	MA	Barra do Corda	BA	Brumado	MT	Cáceres
AM	Anamá	CE	Iguatu	PR	Arapongas	RO	Vilhena	MA	Pinheiro	BA	Campo Formoso	PR	Apucarana
AM	Benjamin Constant	CE	Itapajé	PR	Assis Chateaubriand	RR	Bonfim	PB	Cabaceiras	BA	Guanambi	PR	Fazenda Rio Grande (* Curitiba)
AM	Beruri	CE	Itapipoca	PR	Astorga	RR	Caracará	PB	Guarabira	BA	Itaberaba	PR	Iratí
AM	Borba	CE	Quixeramobim	PR	Cascavel	RR	Pacaraima	PB	Itaporanga	BA	Jacobina	PR	Ivaiporã
AM	Carauari	CE	Russas	PR	Francisco Beltrão	RR	Rorainópolis	PB	Monteiro	CE	Baturité	PR	Medianeira
AM	Codajás	CE	Senador Pompeu	PR	Londrina	RR	São Luiz	PB	Pombal	CE	Canindé	PR	Palmas
AM	Paulini	CE	Tabuleiro do Norte	PR	Marechal Cândido Rondon	RS	Camagüã	PB	Sousa	CE	Crato	PR	Rio Negro
AM	Santo Antônio do Içá	CE	Tanguá	PR	Pato Branco	RS	Sapiranga	PE	Santa Cruz do Capibaribe	CE	Granja	PR	União da Vitória
AM	São Paulo de Olivença	CE	Ubajara	PR	Telêmaco Borba	RS	Sapucaia do Sul	PR	Campo Mourão	CE	Limoeiro do Norte	RJ	Santo Antônio de Pádua
AP	Laranjal do Jari	ES	Alegre	PR	Toledo	SC	Itajaí	PR	Paranáguá	CE	Paracuru	RS	Cruz Alta
BA	Alagoinhas	ES	Nova Venécia	PR	Umuarama	SC	Lages	PR	Paraná	CE	Quixadá	RS	Santa Cruz do Sul
BA	Camaçari	ES	São Mateus	RJ	Angra dos Reis	SC	Rio do Sul	RO	Presidente Médici	CE	Reriutaba	SE	Estância
BA	Cruz das Almas	GO	Caldas Novas	RJ	Duque de Caxias	SE	Itabaiana	RR	Caná	CE	Santa Quitéria	SE	Propriá
BA	Ithéus	GO	Catalão	RJ	Macaé	SE	Lagarto	RR	Mucajai	CE	São Benedito	SP	Atibaia
BA	Itabuna	GO	Cidade Ocidental	RJ	Niterói	SE	Nossa Senhora da Glória			CE	Sobral	SP	Catanduva
BA	Jequié	GO	Jatáí	RJ	Nova Friburgo	SP	Amparo			CE	Taubá		
BA	Juazeiro	GO	Mineiros	RJ	Petrópolis	SP	Guaratininguá						
BA	Lençóis	GO	Rio Verde	RJ	Rio das Ostras	SP	Penápolis						
BA	Paulo Afonso	MA	Bacabal	RJ	Seropédica	SP	Peruibe						
BA	Porto Seguro	MA	Caxias	RJ	Volta Redonda	SP	Santa Bárbara D'Oeste						
BA	Teixeira de Freitas	MA	Santa Inês	RO	Ariquemes	SP	Votuporanga						

Reportou, ainda, o status em relação à execução, na forma do *slide* a seguir transcrito:

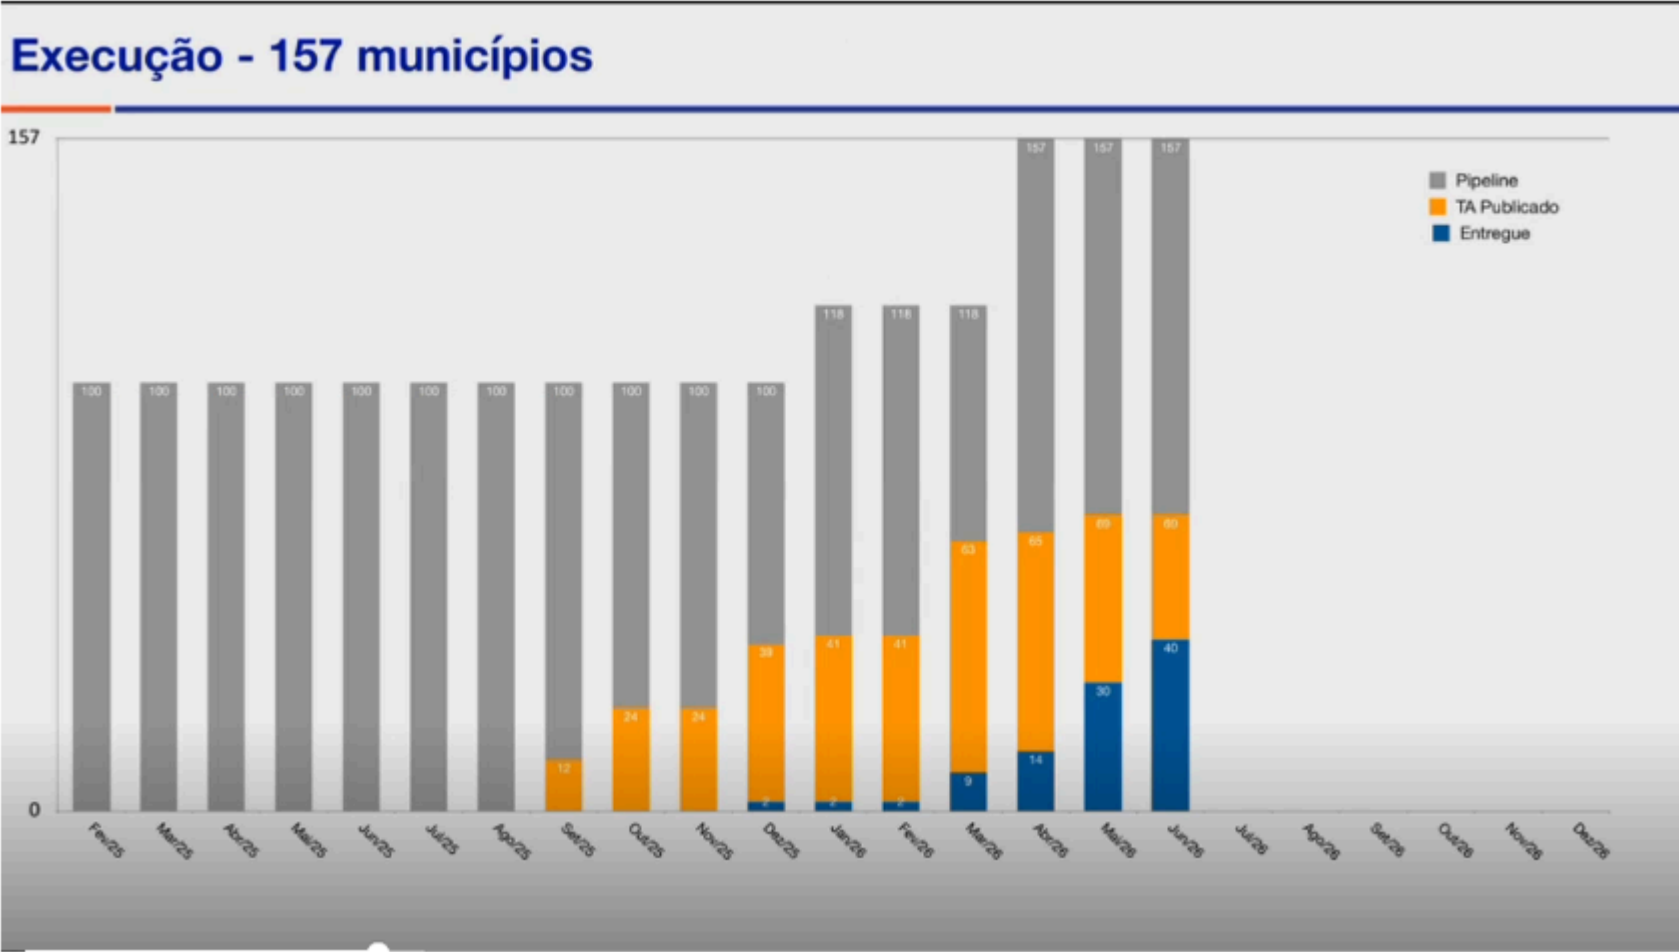

Sobre o slide acima, o **Sr. Gunnar Bedicks** destacou que o pipeline atualmente contempla 157 municípios. No que se refere aos municípios com Termos de Adesão publicados, o quantitativo alcança 69 municípios. Registrou, ainda, que, até a sexta-feira anterior, haviam sido concluídas as entregas em 35 municípios, número que deverá atingir 40 municípios até o final de junho de 2026, ressaltando que a entrega desses 40 municípios ainda no primeiro semestre de 2026 ficará em consonância com a meta previamente estabelecida.

Passando para o Projeto Evolução do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD - T) – DTV +, o **Sr. Gunnar Bedicks** exibiu as suas atividades concluídas e em andamento com relação ao Sistema de Transmissão (STX), *Broadcast Core Network* (BCN) e ao Sistema de Recepção (SRX):

Atividades Concluídas - Sistema de Transmissão

			Sistema de Transmissão - STX																												
Atividade			2024					2025										2026													
			A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.2	Carta Convite aos fabricantes de equipamentos	P					d																								
		R																													
3.1	Alocação do site de transmissão principal SPO	P					d																								
		R																													
3.3	Instalação da infraestrutura necessária	P																													
		R																													
3.4	Instalação dos equipamentos de transmissão protótipos TV 3.0	P																													
		R																													
3.5	Testes transmissão piloto (apenas RF)	P																													
		R																													
3.9	Demonstração SET Expo 2025	P																													
		R																													
3.11	Implantação da Estação Regional Segmentada SPO	P																													
		R																													
3.13	Implantação da Estação Principal BSB	P																													
		R																													
3.6	Testes de Integração Piloto: Transmissão e Distribution Core	P																													
		R																													
3.14	Testes Estação Principal BSB	P																													
		R																													

Atividades Concluídas - Broadcast Core Network

Broadcast Core Network - BCN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Atividade			2024					2025										2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.6	Instanciamento em nuvem dos itens do BCN	P R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Atividades Concluídas - Sistema de Recepção

Sistema de Recepção - SRX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Atividade			2024					2025												2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.2.1	Carta Convite aos fabricantes de equipamentos	P					d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									


Atividades em Andamento - Sistema de Transmissão

Sistema de Transmissão - STX																														
Atividade		2024					2025										2026													
		A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.12	Testes Estação Regional Segmentada SPO	P																												
		R																												
3.15	Processo de compra dos equipamentos de transmissão (públicas)	P																												
		R																												
3.16	Desativação do site de transmissão	P																												
		R																												
3.17	Conclusão do Projeto	P																												
		R																												

Atividades em Andamento - Broadcast Core Network

		Broadcast Core Network - BCN																												
Atividade		2024					2025												2026											
		A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.7	Testes do BCN																													
	P																													
	R																													

Atividades em Andamento - Sistema de Recepção

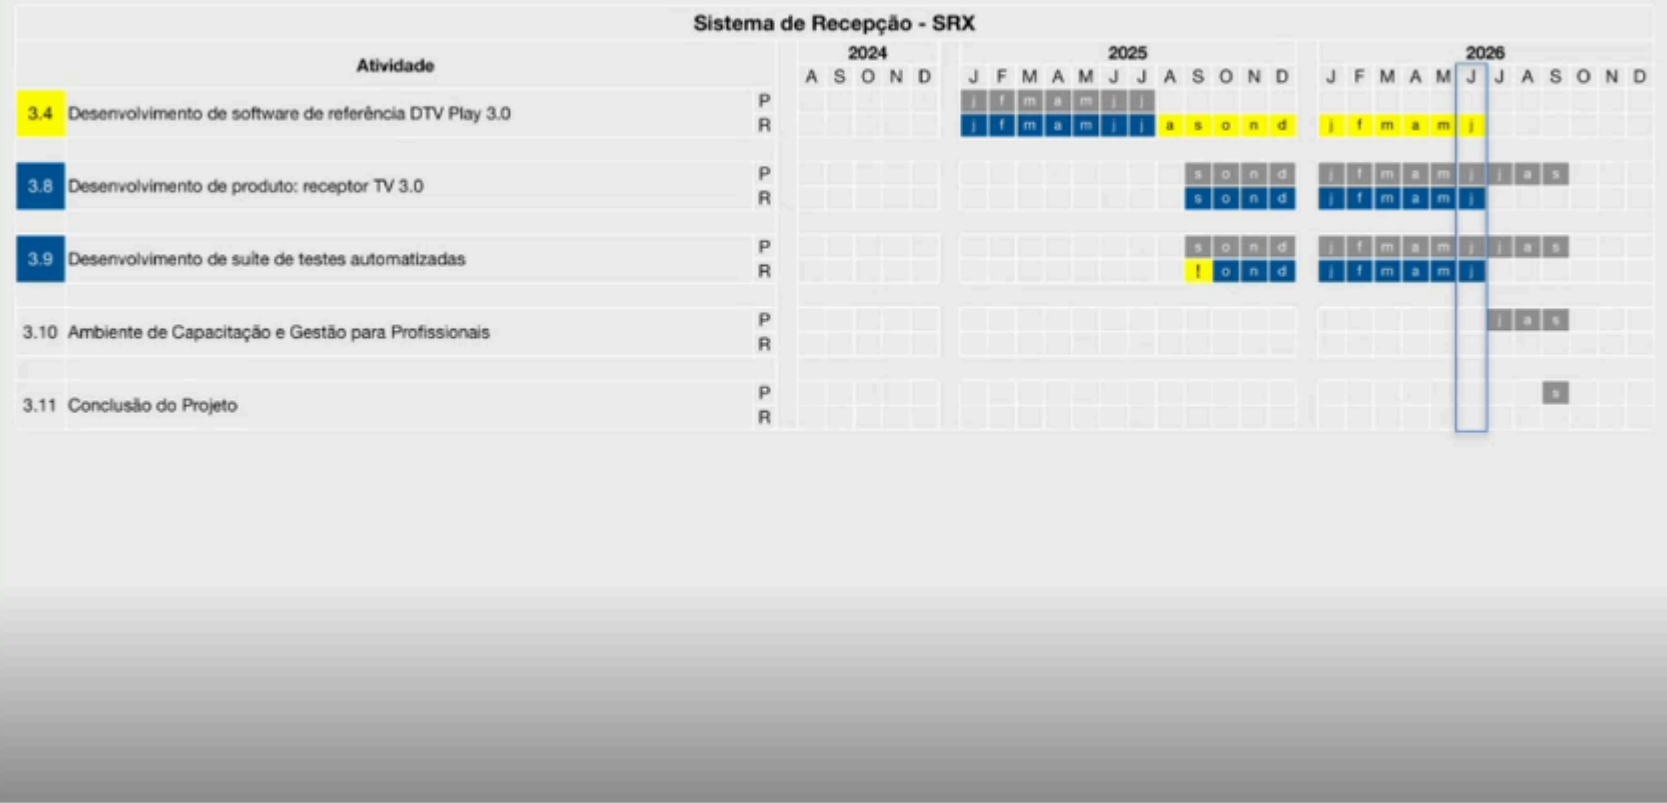

Em seguida, o **Sr. Gunnar Bedicks** informou o atingimento de objetivos relacionados às estações experimentais, as quais foram disponibilizadas para utilização da EBC e da TV Câmara.

Apresentou a demonstração da tela de recepção do sistema DTV+ na cidade de São Paulo, destacando a veiculação do canal TV Alesp, que é o canal da TV Câmara, em conjunto com o parceiro local, bem como a disponibilização dos canais da TV Brasil e a plataforma Mais BR, tudo, atualmente, já em funcionamento e com transmissões ativas.

Ressaltou que a mesma configuração operacional se encontra implementada na cidade de Brasília, onde também foram realizados testes com canais da EBC e com a plataforma Mais BR, conforme se observa na tela de recepção dos serviços naquela localidade.

Ato contínuo, o **Sr. Gunnar Bedicks** passou a detalhar o Canal 177 DTV+ TV Câmara, em São Paulo. Informou que a implantação do *core* do sistema foi concluída e os sinais da TV Câmara, TV Senado, TV Alesp e Câmara Municipal de São Paulo são recebidos e processados pelo *core* instalado nas dependências da Assembleia Legislativa, composto pelos equipamentos DTV+ in a Box, DASH Encoder, House Signaling Server, Broadcast Gateway e

Inseridor de Funções e Aplicações. Após o processamento, explicou que os sinais são encaminhados, por meio de infraestrutura de enlace já existente, para a estação transmissora instalada na torre da Record, no canal 177, onde passam pelos moduladores, transmissores e sistema irradiante, sendo transmitidos em tecnologia DTV+. Frisou que a operação está em funcionamento desde 8 de junho de 2026 e que que, por meio dessa infraestrutura, encontram-se em operação os canais TV Alesp, Câmara Municipal de São Paulo, TV Câmara e TV Senado, todos transmitidos na tecnologia DTV+.

Em relação ao canal 183, o **Sr. Gunnar Bedicks** reportou que o *core* foi instalado em Brasília, permitindo a geração dos sinais da TV Brasil, Canal GOV, Canal Educação e Canal Saúde, os quais são processados da mesma forma e encaminhados, por meio de transmissão via rede, à estação instalada na torre do SBT, em São Paulo. Na referida estação, os sinais passam pelos transmissores e sistema irradiante, de forma análoga ao procedimento adotado para o canal 177.

Esclareceu ainda que, embora as estações transmissoras possuam caráter experimental, o *core* instalado corresponde ao equipamento definitivo adquirido no âmbito do projeto, o qual já foi transferido às emissoras, em conformidade com as deliberações do GIRED.

Assim, repisou que os canais TV Brasil, Canal GOV, Canal Educação e Canal Saúde estão sendo transmitidos, desde 8 de junho de 2026, por meio da plataforma experimental instalada no canal 183, em São Paulo.

Sobre o Canal 253 253 DTV+ da estação experimental de Brasília, o **Sr. Gunnar Bedicks** informou que, após a instalação dos equipamentos, entrou em operação contínua a transmissão dos canais TV Brasil, Canal GOV, TV Câmara e TV Senado, os quais foram devidamente configurados e conectados diretamente aos equipamentos de transmissão.

Esclareceu, ainda, que os equipamentos de transmissão integram o conjunto de ações previstas no projeto e foram disponibilizados no âmbito dos Acordos de Cooperação Técnica celebrados entre as instituições participantes. Assim, registrou que, no canal 253, em Brasília, encontram-se em operação contínua os canais TV Brasil, Canal GOV, TV Câmara e TV Senado.

Na sequência, o Sr. Gunnar Bedicks fez a leitura dos slides abaixo reproduzidos para registrar aos membros do GIRED o cumprimento da determinações constantes da 102ª Reunião Ordinária e da 25ª Reunião Extraordinária:

Cumprimento da Determinação Constante do item 13 da Pauta da 102ª RO do GIRED

Em cumprimento à deliberação do GIRED, que aprovou o uso das estações-teste de São Paulo/SP e Brasília/DF para a transmissão contínua das programações da Câmara dos Deputados e da EBC, a EAD informa que adotou as providências necessárias para disponibilização dos respectivos Sistemas de Transmissão às referidas entidades, preservada a continuidade dos testes técnicos de TV 3.0 coordenados pela EAD.

Registra-se, para ciência e registro do GIRED, o cumprimento da determinação constante do item 13 da pauta da 102ª Reunião Ordinária, com a informação de que, desde 08/06/2026, encontra-se em operação a transmissão contínua das programações da Câmara dos Deputados e da Empresa Brasil de Comunicação – EBC nas estações indicadas.

Cumprimento da Determinação Constante do item 7 da Pauta da 25ª RE do GIRED


Em cumprimento à deliberação do GIRED, que aprovou a aquisição dos “Cores DTV+” destinados às estações da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da EBC, incluindo as faixas de multiprogramação da Rede Legislativa e da Rede Nacional de Comunicação Pública, a EAD informa que adotou as providências necessárias para aquisição, instalação e ativação dos equipamentos, assim como o treinamento necessário para suas operações.

Registra-se, para ciência e registro do GIRED, o cumprimento da determinação constante do item 7 da pauta da 25ª Reunião Extraordinária, com a informação de que as atividades correspondentes foram concluídas até 08/06/2026, em alinhamento ao planejamento técnico das estações experimentais de TV 3.0.

O **Sr. Gunnar Bedicks** registrou ainda que as autorizações temporárias de uso das estações experimentais (UTES) em relação aos canais 177 e 183 de São Paulo permanecerão vigentes até 31 de julho de 2026 e que a autorização referente à estação experimental do canal 253, em Brasília, possui vigência até 31 de dezembro de 2026.

O representante do Ministério das Comunicações, **Sr. Wilson Diniz Wellisch**, pediu a palavra para informar que já estão em andamento tratativas internas com vistas à ampliação do prazo de vigência da autorização que expira em 31 de julho de 2026. Estão avaliando a adoção da medida mais adequada, seja por meio da emissão de nova autorização experimental, seja mediante a prorrogação da autorização atualmente vigente.

Retomada a palavra, o **Sr. Gunnar Bedicks** passou a detalhar, pela primeira vez, o andamento das atividades relacionadas ao último projeto cuja execução foi atribuída à EAD, referente à destinação dos ativos das estações experimentais. Destacou a importância do registro, tendo em vista que algumas das metas previstas no projeto já foram concluídas. Para tanto, expôs o slide abaixo reproduzido:

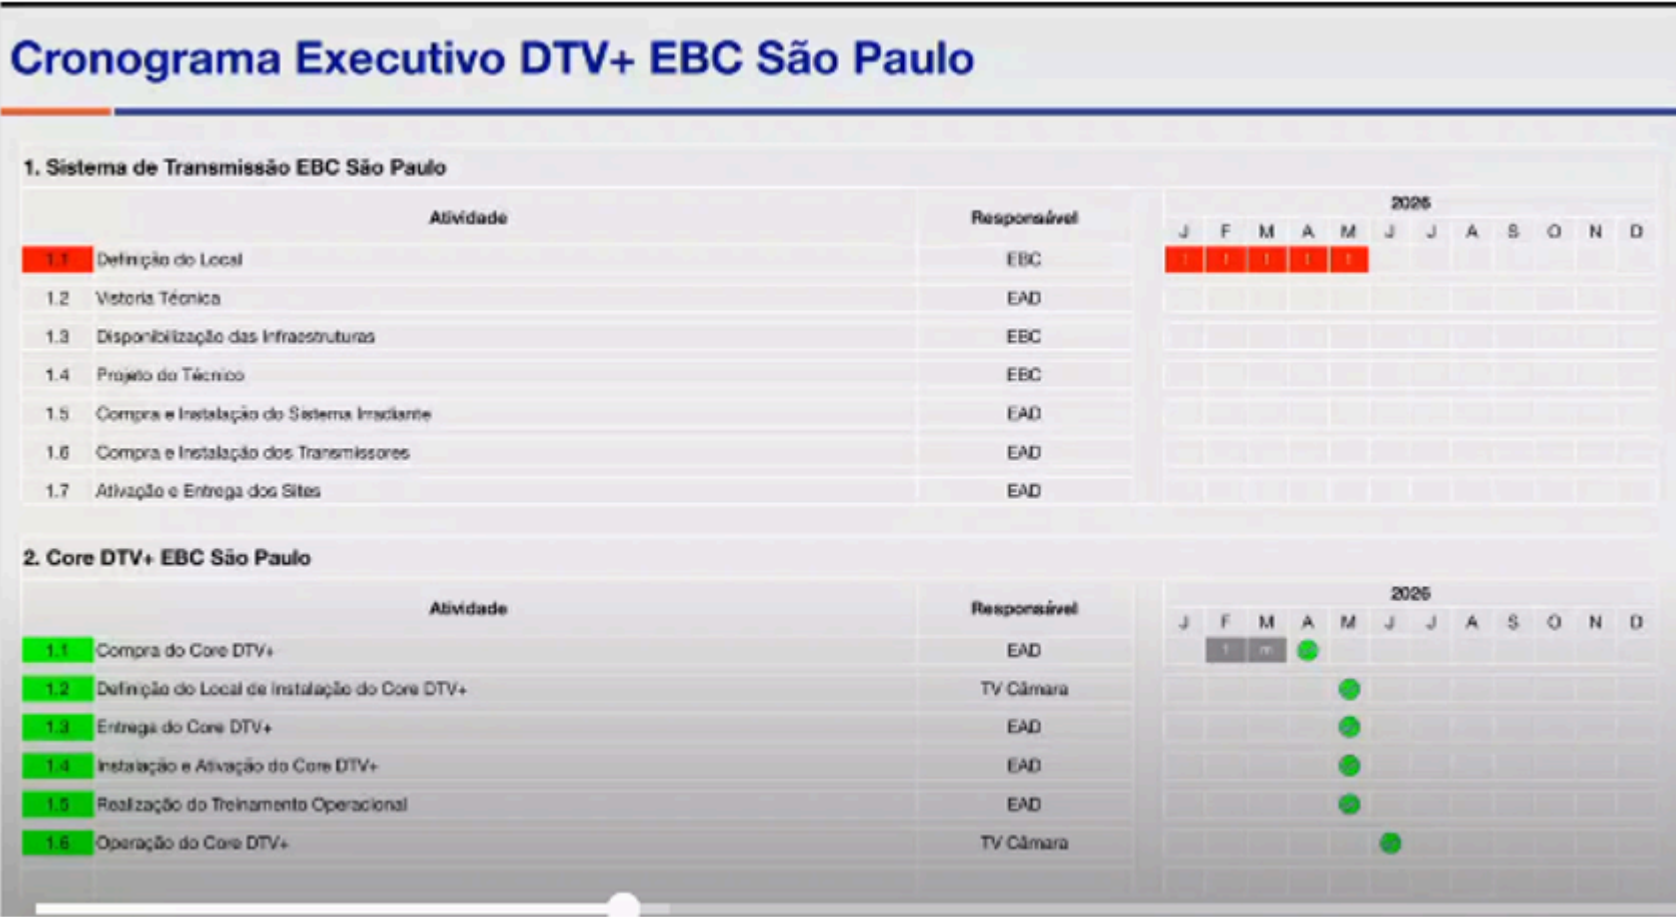

Esclareceu, também que, conforme apresentado anteriormente, as atividades relativas à aquisição dos equipamentos foram estruturadas em duas frentes distintas, abrangendo São Paulo e Brasília, destinadas à EBC e à Câmara. No que se refere ao sistema de transmissão de São Paulo, informou que ainda se aguarda a definição do local de instalação, etapa necessária para o prosseguimento das demais atividades e para o avanço da elaboração das especificações técnicas (RFP) destinadas à aquisição dos equipamentos de transmissão.

O Sr. Gunnar Bedicks, ainda sobre o mesmo assunto, reportou que a atividade referente ao core do sistema já foi integralmente concluída. Informou que foram finalizados os procedimentos de aquisição, instalação e treinamento, em conformidade com as deliberações do GIREL, encontrando-se o equipamento em operação, conforme demonstrado na apresentação dos canais atualmente em funcionamento.

Em seguida, o Sr. Gunnar Bedicks expôs o slide abaixo reproduzido para informar que, da mesma forma, no que se refere a Brasília, no âmbito da EBC, também se encontra pendente a definição do local de instalação, etapa necessária para o adequado encaminhamento dos projetos técnicos e, posteriormente, para a realização da RFP relativa à aquisição dos equipamentos de transmissão.



Registrou, ainda, que, de forma análoga ao ocorrido em São Paulo, a aquisição do *core* já foi concluída, tendo sido igualmente finalizados os procedimentos de instalação e demais etapas de implementação e a transferência do *core* foi realizada para a EBC.

Ato contínuo, o **Sr. Gunnar Bedicks** mostrou o cronograma executivo específico da DTV+ TV Câmara São Paulo:

Cronograma Executivo DTV+ TV Câmara São Paulo

1. Sistema de Transmissão TV Câmara São Paulo			2025											
Atividade	Responsável		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.1 Definição do Local	EBC		1	1	1	1	1	1						
1.2 Vistoria Técnica	EAD													
1.3 Disponibilização das Infraestruturas	TV Câmara													
1.4 Projeto do Técnico	TV Câmara													
1.5 Compra e Instalação do Sistema Irradiante	EAD													
1.6 Compra e Instalação dos Transmissores	EAD													
1.7 Ativação e Entrega dos Sites	EAD													

2. Core DTV+ TV Câmara São Paulo			2025											
Atividade	Responsável		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.1 Compra do Core DTV+	EAD			1	m									
1.2 Definição do Local de Instalação do Core DTV+	TV Câmara						m							
1.3 Entrega do Core DTV+	EAD						m							
1.4 Instalação e Ativação do Core DTV+	EAD						m							
1.5 Realização do Treinamento Operacional	EAD						m							
1.6 Operação do Core DTV+	TV Câmara													

No que se refere ao cronograma executivo DTV+ TV Câmara Brasília, informou que o fluxo seria o mesmo e exibiu o seguinte slide:

Cronograma Executivo DTV+ TV Câmara Brasília

1. Sistema de Transmissão TV Câmara Brasília

Atividade	Responsável	2026											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.1 Definição do Local	TV Câmara												
1.2 Vistoria Técnica	EAD												
1.3 Disponibilização das Infraestruturas	TV Câmara												
1.4 Projeto do Técnico	TV Câmara												
1.5 Compra e Instalação do Sistema Irradiante	EAD												
1.6 Compra e Instalação dos Transmissores	EAD												
1.7 Ativação e Entrega do Site	EAD												

2. Core DTV+ TV Câmara Brasília

Atividade	Responsável	2026											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.1 Compra do Core DTV+	EAD												
1.2 Definição do Local de Instalação do Core DTV+	TV Câmara												
1.3 Entrega do Core DTV+	EAD												
1.4 Instalação e Ativação do Core DTV+	EAD												
1.5 Realização do Treinamento Operacional	EAD												
1.6 Operação do Core DTV+	TV Câmara												

Sobre esse slide, o **Sr. Gunnar Bedicks** destacou que:

- (i) Em relação ao site de transmissão de Brasília, avançou-se na definição do local, tendo sido realizada vistoria técnica e apresentado o respectivo projeto técnico à Anatel e ao SGT Evolução;
- (ii) No que se refere ao *core* de Brasília (DTV+), registrou que foram concluídas as etapas de aquisição e instalação dos equipamentos, permanecendo pendente a etapa de treinamento operacional do equipamento instalado, a pedido da própria Câmara.

Com isso, o **Sr. Gunnar Bedicks** fez a leitura do slide abaixo reproduzido para registrar aos membros do GIRED o cumprimento dessa entrega parcial acerca do Projeto de Destinação Futura:

Cumprimento da Determinação Constante do Projeto Destinação Futura

A EAD informa ao GIRED a conclusão da entrega dos equipamentos **Core DTV+** às entidades públicas beneficiárias, representando o cumprimento parcial dos objetivos do Projeto de Destinação Futura de Estações Experimentais para TVs Públicas.

Essa etapa está alinhada ao DT1 – Diretrizes para a Gestão do Projeto, aprovado na 25ª RE do GIRED que estabelece as bases para a execução das ações voltadas à destinação futura dos ativos desenvolvidos e implantados no âmbito das estações experimentais da TV 3.0 para as emissoras públicas beneficiárias.

A entrega dos **Core DTV+** antecipa a disponibilização de recursos tecnológicos às entidades beneficiárias, contribuindo para sua capacitação técnica, realização de testes e preparação para a futura operação dos sistemas de TV 3.0.

Dessa forma, a EAD registra o cumprimento de etapa relevante do projeto, permanecendo responsável pela execução das demais ações necessárias à destinação futura dos ativos previstos.

Prosseguindo na sua apresentação, o **Sr. Gunnar Bedicks** passou a reportar as informações acerca do Projeto Aplicações TV 3.0 para TVs Públicas, último do **GT-TV**, a partir da exibição de slides que mostram as atividades concluídas e em andamento do referido projeto:

Atividades Concluídas

Atividade			2024					2025												2026											
			A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.1 RFP: Elicitação de Requisitos	P	R																													
3.2 Preparação Workshop	P	R																													
3.3 Workshop: Elicitação dos Requisitos	P	R																													
3.4 Análise documental e regulatória	P	R																													
3.5 Mapeamento de funcionalidade e fluxos de usuário																															
3.6 Mapeamento de requisitos associados a arquitetura das aplicações e integrações	P	R																													
3.7 Mapeamento de requisitos associados a infraestrutura	P	R																													
3.8 Normas ABNT TV 3.0 publicadas	P	R																													
3.9 RFP: Desenvolvimento de Software e Aplicações	P	R																													
3.10 Preparação Workshop Desenvolvimento de Software e Aplicativos	P	R																													
3.11 Workshop: Desenvolvimento de Software e Aplicações	P	R																													
3.12 Definição do cronograma e realização do evento	P	R																													

Atividades Concluídas

Atividade		2024					2025												2026											
		A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
x.1 Preparação Workshop TV 2.5	P R																													
x.2 Workshop TV 2.5	P R																													
x.3 Elicitação de Requisitos TV 2.5	P R																													
y.3 Elicitação de Requisitos Adicionais TV 3.0	P R																													

Atividades em Andamento

Atividade		2024					2025												2026											
		A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.13	Execução Desenvolvimento de Software e Aplicativos																													
3.14	Capacitação de profissionais das TVs Públicas																													
3.15	Conclusão do Projeto																													

Em seguida, o **Sr. Gunnar Bedicks** informou a participação no encontro da Rede Legislativa, realizado em 11 de junho, ocasião em que foi apresentado o estágio inicial de um protótipo das aplicações relacionadas à rede legislativa. Nesse encontro, também, foi feita a demonstração da plataforma comum de comunicação pública de governo digital, apresentada com o objetivo de evidenciar as funcionalidades e possibilidades de uso das soluções em desenvolvimento no âmbito da rede.

Ainda no evento, o Sr. Gunnar Bedicks reportou que foi realizada a demonstração operacional do canal “mais br”, com transmissão efetuada por meio do conjunto de equipamentos já entregues à EBC, o que permitiu a validação do funcionamento integrado da solução. Esclareceu-se que os sinais foram recebidos tanto via radiodifusão quanto via Internet, possibilitando o acesso a canais ao vivo e conteúdos sob demanda, caracterizando um protótipo funcional da plataforma.

O **Sr. Gunnar Bedicks** registrou, ainda, a demonstração do canal interativo, com apresentação do funcionamento das aplicações associadas à TV Câmara, incluindo as funcionalidades interativas a serem disponibilizadas por meio do canal, com recepção de sinal tanto via internet quanto via radiodifusão.

Destacou que a integração entre as diferentes formas de recepção e as aplicações interativas representa um avanço relevante no desenvolvimento do projeto, o qual se encontra em fase de protótipo, constituindo a primeira demonstração operacional de uma solução concebida no âmbito das discussões do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital e das iniciativas do poder público voltadas à implementação da TV 3.0.

Sobre o evento reportado, o **Sr Gunnar Bedicks** exibiu os slides abaixo reproduzidos:



Canal "mais br"





Por fim, o Sr. Gunnar Bedicks Informou que os trabalhos seguem em andamento, incluindo a atualização dos *set-top boxes* e a melhoria de desempenho das aplicações interativas, ressaltando-se que a demonstração apresentada corresponde a uma etapa inicial de validação da solução.


Registrou, também que o marco de 31 de julho foi destacado como data relevante para o projeto, ocasião em que se espera que os protótipos estejam em operação inicial, caracterizando o início de uma fase operacional.

Frisou, ainda, que a iniciativa representa um avanço relevante no processo de consolidação da plataforma comum, destacando-se o envolvimento das equipes responsáveis pelo desenvolvimento, a definição dos requisitos do sistema e a participação das empresas contratadas no desenvolvimento dos aplicativos associados ao projeto.

Finalizada essa parte do informe da EAD, o Sr. Gunnar Bedicks concedeu a palavra ao Sr. Carlos Saldanha para que reportasse ao GIRED as informações sobre a distribuição de kits da TV Digital Terrestre.

O Sr. **Carlos Saldanha** cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e, ato contínuo, exibiu os slides abaixo reproduzidos com o intuito de atualizar o *status* da distribuição de kits e dos Termos de Comodato:



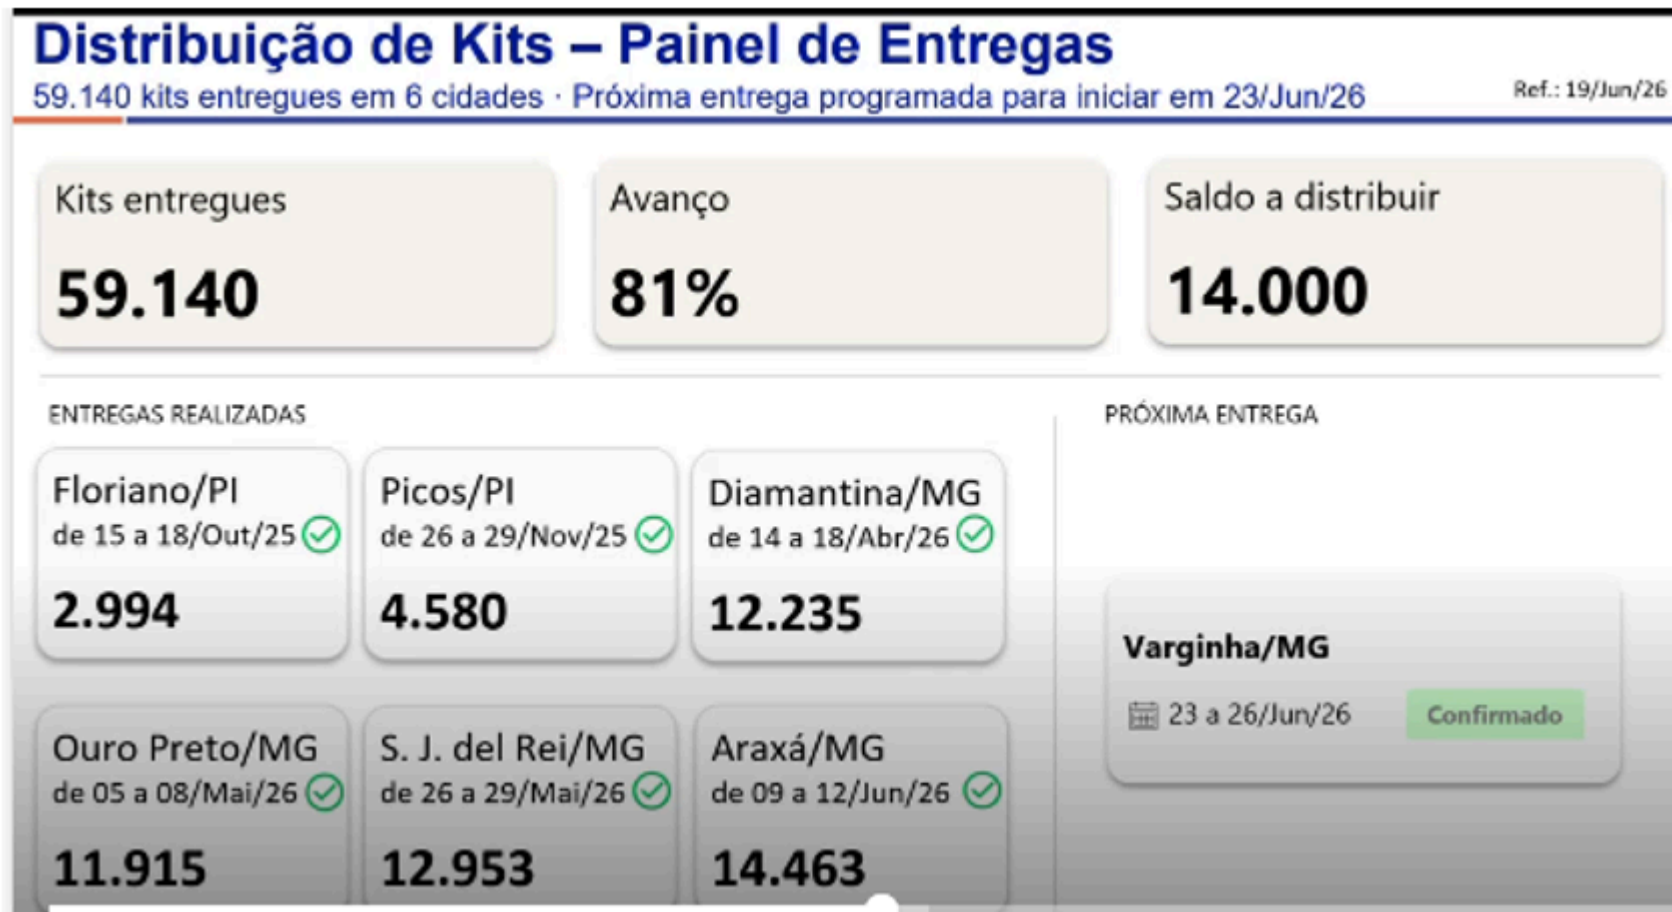

Sobre esses dois slides, o **Sr. Carlos Saldanha** fez os seguintes destaques:

- (i) Aproximadamente 90% dos termos já foram assinados, correspondendo a 301 kits, restando apenas 7 termos para conclusão da etapa. Novos termos ainda poderão ser apresentados e que as solicitações são tratadas à medida que são recebidas.
- (ii) A situação da retirada dos kits por localidade é a seguinte:
 - Brasília: dos 141 kits previstos, 111 kits já foram retirados, restando 30 kits. Foram encaminhados 150 kits para a localidade, permanecendo 9 unidades em estoque.
 - São Paulo: dos 141 kits previstos, 84 já foram retirados. O estoque local não foi detalhado, por estar concentrado na sede e atender às compras residuais.
 - Rio de Janeiro: dos 51 kits previstos, 33 já foram retirados, permanecendo 10 kits em estoque.
- (iii) De forma consolidada, 228 kits já haviam sido entregues, no universo de 333 kits previstos para retirada.

- (iv) Em decorrência das demandas encaminhadas por e-mail, foram identificados mais 19 pedidos, cuja ratificação estava prevista para a reunião do GIRED.
- (v) Quanto aos kits de TV Digital, registrou-se que havia um estoque aproximado de 73 mil kits no início do ano e que, na reunião do GIRED realizada em janeiro, foi aprovada a continuidade das entregas, iniciadas no Estado do Piauí.
- (vi) Até o momento, foram entregues 59 mil kits em Minas Gerais, abrangendo os municípios de Diamantina, Ouro Preto, São João Del Rei e Araxá, estando as entregas em andamento no município de Varginha. A previsão é concluir a distribuição dos 14 mil kits remanescentes em Varginha, de forma a cumprir o compromisso assumido no âmbito do GIRED de finalizar a entrega dos 73 mil kits até o mês de junho. No município de Araxá, foram entregues aproximadamente 6.400 kits em um único dia, resultado atribuído à elevada demanda da população local.

Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** passou a palavra para o **Sr. Carlos Neiva** que parabenizou a equipe responsável pela demonstração realizada durante o evento da Rede Legislativa, nas pessoas do Sr. Gunnar Bedicks e Sr. Antonio Martelletto. Registrou o êxito da apresentação, com a participação de várias autoridades e representantes de entidades envolvidas, bem como os *feedbacks* positivos recebidos, considerados relevantes para o desenvolvimento das iniciativas em andamento.

Em seguida, o **Presidente do GIRED** agradeceu o **Sr. Carlos Neiva** pelo convite para participação no evento da Rede Legislativa, parabenizando os organizadores pelo êxito da iniciativa e destacando sua relevância para o fortalecimento do debate sobre o Programa Brasil Digital e a TV 3.0, bem como a expressiva participação das entidades envolvidas.

Na sequência, o **Presidente do GIRED** parabenizou a EAD pela conclusão do Leilão 04, informando que foram contempladas todas as 112 localidades efetivamente passíveis de atendimento, o que representa um importante avanço na ampliação do acesso à Internet de alta velocidade. Destacou que, com a realização do Leilão 04, atingiu-se 100% das localidades passíveis de atendimento, o que representa, aproximadamente, 300 mil pessoas, distribuídas em 347 localidades, que passarão a ter possibilidade de acesso ao serviço. Ressaltou que essa conquista alcançada pelo GIRED se deu em razão da atuação conjunta de todos os envolvidos, independentemente das instituições que representam.

Em relação ao Programa Brasil Digital, o **Presidente do GIRED** informou que será formalizado termo de adesão destinado à manutenção, pelos próximos quatro anos, das estações implantadas. Comunicou, ainda, que 69 municípios já possuem termos de adesão assinados, dos quais 40 tiveram suas estações concluídas e colocadas em operação no primeiro semestre, correspondendo a mais de 60% dos municípios aptos à implantação nesse período. Nesse sentido, registrou que isso se deve à atuação dirigente dos parceiros legislativos, dos representantes do Ministério das Comunicações e, principalmente, da EAD pelo trabalho desenvolvido na execução do programa.

O **Presidente do GIRED** destacou, ainda, que será realizado, em 1º de julho, evento de balanço do Programa Brasil Digital, promovido pelo Ministério das Comunicações, em parceria com a Anatel e demais instituições participantes, na sede da Agência em Brasília, tendo sido estendido convite aos membros do GIRED.

Por fim, no que se refere ao projeto da TV 3.0, o **Presidente do GIRED** relatou que três estações experimentais encontram-se em operação, sendo uma em Brasília e duas em São Paulo. Esclareceu que a próxima etapa consiste na conclusão dos projetos técnicos e na definição dos equipamentos definitivos, mediante articulação entre Anatel, Câmara dos Deputados, EBC e EAD, com vistas à compatibilização das propostas com os recursos orçamentários disponíveis e posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações para análise da viabilidade de atribuição das frequências pretendidas em Brasília e São Paulo.

Concluída a sua manifestação, o **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado pela EAD.

Não havendo mais manifestações, o **Presidente do GIRED** passou para o item 3 da Pauta.

6. **ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL DE ATENDIMENTO DE LOCALIDADES COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (GT-SMP).**

O **Presidente do GIRED** solicitou ao **Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar**, que apresentasse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT.

O **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e deu início ao relato das atividades do **GT-SMP** informando que faria uma breve apresentação, em complemento ao que foi comentado pela EAD, especialmente quanto aos pontos que constam nesta Pauta para deliberação do GIRED.

Inicialmente, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** registrou manifestação de reconhecimento ao esforço de todos os participantes do GT-SMP na conclusão dos Leilões 2 e 3, encerrados com a aprovação da ata da última reunião do GIRED, realizada nesta Reunião Ordinária. Consignou que o alcance da entrega de 235 localidades só foi possível pelo trabalho conjunto da EAD, do Ministério das Comunicações e da equipe da Anatel, que contribuíram com excelência para a execução do projeto. Destacou que o projeto foi originalmente concebido com orçamento de R\$ 250 milhões, voltado ao atendimento das localidades estabelecidas nos editais, tendo sido executado em três Leilões já concluídos. Posteriormente, com a aprovação de recursos adicionais de R\$ 20 milhões, foi dado início ao Leilão 04, cujas etapas de execução e evolução estão sendo objeto de deliberações no âmbito do GIRED.

Feitas essas considerações iniciais, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** passou a reportar as etapas do Leilão 04, segundo as premissas estabelecidas no Acórdão Anatel nº 203/2024. Informou que já foram cumpridas as três primeiras etapas (convite, análise de propostas e negociação) e a decisão final da contratação que compreende a assinatura dos termos das prestadoras com a EAD até o dia 25 de junho de 2026, serão relatadas na próxima reunião do GIRED.

No tocante à etapa do convite, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** exibiu o slide abaixo reproduzido e reportou que a abertura ocorreu em 22 de maio de 2026, com convocação endereçada a todas as prestadoras detentoras de autorização do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e às detentoras de autorização de radiofrequência nas localidades abrangidas pelo instrumento editalício. Consignou que houve uma atualização do edital no dia 11 de junho de 2026, especificamente no Anexo II, a qual também foi objeto de acompanhamento pelo GT-SMP. Por fim registrou que, no âmbito do acompanhamento realizado pelo GIRED, por meio do GT-SMP, foram considerados atendidos os requisitos estabelecidos no edital no que se refere à etapa de convocação e divulgação.

Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 04

CONVITE



Publicação do Edital

22/05/2026



Convocação

Todas as Prestadoras detentoras

- Autorização do serviço SMP
- Autorização de RF



Atualização do Edital

11/06: Anexo II

Quanto à etapa da análise das propostas, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** relatou que foram apresentadas propostas por 7 (sete) proponentes detentoras de autorização para exploração do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e de autorização de uso de radiofrequência nas localidades abrangidas. Saliou que a documentação apresentada pelas proponentes foi devidamente avaliada, tendo sido formuladas exigências complementares, as quais foram atendidas dentro dos prazos editalícios, concluindo-se, ao final, pelo atendimento integral das regras estabelecidas no edital no prazo previsto para a referida etapa de análise. Para tanto, exibiu o slide abaixo reproduzido:

Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 04

ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Proponentes


- Todas as 7 Proponentes com autorização

Análise

- Documentação avaliada
- Exigências respondidas

Conclusão

- Regra do Edital atendida no prazo



No que concerne à etapa de negociação, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** comunicou que foi realizado o leilão online no dia 17 de junho de 2026, das 9h00 às 13h00, tendo sido acompanhado de forma presencial por representantes da Anatel, do Ministério das Comunicações e da EAD, além de representantes de empresas interessadas que optaram por participar presencialmente, como forma de assegurar a ampla transparência ao procedimento e às regras editalícias aplicáveis à etapa de negociação.

No decorrer da análise posterior à sessão, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** exibiu o slide abaixo reproduzido e reportou a identificação de localidade originalmente contemplada que já dispunha de cobertura, especificamente no município de Barra Vermelha, em Prudentópolis/PR, na qual a empresa TIM S.A. apresentou proposta no valor de R\$ 156.291,04, tendo sido verificada a existência de duas estações da empresa Claro S.A. na localidade, ainda que sem obrigação decorrente de compromisso regulatório específico. Assim, considerando o disposto no item 9.8 do edital, que prevê a possibilidade de substituição de localidades antes ou após a homologação, procedeu-se à substituição da referida localidade pela de Vila de Volta Grande, no município de Rio Negrinho/SC, a qual não possui estações licenciadas, conforme verificação técnica realizada.


Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 04

Negociação

Após o Leilão, foi identificada uma localidade do Anexo II com cobertura.

Localidade com Cobertura

- Item 131 – Anexo II
- Localidade: Barra Vermetha
- Município: Prudentópolis/PR
- Compromissária: Tim S.A.
- Valor: R\$ 156.291,04
- Estações Licenciadas: 2 da Claro

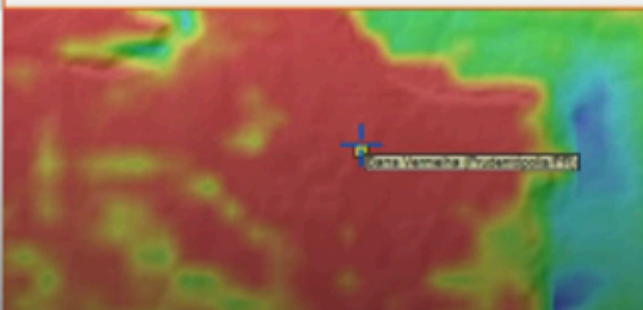

Item 9.8 do Edital nº 04/2026

- **A troca ou substituição de Localidades poderá ser admitida, antes ou depois da homologação, ou durante a execução do Termo de Compromisso, desde que necessariamente submetida à validação expressa do GIREL, como condição para sua eficácia.**

Próxima Localidade não Contemplada do Leilão

- Item 36 – Anexo II
- Localidade: Vila de Volta Grande
- Município: Rio Negrinho/SC
- Compromissária: Tim S.A.
- Valor: R\$ 156.291,04
- Estações Licenciadas: Nenhuma

Após a referida substituição, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** informou que a EAD realizou a avaliação, julgamento e classificação das propostas, tendo o resultado sido divulgado por meio eletrônico a todas as proponentes vencedoras e apresentado nesta Reunião Ordinária. Participaram 7 (sete) prestadoras, com propostas para 114 localidades previstas no Anexo II do edital, tendo sido identificada 1 (uma) localidade sem proposta, correspondente a Ouro Verde/PR, resultando em 113 localidades inicialmente com propostas, sendo que após a substituição mencionada, concluiu-se pela contemplação de 112 localidades, conforme resultado apresentado nesta Reunião. Para tanto, exibiu o slide abaixo reproduzido:

Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 04

Negociação

- A EAD procedeu com o julgamento e classificação das Propostas.
- Resultado
 - divulgado por meio eletrônico para as proponentes vencedoras;
 - apresentado nesta reunião.

Prestadoras com Lances	7	Recurso Disponível	20.000.000,00
Localidades do Anexo II	114	Total das Propostas Apresentadas	R\$ 20.091.073,91
Localidades sem propostas	1 (Ouro Verde, Sengés/PR)	Deságio Total	R\$ 539.343,37
Localidades com Propostas	113	Valor total das Localidades Contempladas	R\$ 19.934.782,87
Localidades já Cobertas	-1 (Berna Vermelha, Prudentópolis/PR)		
Localidade Substituta	• 1 (Vila de Volta Grande, Rio Negrinho/SC)		
Localidades Contempladas	112		

Feitas essas considerações, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** apresentou a proposta formulada pelo **GT-SMP** submetida à deliberação do GIRED:

Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 02

Proposta de Deliberação

CONSIDERAÇÃO

O GT-SMP acompanhou a execução das etapas de convite, análise das propostas e negociações do Leilão 04, e considerou que todas atenderam às regras estabelecidas no Edital nº 04/2026;

As propostas finais vencedoras foram avaliadas pelo GT-SMP e foram consideradas aptas para ratificação, homologação por parte do GIRED.

SUGESTÃO AO GIRED

Ratificar e homologar os vencedores do Leilão 04, com a validação da substituição da localidade Barra Vermelha, no município de Prudentópolis/PR, pela localidade Vila de Volta Grande do município de Rio Negrinho/SC, conforme apresentado, em atendimento ao determinado no item 10.2 do Edital nº 04/2026.

Por fim, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** registrou que o leilão foi estruturado e conduzido em tempo recorde, desde a primeira reunião para elaboração do edital até a realização da sessão, em razão do empenho, esforço e comprometimento conjunto de todos os participantes envolvidos no processo e, para tanto parabenizou as prestadoras participantes, os representantes da radiodifusão, a equipe do Ministério das Comunicações, a equipe da EAD e equipe da Anatel. Agradeceu, ainda, pela oportunidade de apresentação e condução dos trabalhos.

Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** parabenizou o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** pela dedicação na condução do Leilão 04 questionou os membros do GIRED se haveria comentários em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** passou para o item 4 da Pauta.

7. **ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A VALIDAÇÃO FINAL DO GIRED QUANTO AO CUMPRIMENTO DO OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE A LOCALIDADES DO LEILÃO 02.**

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se estão todos de acordo com a proposta de ratificação e homologação dos vencedores do Leilão 04, com a validação da substituição da localidade Barra Vermelha, no município de Prudentópolis/PR, pela localidade Vila de Volta Grande do município de Rio Negrinho/SC, conforme apresentado pelo Coordenador do GT-SMP, **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar**, nesta Reunião.

Não havendo manifestações e diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a proposta de ratificação e homologação dos vencedores do Leilão 04, com a validação da substituição da localidade Barra Vermelha, no município de Prudentópolis/PR, pela localidade Vila de Volta Grande do município de Rio Negrinho/SC, nos termos apresentados nesta Reunião.

Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** registrou que o Leilão 04 teve todas as suas etapas concluídas, com as todas as aprovações necessárias e agradeceu pela parceria e colaboração de todos os envolvidos. Solicitou, ainda, que a assinatura dos termos e a implementação das localidades sejam acompanhadas de perto com o objetivo de viabilizar o rápido acesso da população à internet de alta velocidade.

Em seguida, o **Presidente do GIRED** passou para o item 5 da Pauta.

8. **ITEM 5 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DO GRUPO TÉCNICO DOS PROJETOS ADICIONAIS DA TELEVISÃO DIGITAL (GT-TV).**

O **Presidente do GIRED** solicitou à **Coordenadora do GT-TV, Sra. Kim Moraes Mota**, que fizesse um breve relato das atividades no âmbito do GT.

A **Sra. Kim Moraes Mota** cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e deu início ao relato das atividades do **GT-TV** informando que faria uma breve apresentação sobre as discussões e os encaminhamentos a serem feitos pelo grupo para esta Reunião Ordinária.

Ato contínuo, passou a relatar, em complemento ao que já foi apresentado pela EAD, sobre o andamento das discussões no âmbito de cada um dos quatro projetos em específico.

Sobre o Projeto de Manutenção de ERTM do PDB, a **Sra. Kim Moraes Mota** informou que o projeto de manutenção tem apresentado evolução significativa, destacando que, nas últimas semanas, os esforços concentraram-se na discussão e no aperfeiçoamento do texto do Termo de Cessão relativo ao direito de uso das estações de radiodifusão integrantes do Programa Digitaliza Brasil, documento que seria novamente apresentado na reunião.

Em relação ao Programa Brasil Digital, a **Sra. Kim Moraes Mota** registrou que também foram observados avanços relevantes, ressaltando o acompanhamento semanal das atividades, realizado de forma detalhada, inclusive com a participação do Presidente do GIRED, que tem contribuído com orientações específicas para o desenvolvimento dos trabalhos. Destacou, ainda, que importantes marcos de inauguração foram alcançados ao longo do semestre.

No que se refere ao Projeto de Aplicações de TV 3.0 para TVs Públicas, a **Sra. Kim Moraes Mota** informou que as entregas estão em andamento, com previsão de conclusão até o final do mês de julho. Esclareceu que os protótipos já distribuídos incorporam soluções e aplicações desenvolvidas no âmbito do projeto, permitindo o avanço das atividades de implementação. Acrescentou, também, que já se encontram em operação estações experimentais da TV 3.0 e que a recente distribuição, em regime de comodato, de amostras de engenharia tem possibilitado a avaliação do comportamento dos sinais atualmente transmitidos, contribuindo para o aperfeiçoamento técnico das soluções em desenvolvimento.

Para evitar repetições dos temas já muito bem abordados pela EAD nesta Reunião Ordinária, a **Sra. Kim Moraes Mota** tratou de dois temas específicos que seriam objeto de deliberação nesta Reunião, conforme elencados no slide abaixo reproduzido:



Grupo Técnico dos Projetos Adicionais da Televisão Digital

Reuniões GT-TV

- Acompanhamento do andamento dos projetos adicionais:
 - Projeto de Manutenção de ERTM do PDB;
 - Programa Brasil Digital;
 - Projeto de Aplicações de TV 3.0 para TVs Públicas;
 - Projeto de Evolução do SBTVD-T
- Temas específicos para encaminhamento à 105ª RO do GIRED:
 - Termo de Cessão de Direito de Uso de Estação de Radiodifusão e Determinação à EAD para execução de Ações para Disponibilização e Gestão das Assinaturas do Termo;
 - Atualização da Lista de Distribuição dos Protótipos para Recepção de Sinais de TV 3.0 e Prazo para Manifestação.

Quanto ao Termo de Cessão de Direito de Uso de Estações de Radiodifusão, a **Sra. Kim Moraes Mota** passou à leitura dos dois slides abaixo reproduzidos:



Grupo Técnico dos Projetos Adicionais da Televisão Digital

Termo de Cessão de Direito de Uso de Estação de Radiodifusão

Por meio do Acórdão nº 61, de 06 de março de 2026, o Conselho Diretor da Anatel decidiu:

b) aprovar novas metas e prazos para os projetos adicionais, utilizando o novo saldo de recursos remanescente de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), distribuído da forma descrita a seguir:

(...)

b.2) R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para o projeto de manutenção das estações retransmissoras implantadas no Programa Digitaliza Brasil, a ser realizado pela EAD até 31 de dezembro de 2027, de acordo com as definições do GIRED, podendo eventual saldo de recursos não utilizado neste projeto ser direcionado ao Programa Brasil Digital;

Durante a 25ª Reunião Extraordinária do GIRED, realizada em 20 de fevereiro de 2026, que tratou da proposta de encaminhamento de Matéria para Apreciação do Conselho Diretor relativa à prorrogação do prazo dos projetos adicionais, foi apresentada proposta no sentido de que a EAD realizasse a manutenção das estações atualmente implantadas ao longo do ano de 2027.

A referida manutenção abrangeria os municípios em que ao menos uma entidade detentora de outorga ou consignação assumisse, por meio de termo a ser firmado com o Ministério das Comunicações até outubro de 2026, o compromisso de manter a respectiva estação por mais três anos, compreendendo o período de 2028 a 2030.

Termo de Cessão de Direito de Uso de Estação de Radiodifusão

Em atenção às decisões do GIREL e considerando o Acórdão nº 61, de 06 de março de 2026, o SGT-Manutenção trabalhou em uma proposta de Termo:

- Foi proposto Termo a ser firmado entre o Município e a Entidade detentora de outorga ou consignação de radiodifusão;
- O Termo proposto define as responsabilidades dos cessionários quanto à utilização adequada da estação, manutenção de seus equipamentos e preservação da infraestrutura compartilhada;
- O Termo prevê hipóteses de rescisão, restituição do bem e mecanismos de ressarcimento em caso de encerramento antecipado, quando aplicável;
- O Termo terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de 01 de janeiro de 2028;
- Além da elaboração do texto, sugeriu-se estabelecer que a EAD adotasse as ações necessárias para divulgar o Termo e gerir as assinaturas por parte das prefeituras e outorgadas.

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE ESTÇÃO DE RADIODIFUSÃO

CEDENTE: MUNICÍPIO DE [NOME DO MUNICÍPIO], pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº [●●], com sede administrativa à [endereço completo], neste ato representado por [nome], doravante denominado CEDENTE.

CESSIONÁRIO: [NOME DA ENTIDADE / RADIODIFUSOR], pessoa jurídica de direito [público/privado], inscrita no CNPJ sob nº [●●], com sede à [endereço completo], neste ato representada por seu(sua) representante legal, Sr.(a) [nome], doravante denominado CESSONÁRIO.

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a cessão não onerosa, com encargos, e título precário e não exclusivo, do direito de uso da estação de radiodifusão localizada em [endereço/localização], de propriedade do CEDENTE, para fins de transmissão de sinais de radiodifusão pelo CESSONÁRIO, observada a legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

Esse Termo envolve apenas a utilização da estação para a prestação de serviços de transmissão de sinais de radiodifusão de sons e imagens, em tecnologia digital, vedada qualquer utilização diversa sem autorização prévia e expressa do CEDENTE.

A Sra. Kim Moraes Mota informou que o texto, ora apresentado, é substancialmente semelhante ao submetido na última Reunião Extraordinária do GIREL, tendo sido promovidos ajustes pontuais. Esclareceu que as alterações realizadas se concentraram na Cláusula Terceira, constante do slide abaixo reproduzido, que trata das obrigações dos cessionários, em atendimento à sugestão apresentada pela EBC.



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO(S) CESSIONÁRIO(S)

Constituem obrigações dos CESSIONÁRIOS:

1 - Utilizar a beam exclusivamente para a finalidade prevista neste termo;

f – Realizar, às suas expensas, toda a manutenção necessária ao adequado funcionamento do equipamento transmissor utilizado para transmissão de seus sinais de radiodifusão de sons e imagens, incluindo o sistema de recepção do sinal, pelo prazo da vigência do presente termo;

II - Assegurar, de forma solidária, juntamente aos demais cessantes da estação de radiodifusão, a integridade, conservação e bom estado de funcionamento dos equipamentos de ar-condicionado, inclusive, quando for o caso, a substituição do aparelho de uso compartilhado;

IV – Responsabilizar-se por eventuais danos causados ao bem, a terceiros ou ao meio ambiente em decorrência da utilização da/etiqueta de radiodifusão;

V - Não promover alterações estruturais na estação sem autorização prévia e expressa do CEDENTE;

VI - Permitir a fiscalização do CEDENTE e de órgãos públicos a qualquer tempo.

VII – Não ceder, transferir ou sublocar, total ou parcialmente, o objeto deste termo sem autorização prévia e expressa do CEDENTE;

VII – Cumprir integralmente a legislação aplicável à radiodifusão, inclusive normas técnicas e de segurança.

§ 1º A responsabilidade pela manutenção ordinária do equipamento de ar-condicionado observará sistema de mérito entre os CESSIONÁRIOS, considerando-se o prazo de vigência desta Acordo.

I - Caso sobrevenham dois CESSIONÁRIOS, cada um ficará responsável pela obrigação em questão por 18 (dezoito) meses;

II – Caso sobrevenham três CESSIONÁRIOS, cada um ficará responsável pela obrigação em questão por 12 (doze) meses e assim sucessivamente;

III - A ordem de responsabilidade observará a ordem cronológica de assinatura deste Termo.

IV - Em caso da superavida da necessidade de substituição do equipamento de ar-condicionado, a troca, incluindo custos de aquisição e de instalação, será de exclusiva responsabilidade do CESSIÁRIO que estiver responsável pela obrigação em questão no momento da necessidade de substituição do equipamento.

82º O inadimplemento de qualquer CESSONÁRIO não exerce os demais da responsabilidade pela manutenção e funcionamento da infraestrutura compartilhada.

§3º Na hipótese de omissão ou comprovado inadimplemento de qualquer CESSIONÁRIO, o período correspondente ao CESSIONÁRIO inadimplente será redistribuído entre os demais CESSIONÁRIOS, de modo que se evite a interrupção e a continuidade do serviço, assegurada a defesa da empresa contra o inadimplente.

64º Eventuais controvérsias entre os CESSATÓRIOS poderão, sempre que possível, ser previamente submetidas à tentativa de solução administrativa perante o CEDENTE, sem prejuízo da adoção de medidas urgentes necessárias à continuidade do serviço.

15ª Os CESSIONÁRIOS poderão, de comum acordo e mediante formalização por escrito, estabelecer critério alternativo para o rateio dos custos compartilhados previstos na Cláusula Terceira, desde que tal ajuste não comprometa a adequada manutenção, operação e funcionamento de infraestrutura compartilhada, nem reduza ou a contínuidade do serviço.

Em atendimento à sugestão apresentada pela TV Câmara, a **Sra. Kim Moraes Mota** relatou que a proposta foi aperfeiçoada para prever um sistema de rodízio entre os cessionários quanto ao custeio das despesas relacionadas ao funcionamento do sistema de ar-condicionado. Esclareceu, ainda, que foi incluído o § 5º da Cláusula Terceira, estabelecendo a possibilidade de as partes definirem, mediante formalização específica, critério alternativo para o rateio dos custos, em substituição ao modelo originalmente proposto.

Quanto ao Termo de Cessão, a **Sra. Kim Moraes Mota** reportou que, após os aperfeiçoamentos promovidos e as discussões realizadas, foi alcançado consenso em relação ao texto do referido Termo, razão pela qual será submetido à apreciação dos membros do GIREN nesta Reunião Ordinária.

Prosseguindo no informe do GT-TV, a **Sra. Kim Moraes Mota** noticiou que que, em cumprimento à deliberação do GIREN acerca da distribuição dos protótipos destinados à recepção de sinais de TV 3.0, a EAD vem disponibilizando as amostras de engenharia às instituições interessadas. Destacou que a Anatel, diversos órgãos públicos e entidades detentoras de outorga de radiodifusão já receberam os respectivos kits.

Desde a referida deliberação, a **Sra. Kim Moraes Mota** acrescentou que foram recebidas novas manifestações de interesse por parte de entidades do setor de radiodifusão em participar dos testes em andamento mediante o recebimento das amostras de engenharia. Nesse contexto, o Ministério das Comunicações solicitou o empréstimo de mais 10 (dez) kits de recepção.

Logo, em razão das novas solicitações encaminhadas, inclusive aquelas recebidas por correio eletrônico e direcionadas ao GIREN, bem como da demanda apresentada pelo Ministério das Comunicações, a **Sra. Kim Moraes Mota** registrou que a previsão atualizada é de distribuição, pela EAD, de 377 (trezentos e setenta e sete) protótipos conversores de sinais de TV 3.0, atualizando, assim, as informações apresentadas na exposição anterior da entidade, conforme slide abaixo reproduzido.

Atualização da Lista de Distribuição dos Protótipos para Recepção de Sinais de TV 3.0

- Desde a deliberação do GIRED sobre o tema, a EAD está disponibilizando as amostras de engenharia para recepção de TV 3.0.
- A Anatel, diferentes órgãos e entidades já receberam os kits.



- Foram recebidas novas manifestações de interesse, de entidades do setor de radiodifusão, em receber amostras de engenharia de receptores de TV 3.0.
- O Ministério das Comunicações também solicitou o empréstimo de mais 10 kits de recepção.
- Considerando as novas manifestações de interesse, contabilizou-se um total de 377 protótipos de conversores de sinais de TV 3.0 a serem distribuídos pela EAD.

Em seguida, a **Sra. Kim Moraes Mota** exibiu o slide abaixo reproduzido que traz a relação de equipamentos a serem disponibilizados ao Ministério das Comunicações, totalizando 20 (vinte) kits, dos quais 10 (dez) já haviam sido entregues, bem como a inclusão de novas entidades que manifestaram interesse em participar dos testes durante a última semana, razão pela qual o quantitativo final de protótipos conversores de sinais de TV 3.0 a serem distribuídos pela EAD passou a totalizar 377 (trezentos e setenta e sete) equipamentos.

Atualização da Lista de Distribuição dos Protótipos para Recepção de Sinais de TV 3.0

Nome da Entidade	CNPJ	Local de Uso	Quantidade de protótipos solicitados
Rádio e Televisão Bandeirantes	60509239/0001-13	São Paulo/SP	5
Rádio e Televisão Bandeirantes	33060733/0001-90	Rio de Janeiro/RJ	5
Rádio e Televisão Bandeirantes	60509239/0001-09	Brasília/DF	5
Senado Federal	00530279/0001-15	Brasília/DF	10
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	21185703/0001-69	Rio de Janeiro/RJ	3
Universidade Federal Fluminense (UFF)	28523215/0001-06	Rio de Janeiro/RJ	3
Universidade de Brasília (UnB)	00038174/0001-43	Brasília/DF	3
Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET-RJ	42441758/0001-05	Rio de Janeiro/RJ	3
Universidade Federal do Paraíba (UFPA)	24268477/0001-10	João Pessoa/PB	3
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)	03508097/0001-36	Brasília/DF	1
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)	03508097/0001-36	Rio de Janeiro/RJ	1
Plocruz	33781053/0001-35	Rio de Janeiro/RJ	1
TV UNESP	48031918/0001-24	São Paulo/SP	1
Rede CNT (TV Corcovado)	54313531/0001-63	Rio de Janeiro/RJ	1
Rede CNT (Rádio e Televisão CM Ltda.)	77237733/0001-79	São Paulo/SP	1
SBT	45039237/0001-14	Brasília/DF	10
SBT	45039237/0001-14	Rio de Janeiro/RJ	10
SBT	45039237/0001-14	São Paulo/SP	10
Globo	27865757/0001-02	Brasília/DF	4
Globo	27865757/0001-02	Rio de Janeiro/RJ	4
Globo	27865757/0001-02	São Paulo/SP	4
EBC	09168704/0001-42	Brasília/DF	16
EBC	09168704/0001-42	Rio de Janeiro/RJ	4
EBC	09168704/0001-42	São Paulo/SP	10
Abert	34255368/0001-79	Brasília/DF	10
SECOM	09234494/0001-43	Brasília/DF	30
Anatel Sede	02030715/0001-12	Brasília/DF	5
Anatel GR01	02030715/0001-12	São Paulo/SP	4
Anatel GR02	02030715/0001-12	Rio de Janeiro/RJ	3
Ministério das Comunicações	37753630/0001-03	Brasília/DF	20
Câmara dos Deputados	00530352/0001-69	Brasília/DF	10
Câmara Legislativa do Distrito Federal	26963645/0001-13	Brasília/DF	5
Câmara Municipal de São Paulo	50176268/0001-28	São Paulo/SP	5
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo	50982259/0001-85	São Paulo/SP	5

Nome da Entidade	CNPJ	Local de Uso	Quantidade de protótipos solicitados
Anatel	03107168/0001-09	Brasília/DF	10
Rádio e Televisão Record S.A.	60628369/0001-75	São Paulo/SP	10
Televisão Record do Rio de Janeiro Ltda.	27506734/0001-00	Rio de Janeiro/RJ	10
Anatel	03107168/0001-09	São Paulo/SP	10
Rádio e Televisão Capital Ltda.	02579008/0001-69	Brasília/DF	10
Rede Mulher (Record News de SP)	02344518/0001-78	São Paulo/SP	5
Astral	06963327/0001-45	Brasília/DF	2
Fundação João Paulo II/TV Canção Nova	50015039/0001-75	Cachoeira Paulista/SP	3
Universidade Presbiteriana Mackenzie	60967551/0001-50	São Paulo/SP	10
UFRR	33663683/0062-38	Rio de Janeiro/RJ	3
EITV	07255679/0001-09	São Paulo/SP	7
SIDIA Instituto de Ciência e Tecnologia	06994459/0002-52	São Paulo/SP	3
LH Telecomunicações Ltda.	05083608/0001-40	São Paulo/SP	3
AUAD Correa Equipamentos Eletrônicos Ltda.	01377089/0001-03	Santa Rita de Sapucaia/MG	3
USP	63025530/0001-04	São Paulo/SP	5
NGA Radar Consultoria e Soluções para Broadcast	47570276/0001-79	Rio de Janeiro/RJ	5
Minskulo Software Ltda.	27718877/0001-79	Rio de Janeiro/RJ	10
ENINSYS Technologies	-	Brasília/DF	1
ENINSYS Technologies	-	São Paulo/SP	1
Rhodes & Schwarz	02957511/0001-21	São Paulo/SP	3
TV Cultura	61914891/0001-86	São Paulo/SP	6
TV Gazeta	61277273/0001-72	São Paulo/SP	5
SRF (TV Justiça)	00531640/0001-28	Brasília/DF	7
MGI	-	Brasília/DF	2
Videodata Broadcast Systems Integration	72782188/0001	São Paulo/SP	6
Grupo MBR Comunicação	57569196/0001-57	São Paulo/SP	5
LineUp - Integradora de Soluções Broadcast	06062165/0001-80	São Paulo/SP	2
CIS Group	-	São Paulo/SP	5
Segma Soluções Video	00493193/0001-24	São Paulo/SP	1
Propega Consultoria de Engenharia em Radiodifusão	-	São Paulo/SP	3
Total			377

Grupo Técnico dos Projetos Adicionais da Televisão Digital

Feitas as observações sobre os dois itens específicos, a **Sra. Kim Moraes Mota** fez a leitura dos encaminhamentos do GT-TV ao membros do GIRED nesta Reunião Ordinária:

Encaminhamentos do GT-TV

Considerações

- Considerando que na 25ª Reunião Extraordinária do GIRED foi prevista a necessidade de estabelecimento de Termo de Compromisso referente à Manutenção das Estações do PDB;
- Considerando que o GT-TV entendeu pertinente que o Termo fosse firmado entre as Prefeituras e as Entidades Outorgadas junto ao Ministério;
- Considerando que os membros do GT-TV decidiram, por consenso, submeter proposta de Termo ao GIRED; e
- Considerando a necessidade de ampla divulgação dessa etapa do projeto, bem como do Termo, além da necessidade de que seja realizada a devida gestão das assinaturas;

Proposta de Encaminhamento 1

O GT-TV submete à deliberação do GIRED:

- proposta de Termo de Cessão de Direito de Uso de Estações de Radiodifusão, apresentada nessa 105ª RO do GIRED; e
- proposta de determinação à EAD para que adote as ações necessárias à divulgação e à gestão das assinaturas do Termo de Cessão de Direito de Uso das Estações do Programa Digitaliza Brasil pelas prefeituras e entidades outorgadas junto ao Ministério e já participantes do programa

Encaminhamentos do GT-TV

Considerações

- Considerando que foram recebidas novas manifestações de interesse na obtenção, mediante comodato, de amostras de engenharia de receptores de TV 3.0;
- Considerando que a Anatel avalia a necessidade de obter mais amostras de engenharia para realizar testes técnicos específicos que corroborem com a atuação regulatória da Agência; e
- Considerando que o período de manifestação de interesse já se estende há mais de um mês, tendo o GIRED recebido diversas manifestações de interesse;

Proposta de Encaminhamento 2

Submete-se à deliberação do GIRED:

- proposta de atualização da lista de distribuição dos protótipos para recepção de sinais de TV 3.0.; e
- proposta de encerramento do prazo para manifestação de interesse na obtenção dos protótipos, preservada a possibilidade de obtenção de amostras adicionais pela Anatel para realização de testes técnicos adicionais.

Concluída a apresentação e não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** agradeceu a **Sra. Kim Moraes Mota** e passou para o item 6 desta Pauta.

9. ITENS 6 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO ACERCA DO TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE ESTAÇÕES DO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL.

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de deliberação acerca do Termo de Cessão de Direito de Uso das Estações do Programa Digitaliza Brasil e quanto às ações a serem adotadas pela EAD para divulgação e gestão das assinaturas do referido Termo pelas prefeituras e entidades outorgadas junto ao Ministério e já participantes do programa, conforme apresentado pela **Coordenadora do GT-TV, Sra. Kim Moraes Mota**, nesta Reunião.

Não havendo manifestações e diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a proposta de deliberação acerca do Termo de Cessão de Direito de Uso das Estações do Programa Digitaliza Brasil, nos termos apresentados nesta Reunião, autorizando o prosseguimento do projeto de manutenção das estações.

O **Presidente do GIRED** destacou que o instrumento deverá ser celebrado em todos os municípios nos quais houver interesse de, pelo menos, uma entidade de radiodifusão, mediante a formalização do respectivo termo com a prefeitura. Esclareceu que a celebração do instrumento implicará no compromisso da EAD de realizar a manutenção das estações ao longo do ano de 2027, bem como o compromisso das entidades locais de radiodifusão de assumirem a manutenção das estações durante o período de 2028 a 2030.

Na sequência, o **Presidente do GIRED** questionou a EAD acerca da previsão para publicação do material em seu sítio eletrônico, ressaltando a importância de que essa divulgação ocorresse antes do período de defesa, a fim de possibilitar que o Ministério das Comunicações e a Anatel auxiliassem na disseminação das informações.

Em resposta, o **Sr. Gunnar Bedicks** informou que a EAD já se encontrava elaborando a forma de divulgação do material, bem como o fluxo do procedimento para gerenciamento das assinaturas dos termos. Acrescentou que a expectativa era de que a divulgação fosse realizada ainda naquela semana.

Passada a palavra ao **Sr. Wilson Diniz Wellisch**, esse parabenizou a equipe pelos trabalhos desenvolvidos, com destaque para a atuação da **Sra. Kim Moraes Mota**, da **Sra. Daniela**, do **Sr. Carlos** e dos demais integrantes da EAD. Ressaltou o compromisso assumido pela equipe na última reunião do GIRED de promover os ajustes necessários na minuta do Termo de Cessão, conforme as contribuições então apresentadas, de modo a possibilitar sua apreciação conclusiva na presente Reunião Ordinária.

Em seguida, o **Presidente do GIRED** retomou a palavra para associar-se às manifestações de reconhecimento dirigidas à equipe da EAD e aos demais participantes que contribuíram para a construção do instrumento. Observou que, embora uma etapa importante do processo tivesse sido concluída com a aprovação do Termo de Cessão, o êxito da iniciativa dependeria do efetivo engajamento das partes envolvidas na fase de implementação. Nesse sentido, enfatizou a importância da ampla divulgação do instrumento e da mobilização das entidades de radiodifusão, de forma a possibilitar a celebração do maior número possível de acordos para a manutenção das estações.

Acrescentou que, além das ações de divulgação a serem promovidas pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel, inclusive por meio das informações disponibilizadas no sítio eletrônico da EAD, seria fundamental a participação dos próprios radiodifusores na disseminação das informações relativas ao Termo de Cessão e aos prazos para sua formalização. Registrou, ainda, que o período compreendido entre o final de junho e o mês de outubro seria destinado à celebração dos instrumentos, possibilitando a definição do quantitativo de estações que permaneceriam contempladas pelo modelo de manutenção, consistente em 1 (um) ano de manutenção pela EAD, durante 2027, seguido de 3 (três) anos de responsabilidade dos radiodifusores, correspondentes ao período de 2028 a 2030.

Não havendo outras manifestações sobre o tema, o Presidente deu por encerrada a deliberação desse item e passou para o item 7 da Pauta.

10. **ITEM 7 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DOS PROTÓTIPOS PARA RECEPÇÃO DE SINAIS DE TV 3.0.**

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de deliberação sobre a atualização da lista de distribuição dos protótipos para recepção de sinais de TV 3.0. e quanto ao prazo máximo para manifestação de interesse na obtenção dos protótipos, preservada a possibilidade de obtenção de amostras adicionais pela Anatel para realização de testes técnicos adicionais, conforme apresentado pela **Coordenadora do GT-TV, Sra. Kim Moraes Mota**, nesta Reunião.

O **Presidente do GIRED** lembrou que a proposta submetida à deliberação contempla o encerramento do prazo para solicitação de empréstimo, em regime de comodato, dos kits de recepção de sinais de TV 3.0 destinados às cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Esclareceu, ainda, que o período para apresentação de solicitações permaneceu aberto por aproximadamente um mês e meio, prazo considerado suficiente para que os interessados manifestassem seu interesse.

Assim, propôs que fossem apreciadas apenas as solicitações já formalizadas, incluindo os pedidos apresentados pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel e pelas demais entidades mencionadas durante a reunião, de modo a encerrar essa etapa de distribuição dos kits nas referidas localidades.

Na sequência, consultou os membros do GIRED quanto à concordância com a proposta, esclarecendo que, uma vez aprovada, não seriam aceitas novas solicitações de empréstimo, em regime de comodato, para as cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo no exercício em curso.

Diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou fica aprovada a proposta de deliberação sobre a atualização da lista de distribuição dos protótipos para recepção de sinais de TV 3.0., e encerrado o prazo para manifestação de interesse na obtenção dos referidos protótipos, preservada a possibilidade de obtenção de amostras adicionais pela Anatel para realização de testes técnicos adicionais, nos termos apresentados nesta Reunião Ordinária. Solicitou que a Secretaria do GIRED registrasse a presente deliberação em Ata e que a EAD proceda à formalização necessária para a celebração desses novos Termos de Cessão.

Concluídos esses registros e a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou para o item 8 da Pauta.

11. **ITEM 8 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.**

O Presidente do GIRED passou a palavra para o representante do Ministério das Comunicações, **Sr. Wilson Diniz Wellisch**, para fazer um reporte sobre o evento do Brasil Digital a ser realizado no dia 1º de julho de 2026, com o objetivo de realizar um m balanço das entregas efetuadas até o momento no âmbito do Programa Brasil Digital. Esclareceu que o programa teve sua concepção iniciada no final de 2023, como um complemento do Digitaliza Brasil, tendo como objetivo promover uma expansão significativa da Rede Nacional de Comunicação Pública, da Rede Legislativa e da transmissão dos sinais das estações das redes privadas.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** relatou que a iniciativa foi inicialmente estruturada como um projeto-piloto, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), utilizando recursos limitados disponíveis no Ministério das Comunicações. Posteriormente, o projeto foi incorporado ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), o que possibilitou sua expansão em escala, mediante a utilização de recursos do Ministério das Comunicações e, posteriormente, de recursos aprovados pelo GIRED.

Na sequência, o **Sr. Wilson Diniz Wellisch** destacou que, embora o projeto tenha enfrentado desafios ao longo de sua implementação, especialmente no relacionamento com os diversos parceiros envolvidos, foi possível superar as principais etapas e estabelecer um fluxo contínuo e crescente de instalações. Ressaltou, ainda, que o Conselheiro Octavio Penna Pieranti, **Presidente do GIRED**, tem acompanhado presencialmente grande parte das entregas, contribuindo para a aceleração da execução do projeto.

Por fim, o **Sr. Wilson Diniz Wellisch** registrou que o momento é oportuno para celebrar os resultados alcançados, sobretudo diante da aproximação da etapa final do atual governo, do período de defeso e do calendário eleitoral. Enfatizou, contudo, a importância de assegurar o apoio necessário para a continuidade do projeto e para o cumprimento das entregas ainda previstas. Informou que o evento de balanço será realizado na sede da Anatel e solicitou aos participantes que, caso ainda não tenham recebido o convite, entrem em contato com seu gabinete, a fim de garantir o encaminhamento dos convites a todos os interessados. Ao final, colocou-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais.

Retomada a palavra, o **Presidente do GIRED** agradeceu as considerações apresentadas pelo **Sr. Wilson Diniz Wellisch** e destacou que tem buscado assegurar a participação institucional da Anatel nas inaugurações das estações implementadas no âmbito do GIRED, seja por meio de sua presença, seja por intermédio de representantes da Agência nos respectivos estados. Registrou agradecimento aos escritórios regionais da Anatel, que têm atendido prontamente às solicitações para participação nas inaugurações, bem como ao assessor Marcos Estevo, do Gabinete, que também representou a Agência em diversas ocasiões.

Na sequência, o **Presidente do GIRED** informou que, no evento previsto para o dia 1º, serão apresentados os resultados consolidados do Programa Brasil Digital, abrangendo as estações implementadas pelo GIRED, pelo Ministério das Comunicações e pelo projeto-piloto executado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Esclareceu que serão divulgados indicadores como o total de estações instaladas, o número de municípios atendidos e a população beneficiada, ressaltando que os resultados obtidos são bastante positivos, embora os números ainda estejam em fase de consolidação.

O **Presidente do GIRED**, manifestou seu entusiasmo com o Programa Brasil Digital e enfatizou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da radiodifusão brasileira. Destacou que a ampliação do número de emissoras contribui para a promoção da diversidade de conteúdo, do pluralismo informativo e do fortalecimento da democracia.

O **Presidente do GIRED** acrescentou, ainda, que o programa representa a correção de uma injustiça histórica, ao viabilizar a implantação de estações de televisão e de rádio aguardadas há muitos anos por universidades públicas e institutos federais. Como exemplo, mencionou a inauguração das estações do Brasil Digital nos municípios de Juazeiro e Paulo Afonso, realizada na semana anterior com a presença do Ministro das Comunicações, ocasião em que foi destacado que a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) aguardava, havia dezoito anos, a implantação de uma estação de televisão. Observou, ainda, que há casos de emissoras de rádio pleiteadas por universidades públicas há três ou quatro décadas, cuja implementação está sendo viabilizada no âmbito do programa.

Por fim, o **Presidente do GIRED** ressaltou a importância das universidades públicas e dos institutos federais para o desenvolvimento científico e social do País, destacando sua atuação em momentos decisivos da história nacional. Manifestou satisfação por participar, como servidor público, da execução dessa iniciativa e parabenizou os envolvidos, em especial o Ministro das Comunicações, o Sr. Wilson Diniz Wellisch, bem como sua equipe, pelo trabalho desenvolvido. Informou, por fim, que os resultados consolidados serão apresentados no evento do dia 1º, registrando que novas entregas de estações estão previstas para o segundo semestre, observadas as restrições aplicáveis ao período eleitoral.

Em seguida, o **Presidente do GIRED** abordou um outro assunto, a TV 3.0. Informou que a expectativa é concluir, na medida do possível, a elaboração dos projetos das estações ao longo das três semanas subsequentes, destacando que essa etapa é essencial para viabilizar a aquisição dos equipamentos.

Esclareceu que, após a conclusão dos projetos, será necessária a obtenção da anuência da EAD quanto à compatibilidade dos projetos com o orçamento disponível. Na sequência, os projetos deverão ser encaminhados ao Ministério das Comunicações para avaliação da viabilidade de utilização das radiofrequências pretendidas para a implantação das estações.

O **Presidente do GIRED** registrou, também, que os esforços estarão concentrados no cumprimento dessas etapas, com o objetivo de dar prosseguimento à implementação do projeto da TV 3.0.

Por fim o Presidente do GIRED reportou a realização de cerimônia em homenagem aos ex-Presidentes do GIRED, ressaltando a importância de reconhecer e valorizar a atuação dos ex-presidentes do GIRED, cuja contribuição foi fundamental para os avanços e resultados alcançados ao longo da execução do projeto.

Na sequência, o **Sr. Wilson Diniz Wellisch** destacou ter acompanhado a atuação do GIRED desde sua criação e ressaltou que o modelo adotado constitui um dos exemplos mais exitosos de implementação de política pública, evidenciado pelos resultados obtidos. Salientou, ainda, que a eficiência na gestão dos recursos permitiu não apenas o cumprimento dos objetivos originalmente previstos no Edital do 4G, mas também a incorporação de novos projetos, ampliando o alcance das iniciativas desenvolvidas. Por fim, manifestou reconhecimento ao trabalho realizado pelas equipes envolvidas e destacou a relevância de preservar a memória institucional e valorizar as contribuições daqueles que participaram da construção dos resultados alcançados.

Ao encerrar o tema, o **Presidente do GIRED** agradeceu as manifestações e informou que outros ex-presidentes do GIRED, impossibilitados de comparecer ao evento por estarem em viagem, encaminharam mensagens em vídeo, demonstrando orgulho pelos resultados alcançados e pela trajetória construída pelo Grupo.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** passou para o item 9 da Pauta.

12. **ITEM 9 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2026.**

O **Presidente do GIRED** definiu que a 106ª Reunião Ordinária fosse realizada no dia 03 de agosto de 2026, segunda-feira, de forma remota, pela manhã, e que seria convocada Reunião extraordinária para o dia 10 de julho de 2026, sexta-feira, pela tarde.

Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o **Presidente do GIRED** agradeceu a participação de todos os membros presentes e declarou encerrada a 105ª Reunião Ordinária do GIRED.

13. **APROVAÇÃO**

Declara-se que o presente registro escrito reflete o conteúdo das discussões, manifestações e deliberações ocorridas durante a 105ª Reunião Ordinária do GAISPI, consolidando os entendimentos e encaminhamentos aprovados no âmbito do Grupo.
