EAD
Criada conforme determinação da ANATEL

RELATÓRIO SEMANAL

13.Dez.21

FLUXO | FASE 1.1 | CE • PI • RN

73 MUNICÍPIOS • 266 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

13/Dez/21
Status d+145

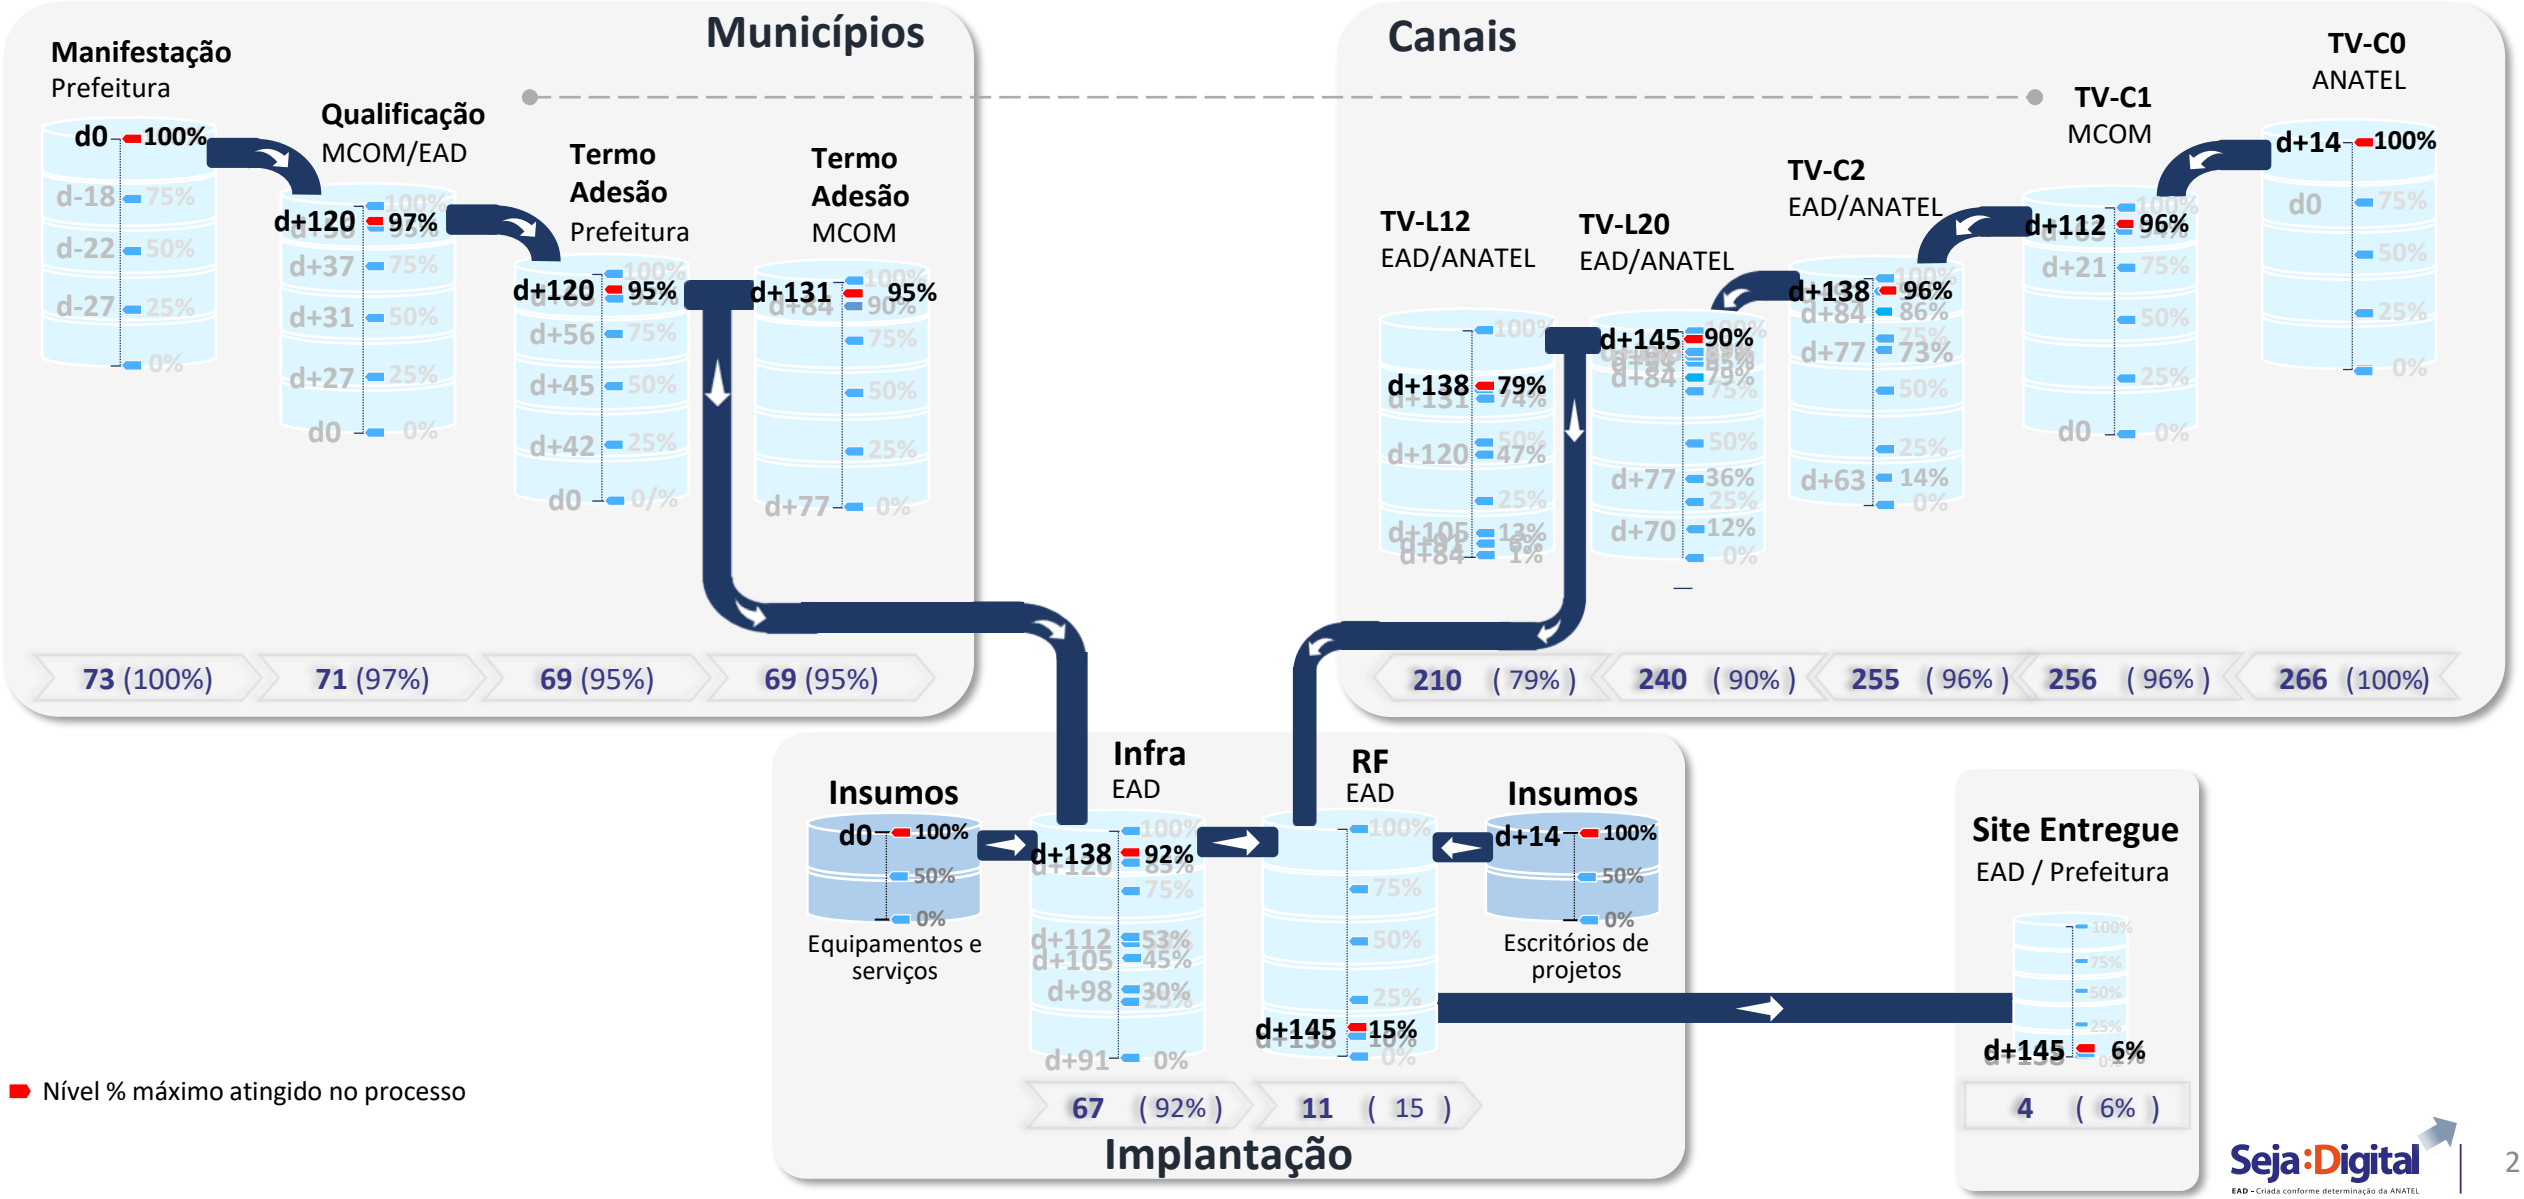

Nível % máximo atingido no processo

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.1 • 73 MUNICÍPIOS • 266 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

13/Dez/21
Status d+145

Manifestação de interesse da entidade

Entidade

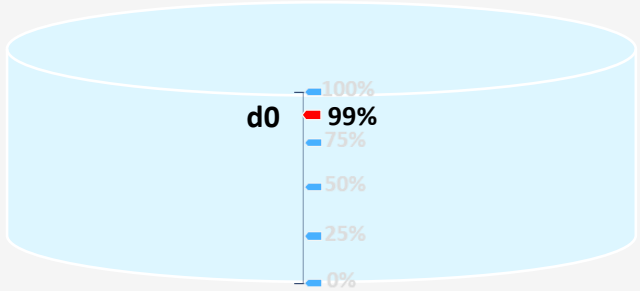

72 (99%)

VTA positiva da entidade manifestante

EAD

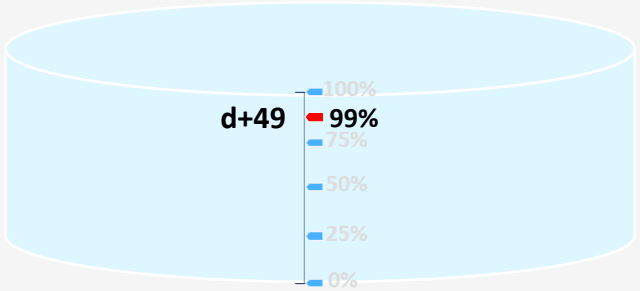

72 (99%)

Entidade manifestante qualificada

MCOM

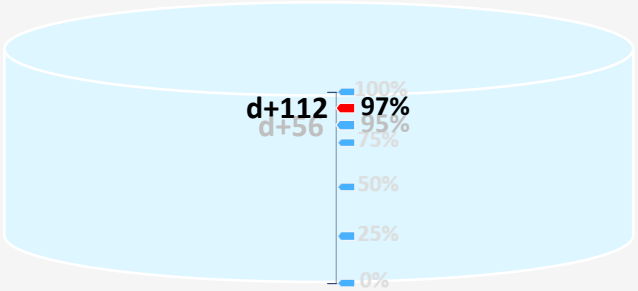

71 (97%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD

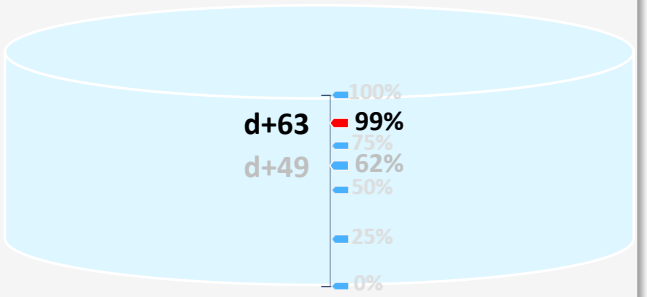

72 (99%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.1 • 73 MUNICÍPIOS • 266 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

13/Dez/21
Status d+145

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.1	Lagoa Nova/RN	15.477	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.1	Inhuma/PI	15.296	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.1	Montanhas/RN	11.295	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.1	Pedra Branca/CE	43.160	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.1

13/Dez/21
Status d+145

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	9	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	10	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	11	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	13	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	8	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Guaraciaba do Norte	FUNDACAO JOAO PAULO II	26	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.1	CE	Itapiúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	3	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.1	CE	Nova Russas	RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA	2	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.1	PI	Pedro II	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	26	STM 6	STM 5	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P3 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.1

13/Dez/21
Status d+145

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A		7	STM 10	STM 9	SIM	SIM
1.1	CE	São Luís do Curu	FUNDACAO DE TELEDU. DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC	Televisão Verdes Mares		11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.1	RN	Umarizal	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	TVSBT Canal 4 de São Paulo		12	STM 6	STM4	NÃO	SIM

Entidade que manifestou interesse

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P4 • CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.1

13/Dez/21

Status d+145

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P5 • CANAIS PENDENTES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.1

13/Dez/21

Status d+145

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P6 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.1

13/Dez/21
Status d+145

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1	CE	Meruoca	FUNDACAO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC	43	STM 4	SIM	SIM
1.1	CE	Meruoca	FUNDACAO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC	28	STM 4	SIM	SIM
1.1	CE	Nova Russas	RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA	42	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Nova Russas	RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA	20	STM 5	SIM	SIM

FLUXO | FASE 1.1 Complemento | CE • PI • RN

24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

13/Dez/21
Status d+115

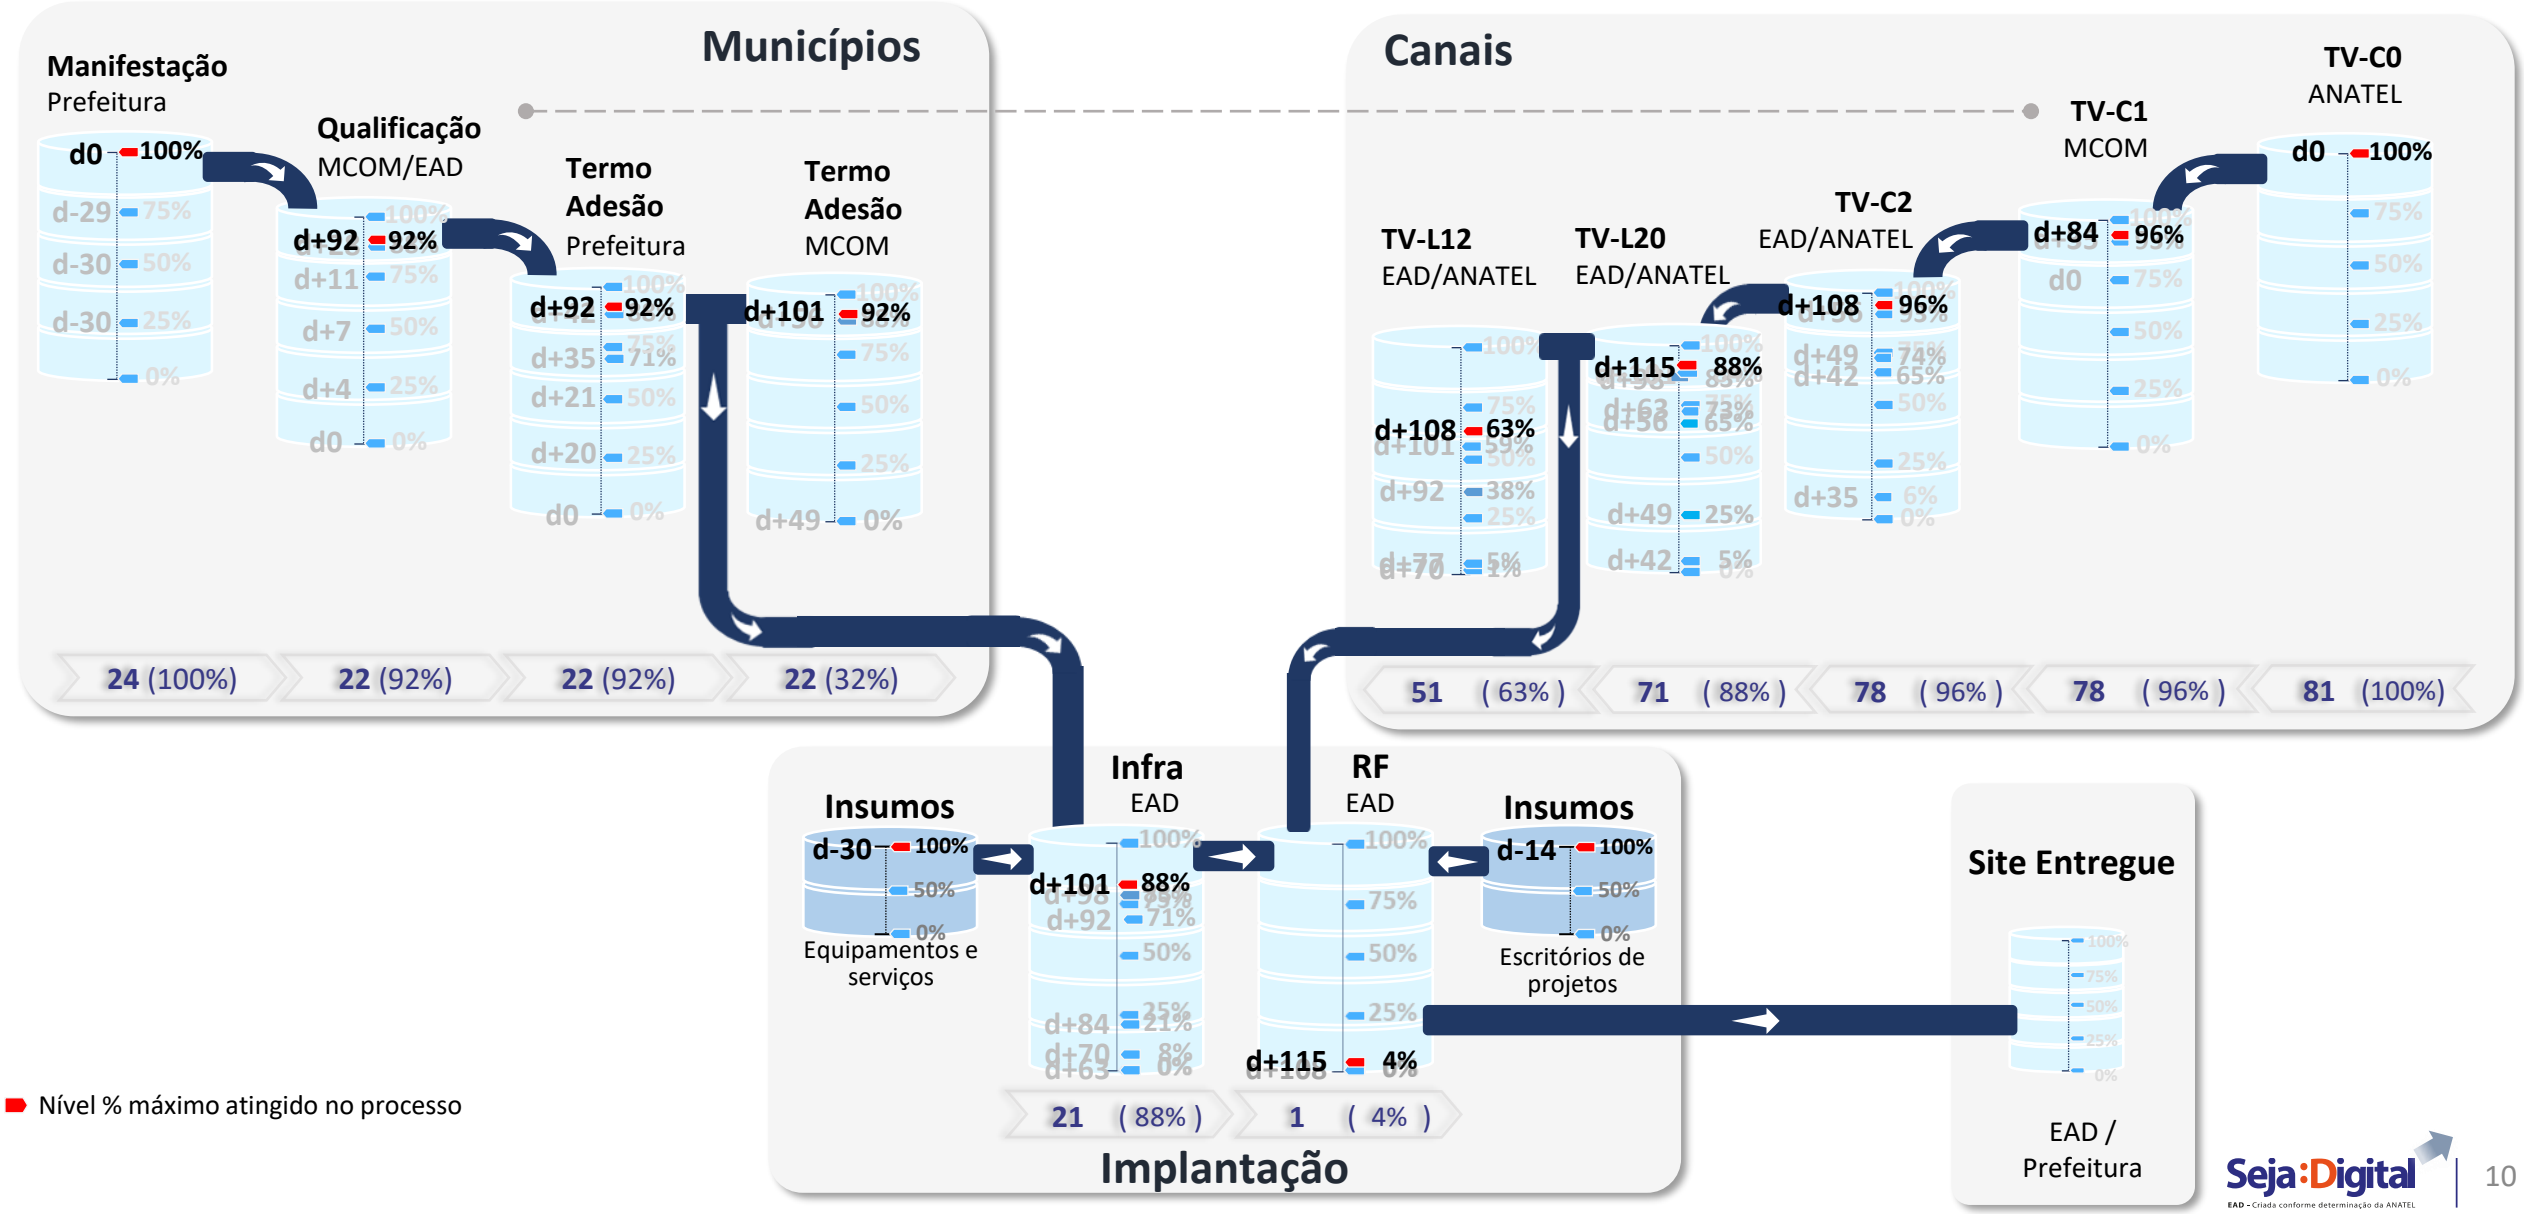

Nível % máximo atingido no processo

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.1 COMP. • 24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

13/Dez/21
Status d+115

Manifestação de interesse da entidade

Entidade

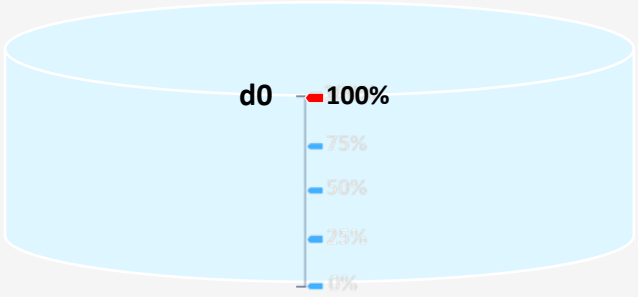

24 (100%)

VTA positiva da entidade manifestante

EAD

24 (100%)

Entidade manifestante qualificada

MCOM

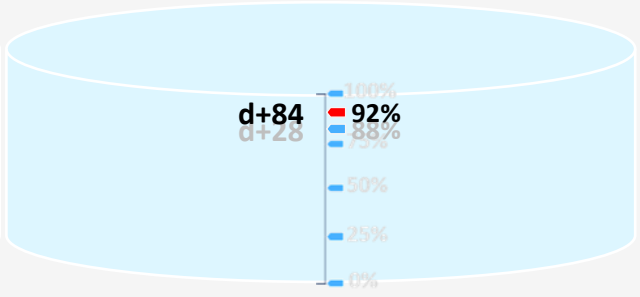

22 (92%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD

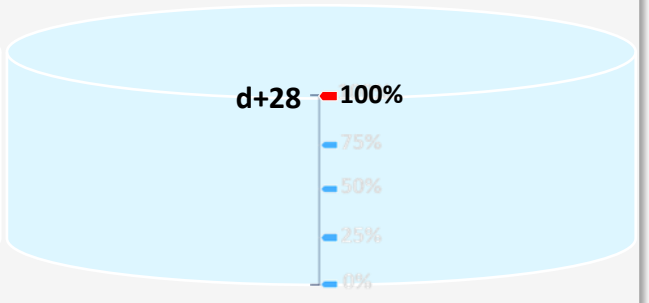

24 (100%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.1 COMP. • 24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

13/Dez/21
Status d+115

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.1 compl.	Frutuoso Gomes/RN	4.095	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.1 compl.	Itaú/RN	5.858	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.1 COMP.

13/Dez/21
Status d+115

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1 comp	RN	Itaú	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU	4	STM 4	STM 3	NÃO	SIM

P3 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.1 COMP.

13/Dez/21
Status d+115

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	Observação	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1Comp	CE	Baixio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO	TVSBT Canal 4 de São Paulo		2	A manifestação deveria ter ocorrido pela CPB	STM 4	STM 3	NÃO	SIM

Entidade que manifestou interesse

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P4 • CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.1 COMP.

13/Dez/21
Status d+115

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P5 • CANAIS PENDENTES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.1 COMP.

13/Dez/21
Status d+115

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P6 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.1 COMP.

13/Dez/21
Status d+115

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

13/Dez/21

CEARÁ

48 municípios

INFRA		
Concluídos	Programadas	Com pendência
45	2	1

RF			
Concluídos	Em programação	Programadas	Pendência ou sem L20
8	25	2	13

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Abaiara	Concluído	11-nov-21	Sim	Concluído	2-dez-21
Aiuaba	Concluído	31-out-21	Sim	Concluído	6-dez-21
Alcântaras	Concluído	24-out-21	Sim	E/P	FR
Altaneira	Concluído	28-nov-21		E/P	FR
Antonina do Norte	Concluído	10-nov-21	Sim	E/P	FR
Araripe	Concluído	31-out-21	Sim	S/P	FR
Aratuba	Concluído	10-nov-21	Sim	E/P	FR
Arneiroz	Concluído	5-nov-21	Sim	S/P	P2 / P3 /FR
Assaré	Concluído	8-nov-21		E/P	FR
Baixio	Concluído	8-nov-21	Sim	S/P	P3 / FR
Capistrano	Concluído	10-nov-21	Sim	E/P	FR
Catarina	Concluído	11-nov-21		E/P	FR
Chaval	Concluído	15-out-21	Sim	E/P	FR
Choró	--	28-jan-22		S/P	FR
Farias Brito	Concluído	4-nov-21	Sim	E/P	FR
Fortim	Concluído	27-out-21	Sim	Concluído	8-dez-21
General Sampaio	Concluído	10-nov-21	Sim	E/P	FR
Granjeiro	Concluído	8-nov-21		E/P	FR
Guaraciaba do Norte	Concluído	8-nov-21	Sim	S/P	P2 / FR
Hidrolândia	--	28-jan-22		S/P	FR
Ibiapina	Concluído	23-out-21	Sim	--	30-nov-21
Independência	Concluído	20-out-21	Sim	E/P	FR
Ipaumirim	Concluído	18-out-21		S/P	FR
Itaiçaba	Concluído	24-out-21	Sim	Concluído	7-dez-21

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Itapiúna	Concluído	12-nov-21	Sim	S/P	P2 / FR
Itatira	Concluído	21-nov-21		S/P	FR
Jaguaretama	Concluído	17-out-21	Sim	S/P	FR
Jaguaribara	Concluído	5-nov-21	Sim	--	17-dez-21
Jati	Concluído	11-nov-21		E/P	FR
Lavras da Mangabeira	Concluído	9-nov-21	Sim	Concluído	3-dez-21
Meruoca	Concluído	27-nov-21		E/P	P6 / FR
Mulungu	Concluído	25-out-21	Sim	E/P	FR
Nova Russas	Concluído	23-out-21	Sim	S/P	P2 / P6 / FR
Novo Oriente	Concluído	5-nov-21		E/P	FR
Ocara	Concluído	12-nov-21		E/P	FR
Orós	Concluído	22-out-21		E/P	FR
Pacujá	Concluído	30-out-21		E/P	FR
Parambu	Concluído	12-nov-21		E/P	FR
Pedra Branca	S/P	P1		S/P	FR
Penaforte	Concluído	16-out-21	Sim	Concluído	30-nov-21
Pereiro	Concluído	15-out-21	Sim	Concluído	4-dez-21
Poranga	Concluído	22-out-21		E/P	FR
Porteiras	Concluído	22-out-21	Sim	Concluído	28-nov-21
Potengi	Concluído	29-out-21		E/P	FR
Saboeiro	Concluído	25-out-21	Sim	E/P	FR
Santana do Cariri	Concluído	5-nov-21		E/P	FR
São Luís do Curu	Concluído	12-nov-21		S/P	P3 / FR
Umari	Concluído	18-out-21	Sim	E/P	FR

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.

ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

13/Dez/21

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

PIAUÍ

17 municípios

INFRA		
Concluídos	Programadas	Com pendência
16	0	1

RF			
Concluídos	Em programação	Programadas	Pendência ou sem L20
1	11	3	2

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Alto Longá	Concluído	23-out-21		E/P	FR
Avelino Lopes	Concluído	25-out-21	Sim	E/P	FR
Barro Duro	Concluído	22-out-21	Sim	E/P	FR
Beneditinos	Concluído	23-out-21	Sim	--	30-nov-21
Bertolínia	Concluído	14-nov-21	Sim	E/P	FR
Capitão de Campos	Concluído	4-nov-21	Sim	--	17-dez-21
Flores do Piauí	Concluído	21-out-21	Sim	E/P	FR
Fronteiras	Concluído	8-nov-21	Sim	E/P	FR
Gilbués	Concluído	19-out-21	Sim	Concluído	9-dez-21
Inhuma	S/P	P1		S/P	FR
Manoel Emídio	Concluído	17-nov-21		E/P	FR
Pedro II	Concluído	28-out-21	Sim	S/P	P2 / FR
Pio IX	Concluído	10-nov-21		E/P	FR
Porto	Concluído	4-nov-21	Sim	E/P	FR
Santa Filomena	Concluído	19-out-21	Sim	--	17-dez-21
Simplício Mendes	Concluído	11-nov-21	Sim	E/P	FR
Várzea Grande	Concluído	8-nov-21		E/P	FR

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.

ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

13/Dez/21

RIO GRANDE DO NORTE

32 municípios

INFRA		
Concluídos	Programadas	Com pendência
27	0	5

RF			
Concluídos	Em programação	Programadas	Pendência ou sem L20
2	10	8	12

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Alexandria	Concluído	10-nov-21	Sim	--	17-dez-21
Almino Afonso	--	14-jan-22		S/P	FR
Angicos	Concluído	27-out-21	Sim	E/P	FR
Augusto Severo	Concluído	29-out-21	Sim	E/P	FR
Baía Formosa	Concluído	12-nov-21	Sim	--	17-dez-21
Barcelona	Concluído	12-nov-21		E/P	FR
Bento Fernandes	Concluído	16-nov-21	Sim	Concluído	8-dez-21
Caiçara do Rio do Vento	Concluído	15-nov-21	Sim	E/P	FR
Canguaretama	Concluído	6-dez-21	Sim	E/P	FR
Coronel João Pessoa	Concluído	31-out-21	Sim	--	17-dez-21
Doutor Severiano	Concluído	29-out-21	Sim	E/P	FR
Frutuoso Gomes	S/P	P1		S/P	FR
Governador Dix-Sept Rosado	Concluído	31-out-21	Sim	S/P	FR
Guamaré	Concluído	4-dez-21		S/P	FR
Itaú	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Lagoa de Velhos	Concluído	17-nov-21		E/P	FR

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Lagoa Nova	S/P	P1		S/P	FR
Montanhas	S/P	P1		S/P	FR
Pedra Preta	Concluído	12-nov-21		E/P	FR
Pedro Avelino	Concluído	25-out-21	Sim	S/P	FR
Pedro Velho	Concluído	12-nov-21	Sim	--	17-dez-21
Portalegre	Concluído	31-out-21	Sim	E/P	FR
Rafael Fernandes	Concluído	11-nov-21	Sim	E/P	FR
Rafael Godeiro	Concluído	10-nov-21	Sim	--	17-dez-21
Santo Antônio	Concluído	10-nov-21	Sim	--	17-dez-21
São Bento do Trairí	Concluído	25-nov-21	Sim	--	17-dez-21
São João do Sabugi	Concluído	11-nov-21	Sim	E/P	FR
Serra Negra do Norte	Concluído	12-nov-21	Sim	--	17-dez-21
Serrinha	Concluído	11-nov-21	Sim	S/P	FR
Tenente Ananias	Concluído	2-mai-21	Sim	UTE	07-mai-21 / FR
Touros	Concluído	9-nov-21	Sim	Concluído	26-nov-21
Umarizal	Concluído	30-out-21		S/P	P3 / FR

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.

FLUXO | FASE 1.2 | MA • PB

161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

13/Dez/21
Status d+108

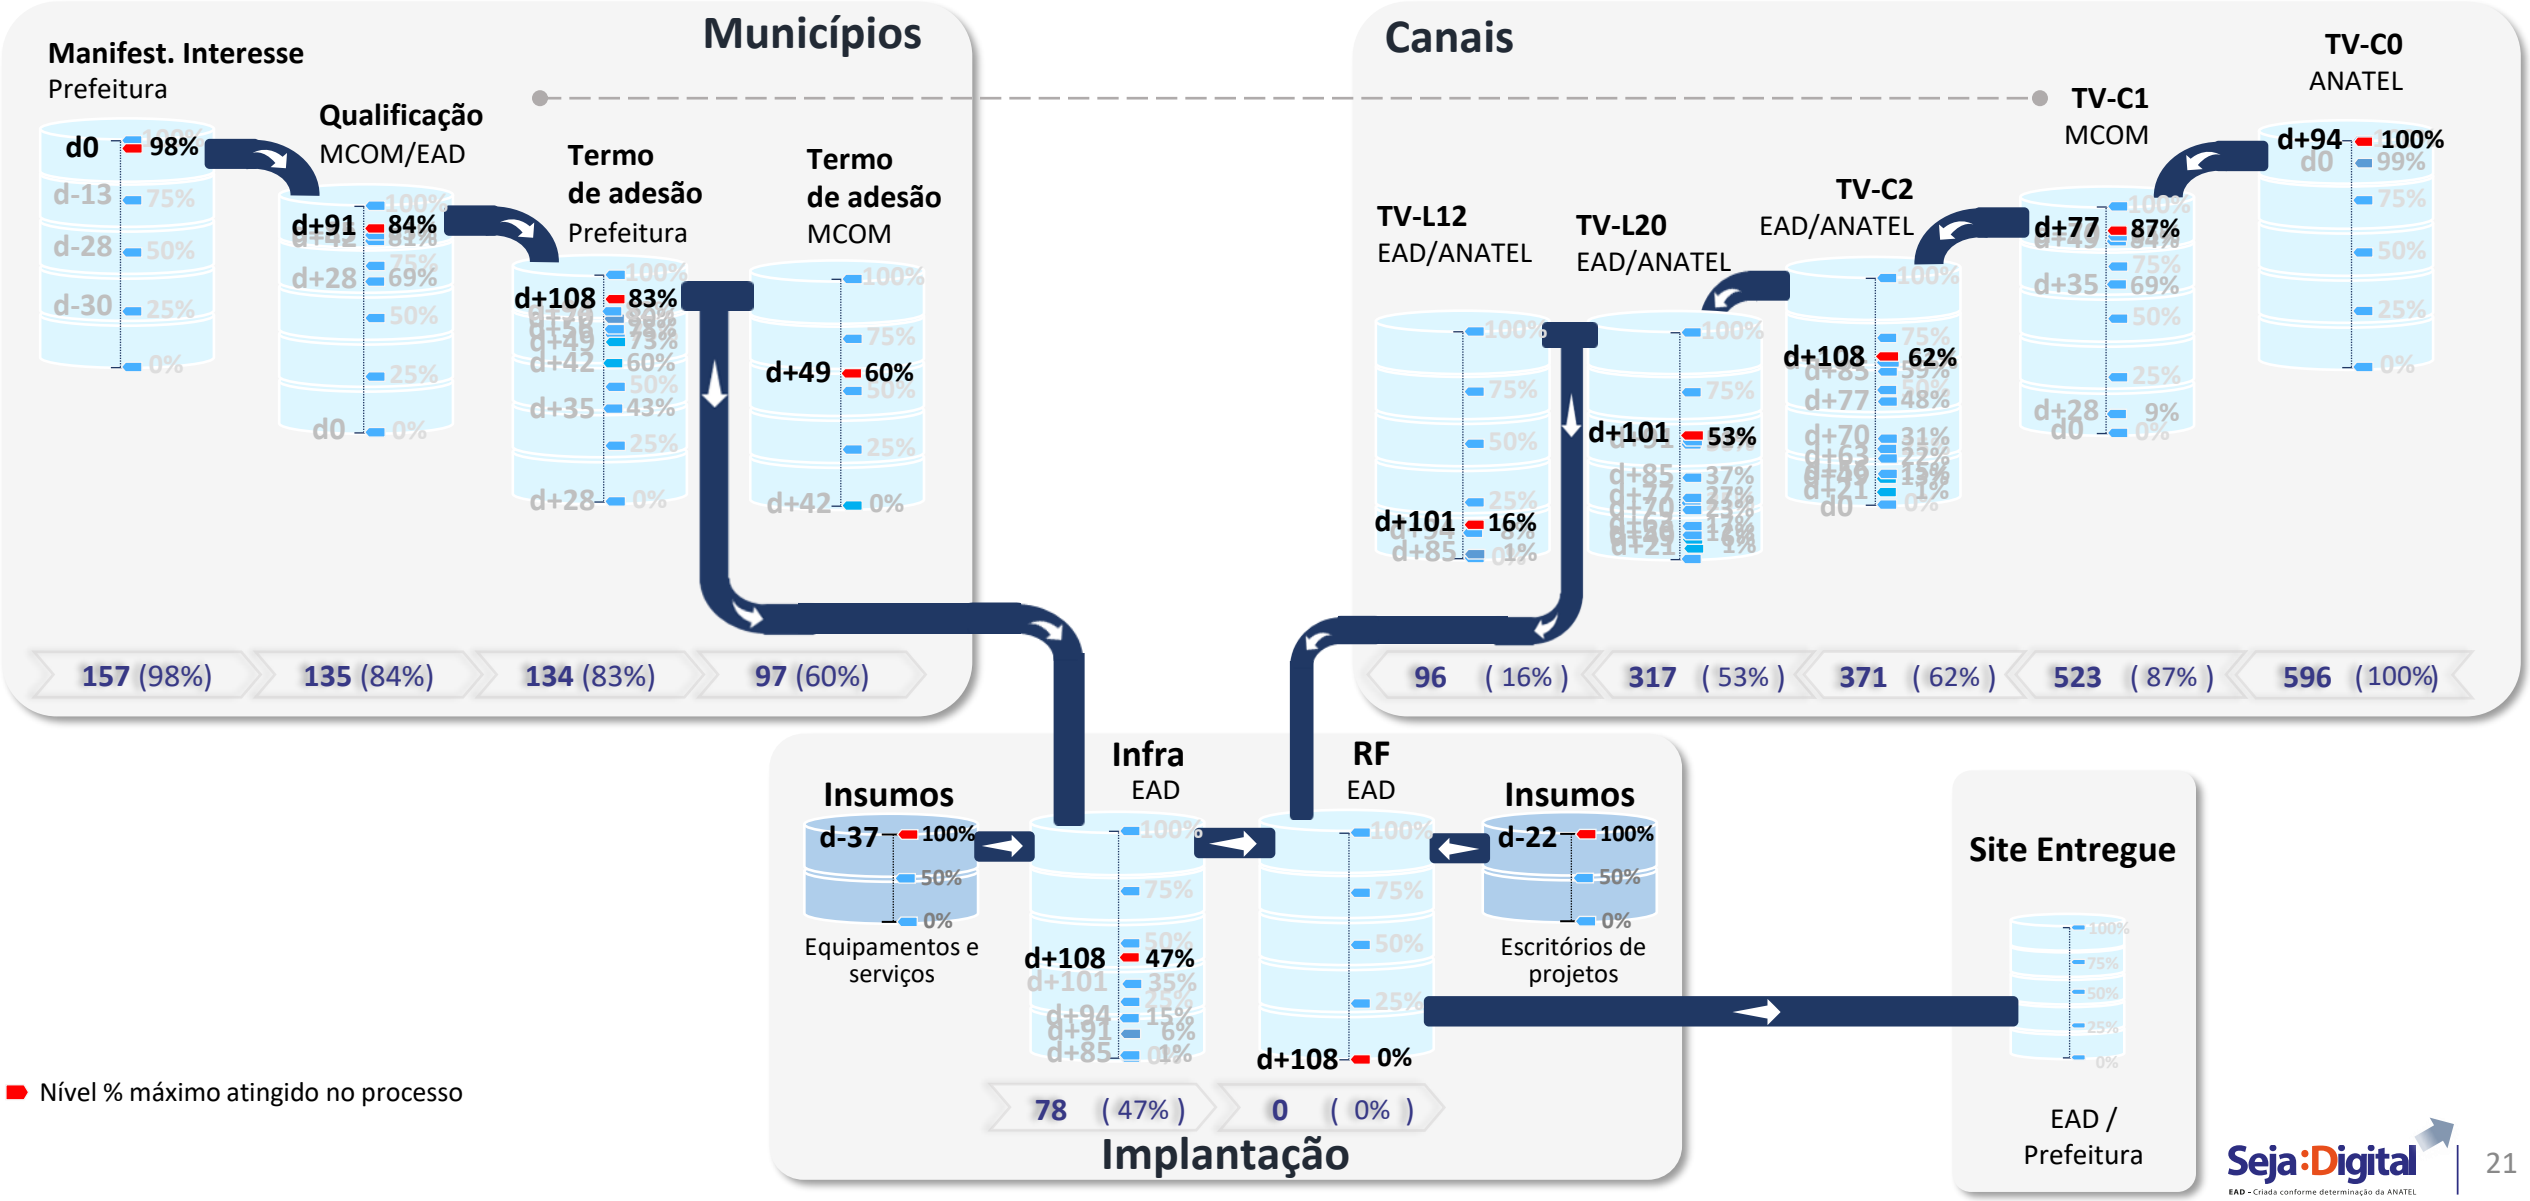

Nível % máximo atingido no processo

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

13/Dez/21
Status d+108

Manifestação de interesse da entidade
Entidade

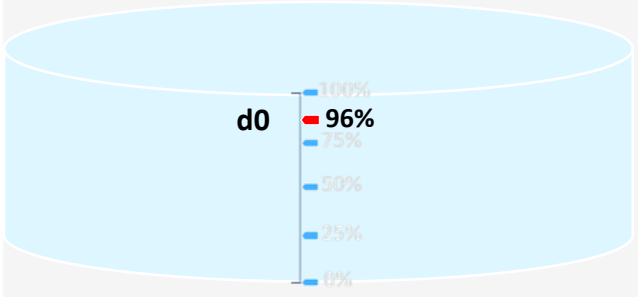

154 (96%)

VTA positiva da entidade manifestante
EAD

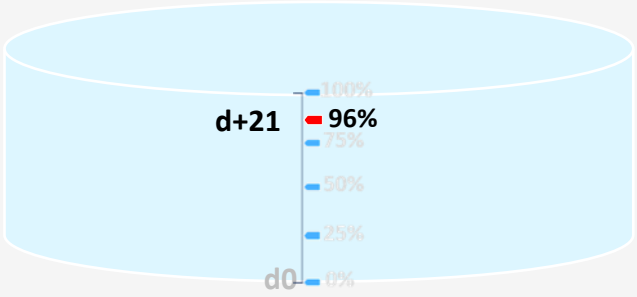

154 (96%)

Entidade manifestante qualificada
MCOM

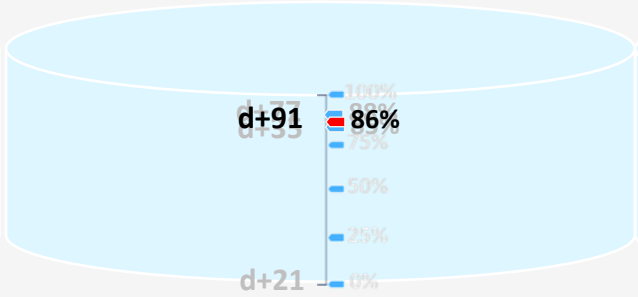

139 (86%)

Local Habilitado
Prefeitura / EAD

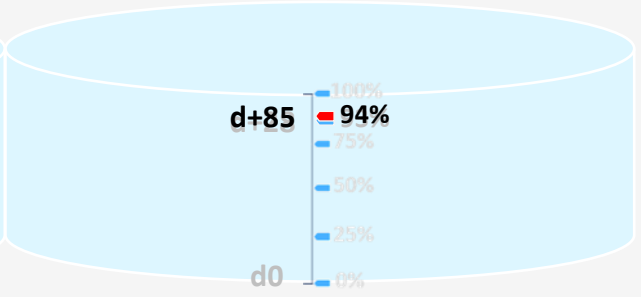

151 (94%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES (1/2)

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

13/Dez/21
Status d+108

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.2	Malta/PB	5.766	Não	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Pilar/PB	11.855	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	4	SIM	SIM
1.2	Serra Grande/PB	3.089	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Sertãozinho/PB	4.958	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Caaporã/PB	21.698	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Imaculada/PB	11.790	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	São José de Piranhas/PB	20.053	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Condado/PB	6.649	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Santa Cruz/PB	6.585	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	São José dos Ramos/PB	5.915	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Alto Parnaíba/MA	11.168	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Gonçalves Dias/MA	17.924	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Graça Aranha/MA	6.263	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Magalhães de Almeida/MA	19.620	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Mata Roma/MA	16.679	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Mirador/MA	21.000	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	São João dos Patos/MA	25.860	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES (2/2)

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

13/Dez/21
Status d+108

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.2	Tutóia/MA	58.311	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Belém/PB	17.640	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Bonito de Santa Fé/PB	11.797	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Cacimba de Dentro/PB	17.159	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Jericó/PB	7.732	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Livramento/PB	7.371	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Barreirinhas/MA	61.828	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Bananeiras/PB	21.210	Sim	Sim	Sim	Não	Inviável	Não	6	SIM	SIM
1.2	Marajá do Sena/MA	7.810	Sim	Sim	Sim	Não	Inviável	Não	3	SIM	SIM
1.2	Casserengue/PB	7.431	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Conceição/PB	18.904	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	6	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.2

13/Dez/21
Status d+108

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	MA	Anajatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	9	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Anajatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	11	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Itapecuru Mirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM	5	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	MA	Passagem Franca	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM	4	STM 9	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Alagoa Grande	TELEVISAO BORBOREMA S/A	19	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.2	PB	Alagoa Grande	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	33	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.2	PB	Areia	PABLO COMUNICACOES LTDA EPP	15	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Areia	TELEVISAO BORBOREMA SA	21	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Caaporã	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	46	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Conceição	SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME	32	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Conceição	F S M COMUNICACAO LTDA - EPP	38	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Coremas	FUNDACAO BRASIL ECOAR	26	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Cubati	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	10	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Imaculada	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA	13	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Ingá	FUNDACAO PADRE IBIAPINA	7	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	Itabaiana	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	13	STM 8	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	Juazeirinho	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	14	STM 5	STM 4	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P2 • CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.2

13/Dez/21
Status d+108

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	PB	Piancó	FUNDACAO BRASIL ECOAR	29	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Picuí	FUNDACAO BRASIL ECOAR	21	STM 5	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Picuí	TELEVISAO BORBOREMA S/A	22	STM 5	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Princesa Isabel	TELEVISAO BORBOREMA S/A	14	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Queimadas	FUNDACAO PEDRO AMERICO	8	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Queimadas	FUNDACAO BRASIL ECOAR	33	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Rio Tinto	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST MARISCHEN	30	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.2	PB	São Bento	FUNDACAO BRASIL ECOAR	25	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	São Bento	PRINTSTEL ENGENHARIA LTDA	48	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	São José de Piranhas	FUNDACAO BRASIL ECOAR	29	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Serra Branca	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA	4	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Serra Branca	TELEVISAO BORBOREMA S/A	14	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Teixeira	MUNICIPIO DE TEIXEIRA	8	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Condado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	10	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Malta	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA	5	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Santa Cruz	FUNDACAO BRASIL ECOAR	25	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	São José dos Ramos	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	16	STM 3	STM 2	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P3 • CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.2

13/Dez/21
Status d+108

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	MA	Alto Parnaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOE	Rádio Mirante do Maranl	8	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	MA	Barreirinhas	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO LTDA	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO L		11	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	MA	Coelho Neto	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO	SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA		5	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Coelho Neto	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOE	TV Itapicuru Ltda	12	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Itapecuru Mirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOE	Televisão Mirante Ltda	11	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	MA	Joselândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	TV Itapicuru Ltda	10	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lago do Junco	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTD		4	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lago do Junco	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOE	TV Itapicuru Ltda	9	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lago do Junco	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTD		13	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lima Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO L		7	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Presidente Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	TV Itapicuru Ltda	7	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	MA	Santo Antônio dos Lopes	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO L		10	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	São Domingos do Maranhão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANH	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	TV Itapicuru Ltda	8	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	São Domingos do Maranhão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANH	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTD		13	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Timbiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO L		11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTD		10	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOE	TV Itapicuru Ltda	13	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	Alagoa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA		11	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.2	PB	Areia	USINA SANTA MARIA SA	TELEVISAO PARAIBA LTDA		13	STM 10	STM 9	SIM	SIM
1.2	PB	Bananeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA	Rádio e Televisão Band	4	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Bananeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA		7	STM 6	STM 4	NÃO	SIM

P3 • CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.2

13/Dez/21
Status d+108

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	PB	Barra de Santa Rosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOE	TELEVISÃO PARAÍBA L	9	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Brejo do Cruz	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTD		9	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Dona Inês	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOE	TELEVISÃO CABO BRA	4	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Gurinhém	TELEVISAO BORBOREMA S/A	TELEVISAO BORBOREMA S/A	TELEVISÃO TAMBAÚ LT	4	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Ingá	PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA	TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTD		9	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	Itabaiana	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE ITAE	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTD		4	STM 8	STM 4	SIM	SIM
1.2	PB	Itabaiana	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE ITAE	TV OMEGA LTDA		8	STM 8	STM 4	SIM	SIM
1.2	PB	Itabaiana	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE ITAE	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA		11	STM 8	STM 4	SIM	SIM
1.2	PB	Juazeirinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO	TV OMEGA LTDA		10	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Mataraca	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTD		12	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Pocinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOE	TELEVISÃO PARAÍBA L	12	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Queimadas	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOE	TELEVISÃO PARAÍBA L	7	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Queimadas	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FI	TELEVISAO SUL BAHIA	40	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Remígio	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOE	TELEVISÃO PARAÍBA L	5	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Rio Tinto	AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOE	TELEVISÃO CABO BRA	7	STM 7	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	Rio Tinto	PRINTSTEL ENGENHARIA LTDA	FUNDACAO SECULO VINTE E UM		2	STM 7	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	São Bento	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FI	Tlevisão Sul Bahia de Te	40	STM 9	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Soledade	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	TELEVISAO PARAIBA LTDA		7	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Sumé	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME	TV OMEGA LTDA		11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Taperoá	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	TELEVISAO PARAIBA LTDA		13	STM 4	STM 3	NÃO	SIM

P4 • CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.2

13/Dez/21
Status d+108

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	PB	São José dos Ramos	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	16	STM 3	STM 1	SIM	SIM
1.2	PB	São José dos Ramos	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 1	SIM	SIM
1.2	PB	Serraria	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P5 • CANAIS PENDENTES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.2

13/Dez/21
Status d+108

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P6 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.2

13/Dez/21
Status d+108

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	MA	Anajatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	44	STM 5	SIM	SIM
1.2	MA	Anajatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	36	STM 5	SIM	SIM
1.2	MA	Areia	TELEVISAO PARAIBA LTDA	20	STM 10	SIM	SIM
1.2	MA	Areia	TELEVISAO PARAIBA LTDA	31	STM 10	SIM	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	TV MARANHAO CENTRAL LTDA	31	STM 9	SIM	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	TV MARANHAO CENTRAL LTDA	30	STM 9	SIM	SIM

ENTREGAS | FASE 1.2 (1/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

13/Dez/21

PARAÍBA (1/2)

94 municípios

INFRA		
Concluídos	Programadas	Com pendência
57	10	27

RF			
Concluídos	Em programação	Programadas	Pendência ou sem L20
0	0	12	82

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Água Branca	Concluído	29-nov-21	Sim	S/P	FR
Aguiar	Concluído	25-nov-21	Sim	--	18-jan-22
Alagoa Grande	Concluído	10-dez-21		S/P	P2 / P3 / FR
Alagoinha	Concluído	21-nov-21		S/P	FR
Alcantil	Concluído	12-dez-21		S/P	FR
Algodão de Jandaíra	Concluído	6-dez-21	Sim	S/P	FR
Araruna	Concluído	19-nov-21	Sim	S/P	FR
Areia	S/P	P2 / P3 / P6		S/P	P2 / P3 / P6 / FR
Aroeiras	Concluído	22-nov-21	Sim	S/P	FR
Bananeiras	S/P	P1		S/P	P3 / FR
Barra de Santa Rosa	Concluído	1-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Barra de Santana	Concluído	19-nov-21	Sim	S/P	FR
Belém	S/P	P1		S/P	FR
Boa Ventura	--	15-nov-21	Sim	S/P	FR
Bonito de Santa Fé	S/P	P1		S/P	FR
Brejo do Cruz	Concluído	4-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Caaporã	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Cacimba de Dentro	S/P	P1		S/P	FR
Camalaú	--	24-nov-21	Sim	S/P	FR
Casserengue	S/P	P1		S/P	FR
Catingueira	Concluído	9-dez-21	Sim	S/P	FR
Conceição	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Condado	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Coremas	Concluído	9-dez-21	Sim	S/P	P2 / FR

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Cubati	Concluído	9-dez-21	Sim	S/P	P2 / FR
Curral Velho	Concluído	30-nov-21	Sim	--	20-jan-22
Dona Inês	Concluído	8-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Duas Estradas	Concluído	18-nov-21		S/P	FR
Fagundes	PPTA	15-nov-21	Sim	S/P	FR
Frei Martinho	Concluído	30-nov-21	Sim	--	14-jan-22
Gado Bravo	Concluído	1-dez-21	Sim	S/P	FR
Gurinhém	Concluído	26-nov-21	Sim	S/P	P3 / FR
Gurjão	Concluído	5-dez-21	Sim	--	14-jan-22
Igaracy	Concluído	18-nov-21	Sim	S/P	FR
Imaculada	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Ingá	Concluído	19-nov-21		S/P	P2 / P3 / FR
Itabaiana	S/P	P2 / P3		S/P	P2 / P3 / FR
Itatuba	Concluído	29-nov-21	Sim	S/P	FR
Jericó	S/P	P1		S/P	FR
Juarez Távora	Concluído	20-nov-21	Sim	S/P	FR
Juazeirinho	Concluído	1-dez-21	Sim	S/P	P2 / P3 / FR
Junco do Seridó	Concluído	25-nov-21	Sim	S/P	FR
Juru	--	24-nov-21		S/P	FR
Lagoa	--	26-nov-21		S/P	FR
Lagoa de Dentro	Concluído	18-nov-21	Sim	S/P	FR
Livramento	S/P	P1		S/P	FR
Logradouro	Concluído	18-nov-21	Sim	S/P	FR
Malta	S/P	P1		S/P	P2 / FR

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.

ENTREGAS | FASE 1.2 (2/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

13/Dez/21

PARAÍBA (2/2)

94 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Mataraca	Concluído	4-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Matinhas	Concluído	4-dez-21	Sim	S/P	FR
Monte Horebe	Concluído	10-dez-21	Sim	--	17-jan-22
Ouro Velho	Concluído	29-nov-21	Sim	S/P	FR
Paulista	--	3-nov-21		S/P	FR
Piancó	--	6-dez-21	Sim	S/P	P2 / FR
Picuí	S/P	FQ		S/P	P2 / FR
Pilar	S/P	P1		S/P	FR
Pilões	Concluído	22-nov-21	Sim	--	14-jan-22
Pitimbu	E/P	FQ		S/P	FR
Pocinhos	Concluído	4-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Prata	Concluído	29-nov-21	Sim	--	21-jan-22
Princesa Isabel	Concluído	22-nov-21	Sim	S/P	P2 / FR
Queimadas	S/P	P2 / P3		S/P	P2 / P3 / FR
Remígio	Concluído	12-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Riachão	Concluído	21-nov-21		S/P	FR
Riacho dos Cavalos	--	27-nov-21		S/P	FR
Rio Tinto	Concluído	3-dez-21	Sim	S/P	P2 / P3 / FR
Salgadinho	Concluído	18-nov-21	Sim	--	14-jan-22
Salgado de São Félix	Concluído	12-dez-21	Sim	S/P	FR
Santa Cruz	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Santa Luzia	S/P	FQ		S/P	FR
Santa Teresinha	Concluído	21-nov-21	Sim	S/P	FR
Santana de Mangueira	Concluído	25-nov-21	Sim	--	19-jan-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Santo André	Concluído	29-nov-21		S/P	FR
São Bentinho	Concluído	12-dez-21	Sim	S/P	FR
São Bento	S/P	P2 / P3		S/P	P2 / P3 / FR
São Francisco	Concluído	10-dez-21	Sim	--	14-jan-22
São José da Lagoa Tapada	Concluído	21-nov-21	Sim	S/P	FR
São José de Piranhas	S/P	P1		S/P	P2 / FR
São José do Brejo do Cruz	Concluído	4-dez-21	Sim	S/P	FR
São José dos Ramos	S/P	P1		S/P	P2 / P4 / FR
São Mamede	--	6-dez-21	Sim	S/P	FR
São Sebastião do Umbuzeiro	Concluído	7-dez-21	Sim	--	22-jan-22
São Vicente do Seridó	Concluído	27-nov-21	Sim	S/P	FR
Serra Branca	--	13-dez-21		S/P	P2 / FR
Serra Grande	S/P	P1		S/P	FR
Serraria	Concluído	29-nov-21	Sim	S/P	P2 / P4 / FR
Sertãozinho	S/P	P1		S/P	FR
Soledade	Concluído	1-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Sumé	S/P	FQ		S/P	FR
Tacima	Concluído	20-nov-21		S/P	FR
Taperoá	Concluído	5-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Teixeira	E/P	FQ		S/P	P2 / FR
Uiraúna	Concluído	10-dez-21		S/P	FR
Vista Serrana	Concluído	7-dez-21	Sim	--	14-jan-22

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.

ENTREGAS | FASE 1.2 (3/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

13/Dez/21

MARANHÃO (1/2)

67 municípios

INFRA		
Concluídos	Programadas	Com pendência
21	36	10

RF			
Concluídos	Em programação	Programadas	Pendência ou sem L20
0	0	1	66

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Altamira do Maranhão	--	23-nov-21		S/P	FR
Alto Parnaíba	P1	24-nov-21		S/P	P3 / FR
Anajatuba	P6	24-nov-21		S/P	P2 / P6 / FR
Araguanã	--	25-nov-21		S/P	FR
Arari	--	25-nov-21		S/P	FR
Axixá	--	24-nov-21		S/P	FR
Barão de Grajaú	Concluído	8-dez-21		S/P	FR
Barreirinhas	S/P	P1		S/P	P3 / FR
Bequimão	--	25-nov-21		S/P	FR
Buriticupu	PPTA	25-nov-21		S/P	FR
Cajapió	--	26-nov-21		S/P	FR
Campestre do Maranhão	--	26-nov-21		S/P	FR
Cedral	Concluído	18-nov-21	Sim	S/P	FR
Centro do Guilherme	Concluído	28-nov-21	Sim	S/P	FR
Coelho Neto	--	6-dez-21		S/P	P3 / FR
Conceição do Lago-Açu	PPTA	6-dez-21		S/P	FR
Cururupu	Concluído	29-nov-21	Sim	S/P	FR
Gonçalves Dias	S/P	P1		S/P	FR
Governador Archer	Concluído	7-dez-21	Sim	S/P	FR
Governador Luiz Rocha	--	7-dez-21		S/P	FR
Guimarães	--	7-dez-21		S/P	FR
Humberto de Campos	Concluído	14-nov-21	Sim	S/P	FR
Itapecuru Mirim	--	30-jan-22		S/P	P2 / P3 / FR

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Joselândia	--	7-dez-21		S/P	P3 / FR
Lago do Junco	Concluído	6-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Lago dos Rodrigues	--	7-dez-21		S/P	FR
Lagoa Grande do Maranhão	--	20-dez-21		S/P	FR
Lima Campos	--	20-dez-21		S/P	P3 / FR
Magalhães de Almeida	S/P	P1		S/P	FR
Marajá do Sena	S/P	P1		S/P	FR
Maranhãozinho	--	20-dez-21	Sim	S/P	FR
Mata Roma	S/P	P1		S/P	FR
Mirador	S/P	P1		S/P	FR
Miranda do Norte	Concluído	28-nov-21		S/P	FR
Mirinzal	--	30-jan-22		S/P	FR
Montes Altos	--	20-dez-21		S/P	FR
Morros	PPTA	20-dez-21		S/P	FR
Nina Rodrigues	Concluído	18-nov-21	Sim	S/P	FR
Nova Olinda do Maranhão	--	20-dez-21		S/P	FR
Olinda Nova do Maranhão	--	20-dez-21		S/P	FR
Palmeirândia	Concluído	25-nov-21		S/P	FR
Passagem Franca	--	21-dez-21		S/P	P2 / FR
Paulo Ramos	Concluído	9-dez-21		S/P	FR
Peri Mirim	Concluído	27-nov-21		S/P	FR
Presidente Dutra	Concluído	7-dez-21		S/P	P3 / FR
Presidente Juscelino	Concluído	21-nov-21	Sim	S/P	FR

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.

ENTREGAS | FASE 1.2 (4/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

13/Dez/21

MARANHÃO (2/2)

67 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Presidente Vargas	--	21-dez-21		S/P	FR
Primeira Cruz	Concluído	18-nov-21	Sim	S/P	FR
Santa Luzia	--	21-dez-21		S/P	FR
Santo Antônio dos Lopes	--	21-dez-21		S/P	P3 / FR
São Benedito do Rio Preto	Concluído	27-nov-21		S/P	FR
São Domingos do Maranhão	--	21-dez-21		S/P	P3 / FR
São João Batista	Concluído	28-nov-21	Sim	S/P	FR
São João do Carú	--	21-dez-21		S/P	FR
São João dos Patos	S/P	P1		S/P	FR
São José dos Basílios	Concluído	7-dez-21		S/P	FR
São Vicente Ferrer	--	30-jan-22		S/P	FR
Satubinha	--	30-jan-22		S/P	FR
Timbiras	--	30-jan-22		S/P	P3 / FR
Tutóia	S/P	P1		S/P	FR
Vitória do Mearim	S/P	P2 / P3 / P6		S/P	P2 / P3 / P6 / FR
Amapá do Maranhão	--	30-jan-22		S/P	FR
Graça Aranha	S/P	P1		S/P	FR
Junco do Maranhão	Concluído	9-dez-21	Sim	S/P	FR
Luís Domingues	Concluído	21-nov-21		S/P	FR
Presidente Médici	Concluído	26-nov-21	Sim	--	14-jan-22
Tufilândia	--	30-jan-22		S/P	FR

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.

FLUXO | FASE 1.3 | AL • BA • PE • SE

322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = d0

13/Dez/21
Status d+66

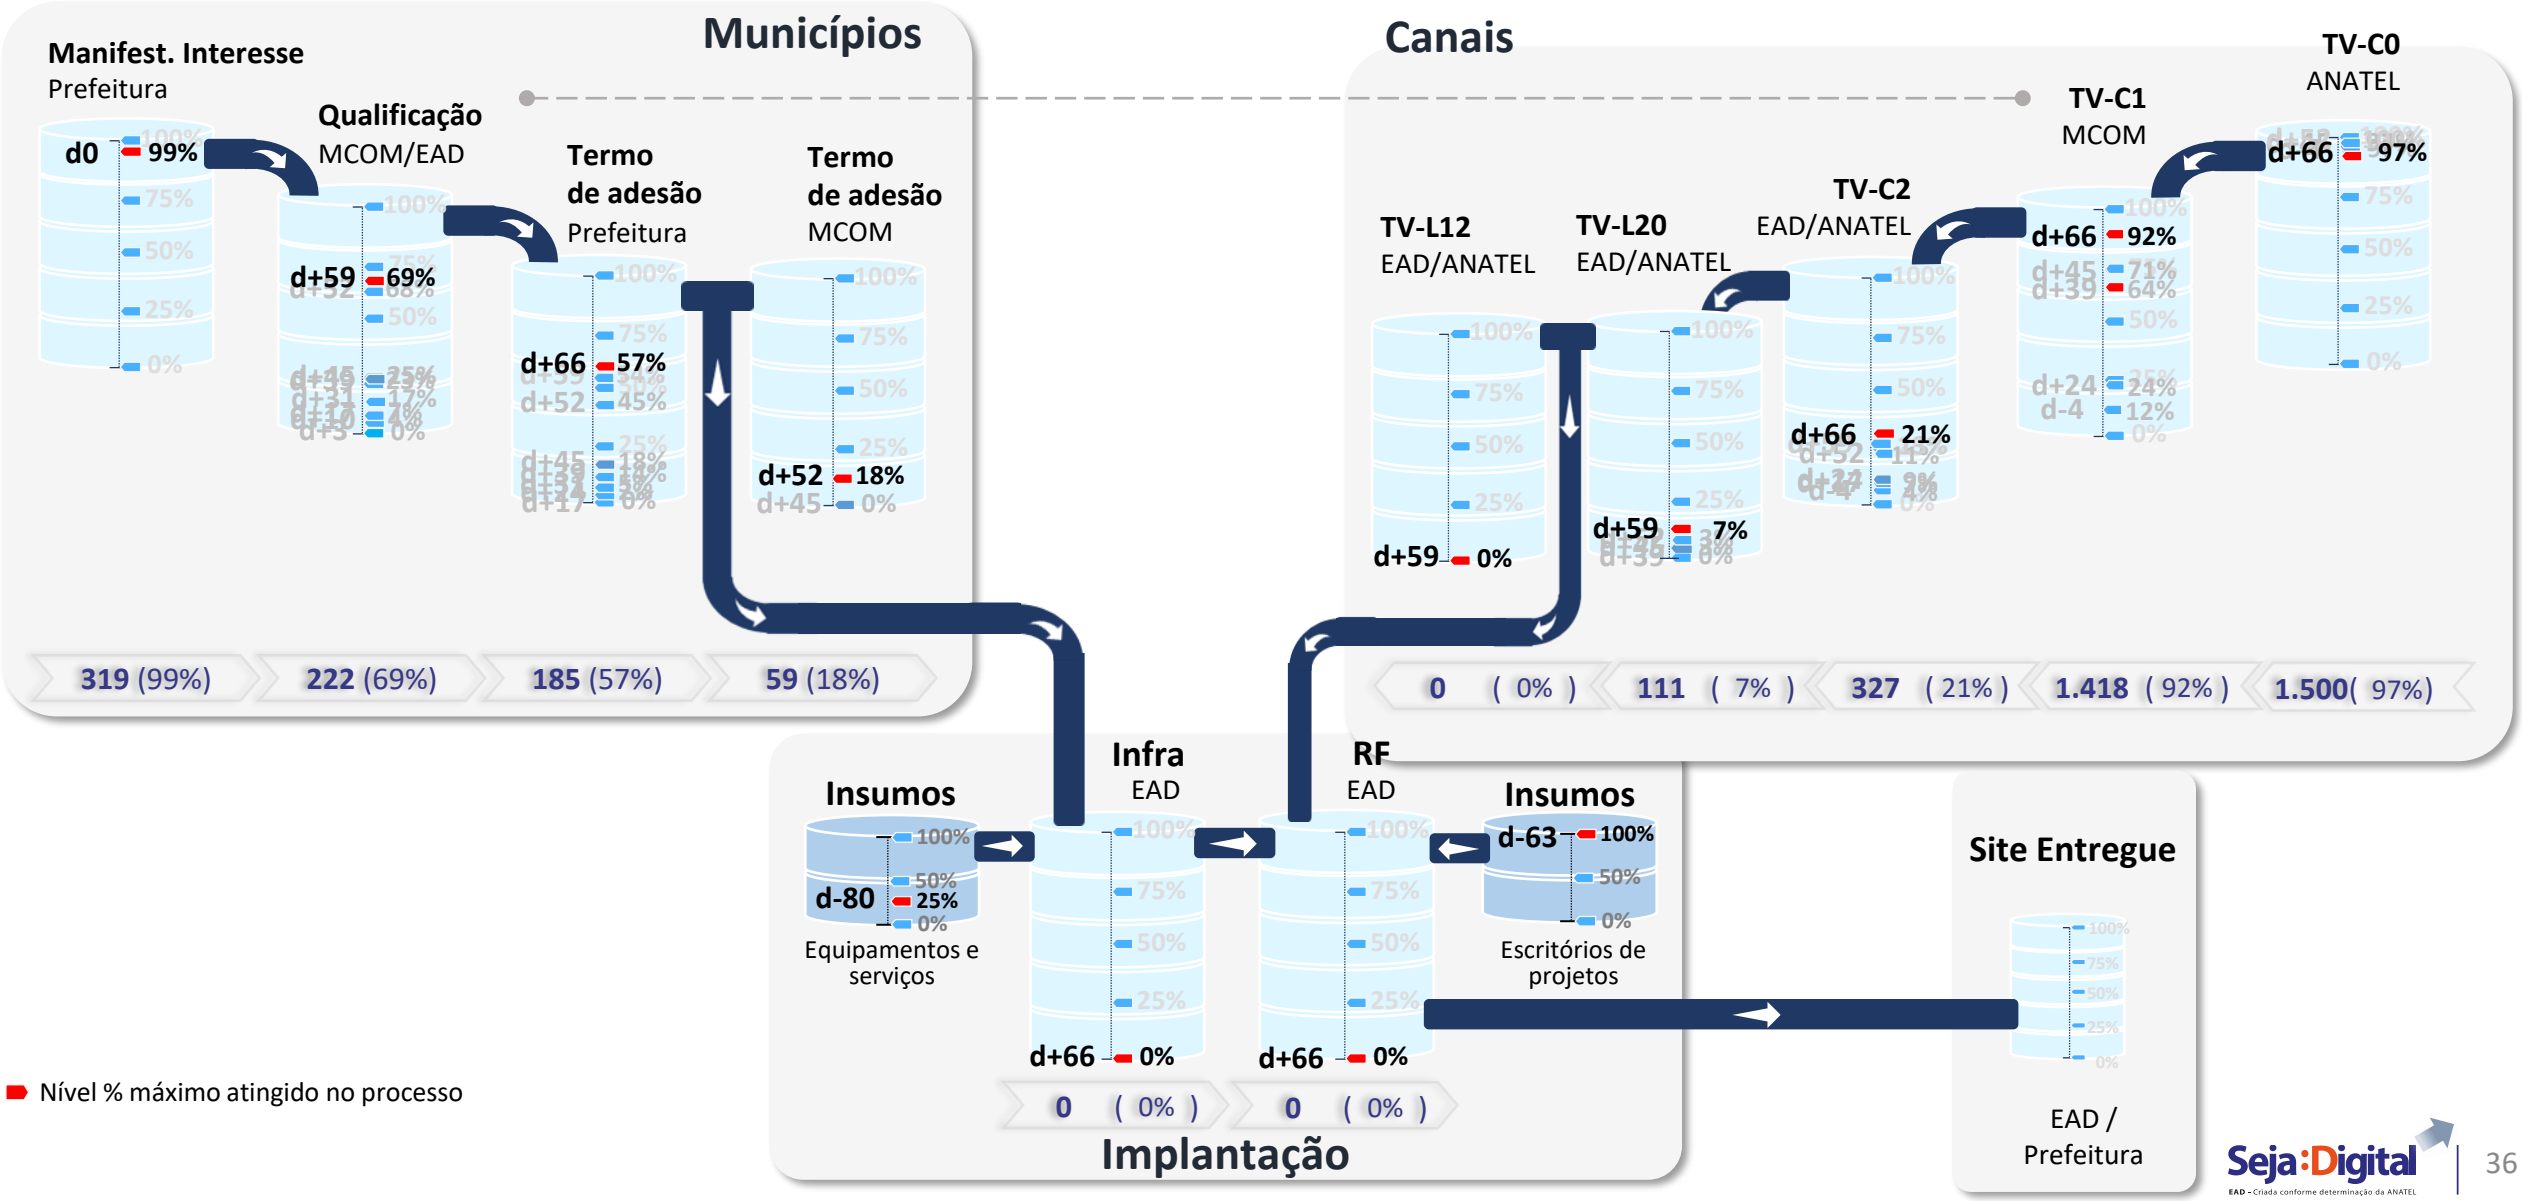

Nível % máximo atingido no processo

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRA EM 08/OUT/21 = d0

13/Dez/21
Status d+66

Manifestação de interesse da entidade

Entidade

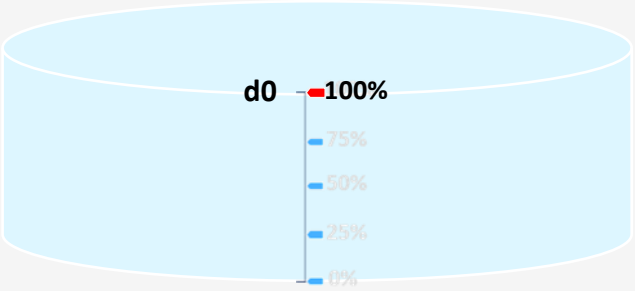

322 (100%)

VTA positiva da entidade manifestante

EAD

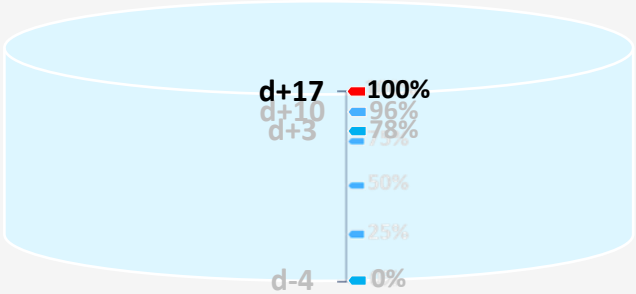

322 (100%)

Entidade manifestante qualificada

MCOM

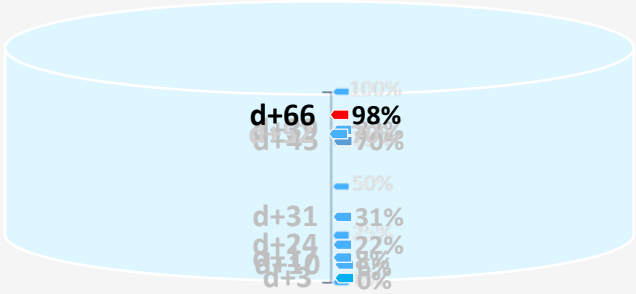

316 (98%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD

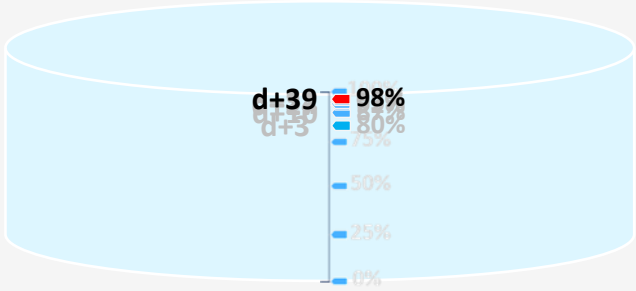

317 (98%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = d0

13/Dez/21
Status d+66

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.3	Craíbas/AL	24.129	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	4	SIM	SIM
1.3	Traipu/AL	27.632	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	4	SIM	SIM
1.3	Lajedo do Tabocal/BA	8.546	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.3	Dois Riachos/AL	11.054	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Olho d Água do Casado/AL	9.303	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Coaraci/BA	17.458	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Iguaracy/PE	12.209	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Jaqueira/PE	11.668	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Cafarnaum/BA	18.356	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.3

13/Dez/21
Status d+66

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	AL	Ibateguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA	2	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.3	AL	Murici	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	2	STM 8	STM 5	NÃO	SIM
1.3	AL	Murici	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	30	STM 8	STM 5	NÃO	SIM
1.3	AL	Passo de Camaragibe	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO CAMARAGIBE	2	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.3	AL	Piranhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	8	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.3	AL	São Luís do Quitunde	TVF COMUNICACOES LTDA - ME	30	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	AL	Viçosa	TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA	2	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	AL	Viçosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	9	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	BA	Alcobaça	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	10	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	BA	Cachoeira	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	13	STM 8	STM 7	NÃO	SIM
1.3	BA	Castro Alves	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES	9	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	BA	Pintadas	TELEVISAO BAHIA S.A.	11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.3	PE	Belém de Maria	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA	4	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.3	PE	Bom Conselho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	2	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.3	PE	Bom Conselho	ELO COMUNICACAO LTDA	28	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.3	PE	Cortês	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES	2	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.3	PE	Glória do Goitá	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	30	STM 8	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	16	STM 9	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	16	STM 9	STM 6	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P2 • CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.3

13/Dez/21
Status d+66

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	PE	Paudalho	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	27	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Triunfo	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A EP	7	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.3	PE	Triunfo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	8	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.3	PE	Vicência	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S. A. (GLO	50	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Carira	TELEVISAO ATALAIA LTDA	21	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	SE	Carmópolis	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	16	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.3	SE	Gararu	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	2	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	SE	Itabaianinha	TELEVISAO ATALAIA LTDA	17	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Itabaianinha	TELEVISAO FENIX LTDA	49	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Neópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS	2	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Poço Redondo	TELEVISAO ATALAIA LTDA	38	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Poço Redondo	TELEVISAO FENIX LTDA	43	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Poço Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE	4	STM 8	STM 7	NÃO	SIM
1.3	SE	Riachão do Dantas	MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS	11	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Riachão do Dantas	MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS	13	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Riachão do Dantas	TELEVISAO ATALAIA LTDA	23	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Simão Dias	TELEVISAO ATALAIA LTDA	39	STM 7	STM 5	NÃO	SIM
1.3	SE	Simão Dias	TELEVISAO FENIX LTDA	47	STM 7	STM 5	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P3 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.3

13/Dez/21
Status d+66

Temos 70 entidades com manifestação de interesse e sem qualificação, na Fase 1.3.

P4 • CANAIS PENDENTES (1/2)

SEM VIABILIDADE - FASE 1.3

13/Dez/21
Status d+66

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	AL	Igreja Nova	FUNDACAO BRASIL ECOAR	46	STM 8	STM 7	SIM	SIM
1.3	AL	Murici	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	47	STM 8	STM 5	NÃO	SIM
1.3	AL	São Luís do Quitunde	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	49	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	AL	Teotônio Vilela	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	27	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Barra de Guabiraba	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	PE	Belém de Maria	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.3	PE	Caetés	NOSSO LAR SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA-ME	41	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.3	PE	Caetés	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.3	PE	Glória do Goitá	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 8	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	TV NEWS - CANAL BRASILEIRO DE COMUNICACAO L	21	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	REDE 21 COMUNICACOES S.A.	32	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME	41	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	TELEVISAO CIDADE MODELO LTDA	42	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	FUNDACAO DE APOIO A GERACAO, PRODUCAO, CRI	43	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Ibirajuba	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Palmares	REDE 21 COMUNICACOES S.A.	32	STM 13	STM 10	SIM	SIM
1.3	PE	Palmares	SISTEMA ASSOCIADO DE COMUNICACAO S.A.	48	STM 13	STM 10	SIM	SIM
1.3	PE	Palmares	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 13	STM 10	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P4 • CANAIS PENDENTES (2/2)

SEM VIABILIDADE - FASE 1.3

13/Dez/21
Status d+66

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	16	STM 9	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	21	STM 9	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Passira	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	43	STM 9	STM 8	SIM	SIM
1.3	PE	Paudalho	FUNDACAO VICENTE CAMPELO	16	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Paudalho	SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME	34	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Paudalho	TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA	36	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Primavera	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 8	STM 7	SIM	SIM
1.3	PE	São Benedito do Sul	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	São José do Egito	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	19	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Vertente do Lério	REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA	13	STM 4	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Vertente do Lério	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 4	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Vertentes	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Vicência	FUNDACAO DE APOIO A GERACAO, PRODUCAO, CRI	15	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Itabaianinha	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Nossa Senhora das Dores	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	SE	Poço Redondo	RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	9	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Itabi	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P5 • CANAIS PENDENTES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.3

13/Dez/21
Status d+66

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P6 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.6

13/Dez/21
Status d+66

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	BA	Curaçá	TELEVISAO BAHIA S.A.	31	STM 5	SIM	SIM
1.3	BA	Curaçá	TELEVISAO BAHIA S.A.	30	STM 5	SIM	SIM
1.3	BA	Pintadas	TELEVISAO BAHIA S.A.	32	STM 4	SIM	SIM
1.3	BA	Pintadas	TELEVISAO BAHIA S.A.	32	STM 4	SIM	SIM
1.3	PE	Custódia	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	48	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Custódia	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	46	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Parnamirim	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	46	STM 7	SIM	SIM
1.3	PE	Parnamirim	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	48	STM 7	SIM	SIM

FLUXO | FASE 1.4 | MG

470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

13/Dez/21
Status d+32

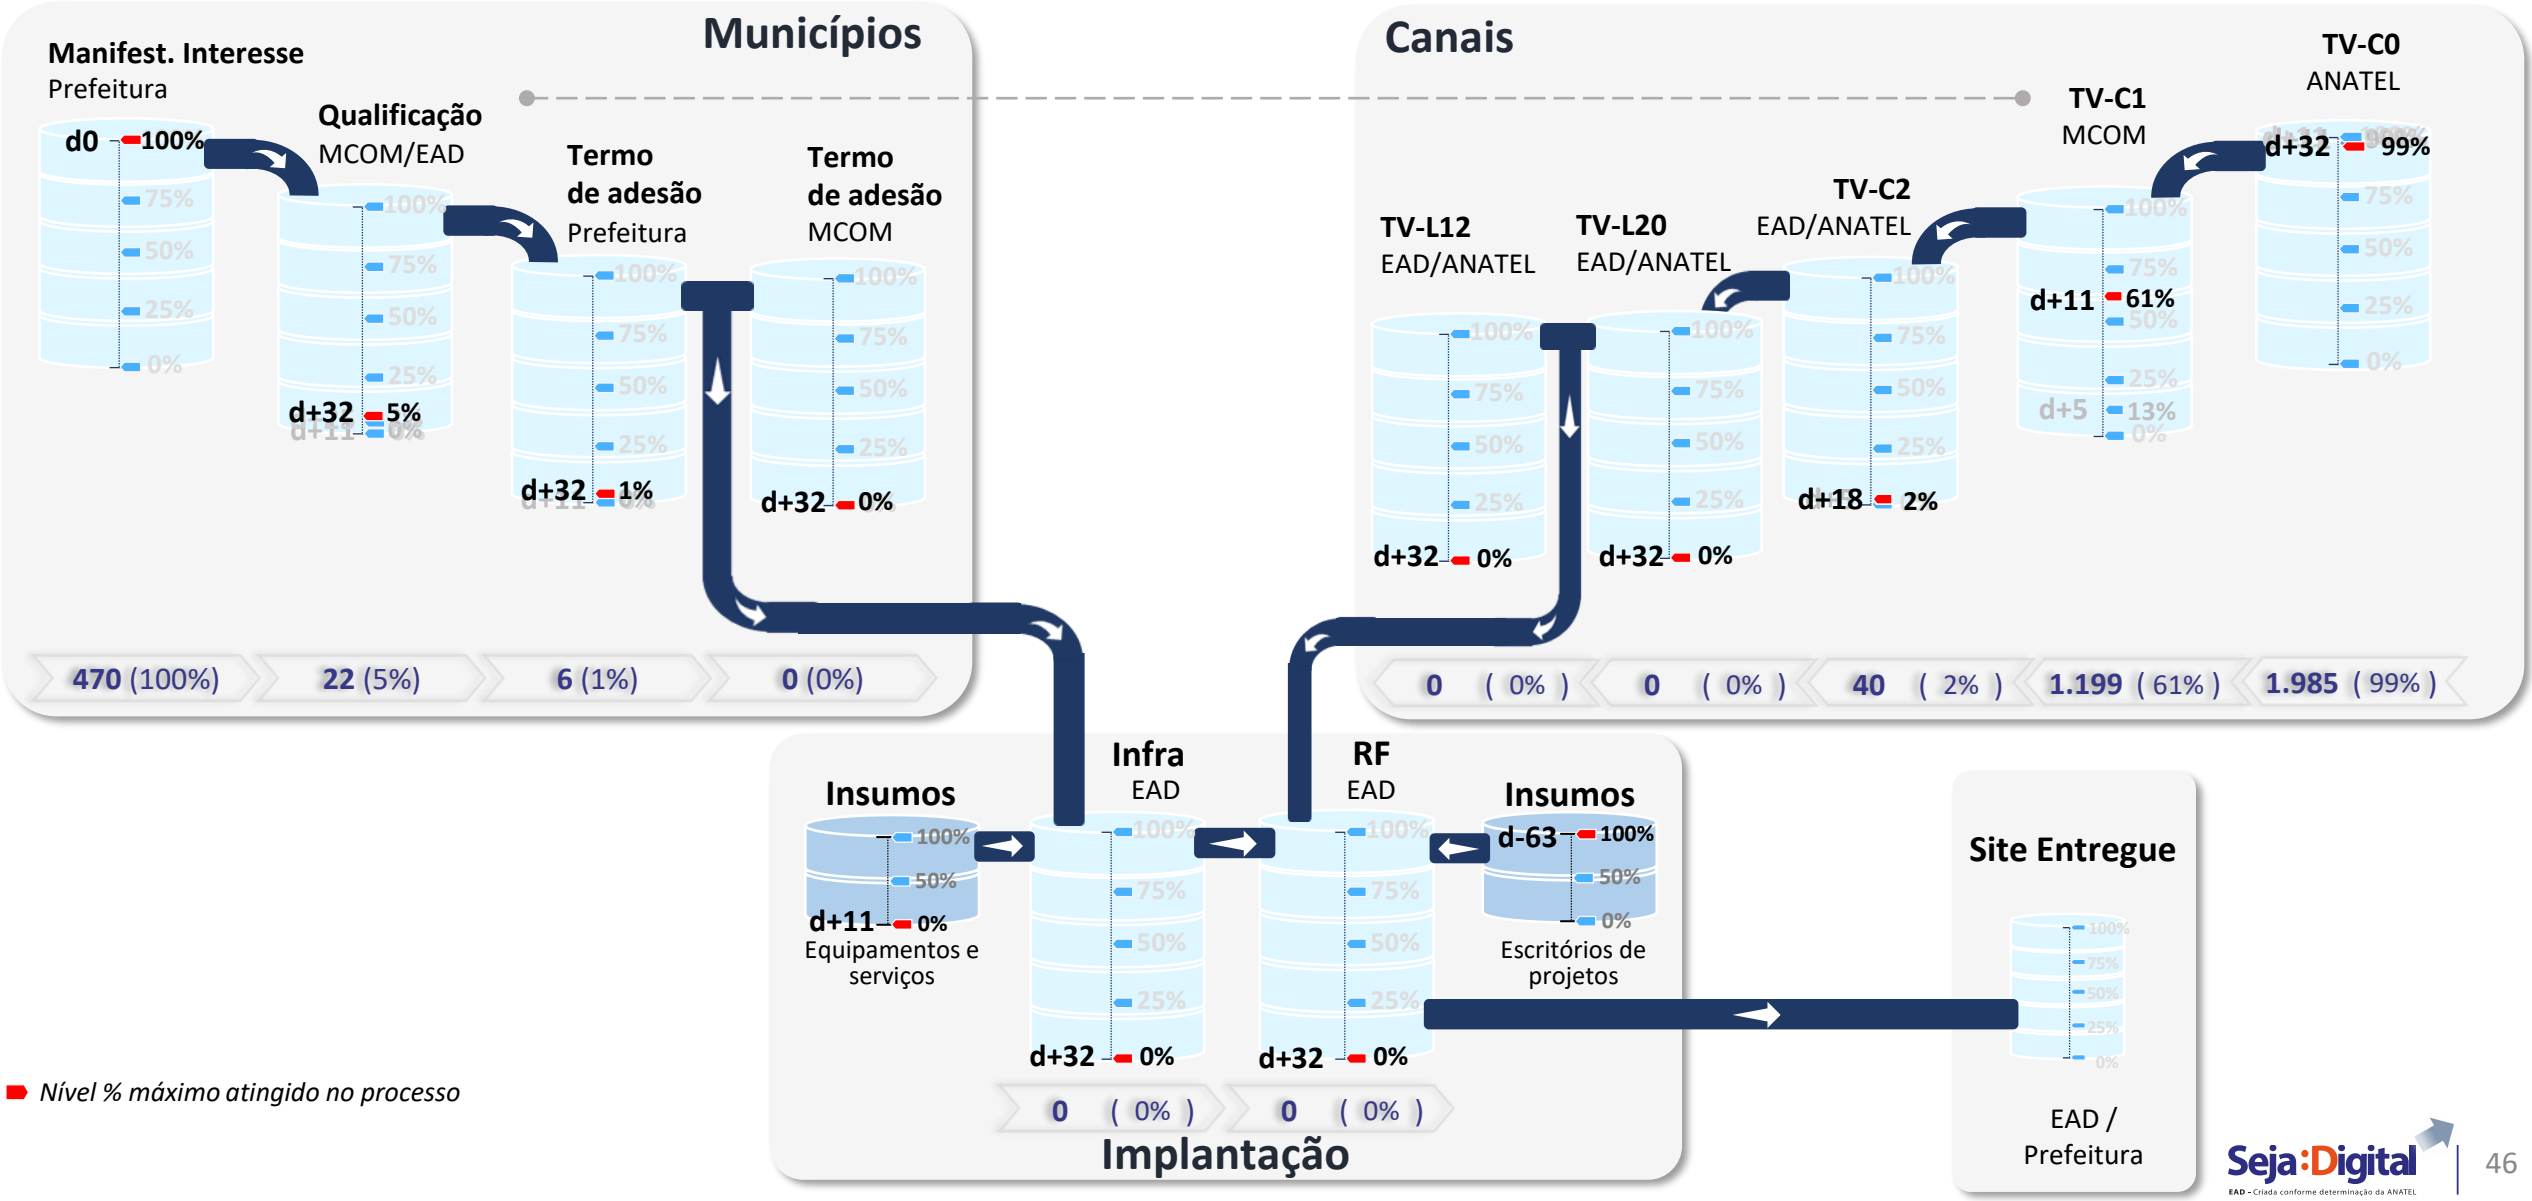

Nível % máximo atingido no processo

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRA EM 11/NOV/21 = d0

13/Dez/21
Status d+32

Manifestação de interesse da entidade
Entidade

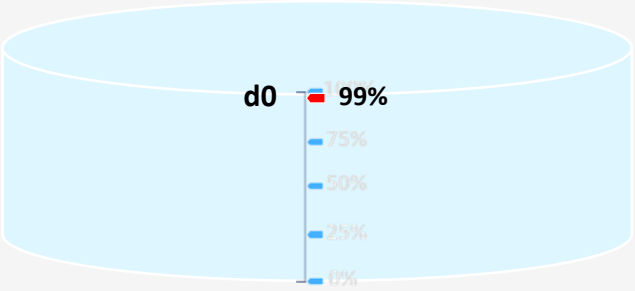

466 (99%)

VTA positiva da entidade manifestante
EAD

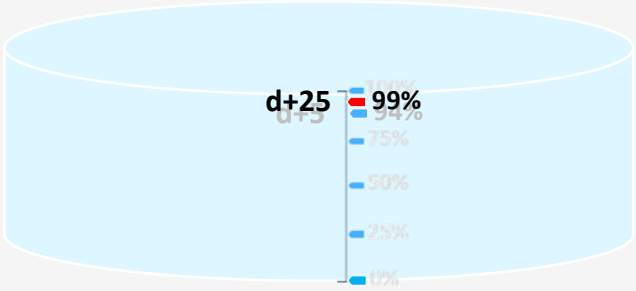

466 (99%)

Entidade manifestante qualificada
MCOM

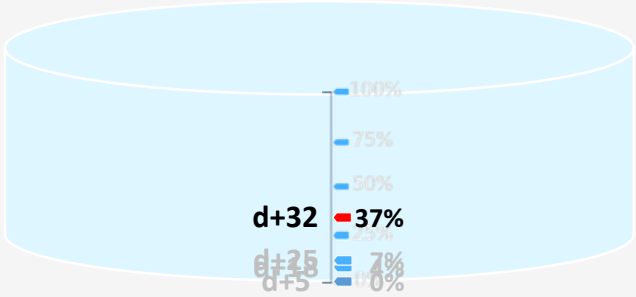

176 (37%)

Local Habilitado
Prefeitura / EAD

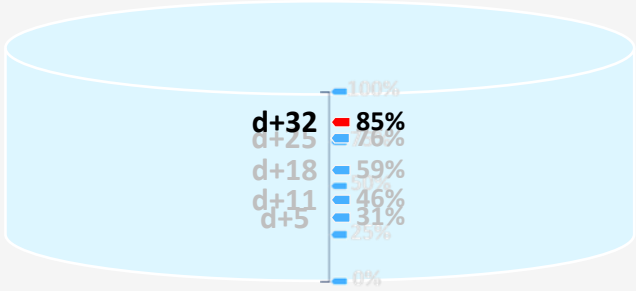

398 (85%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

13/Dez/21
Status d+32

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.4	Água Boa/MG	13.600	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	Pedras de Maria da Cruz/MG	11.453	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	São Romão/MG	12.139	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	Santo Antônio do Rio Abaixo/MG	1.770	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM

FLUXO TIPO

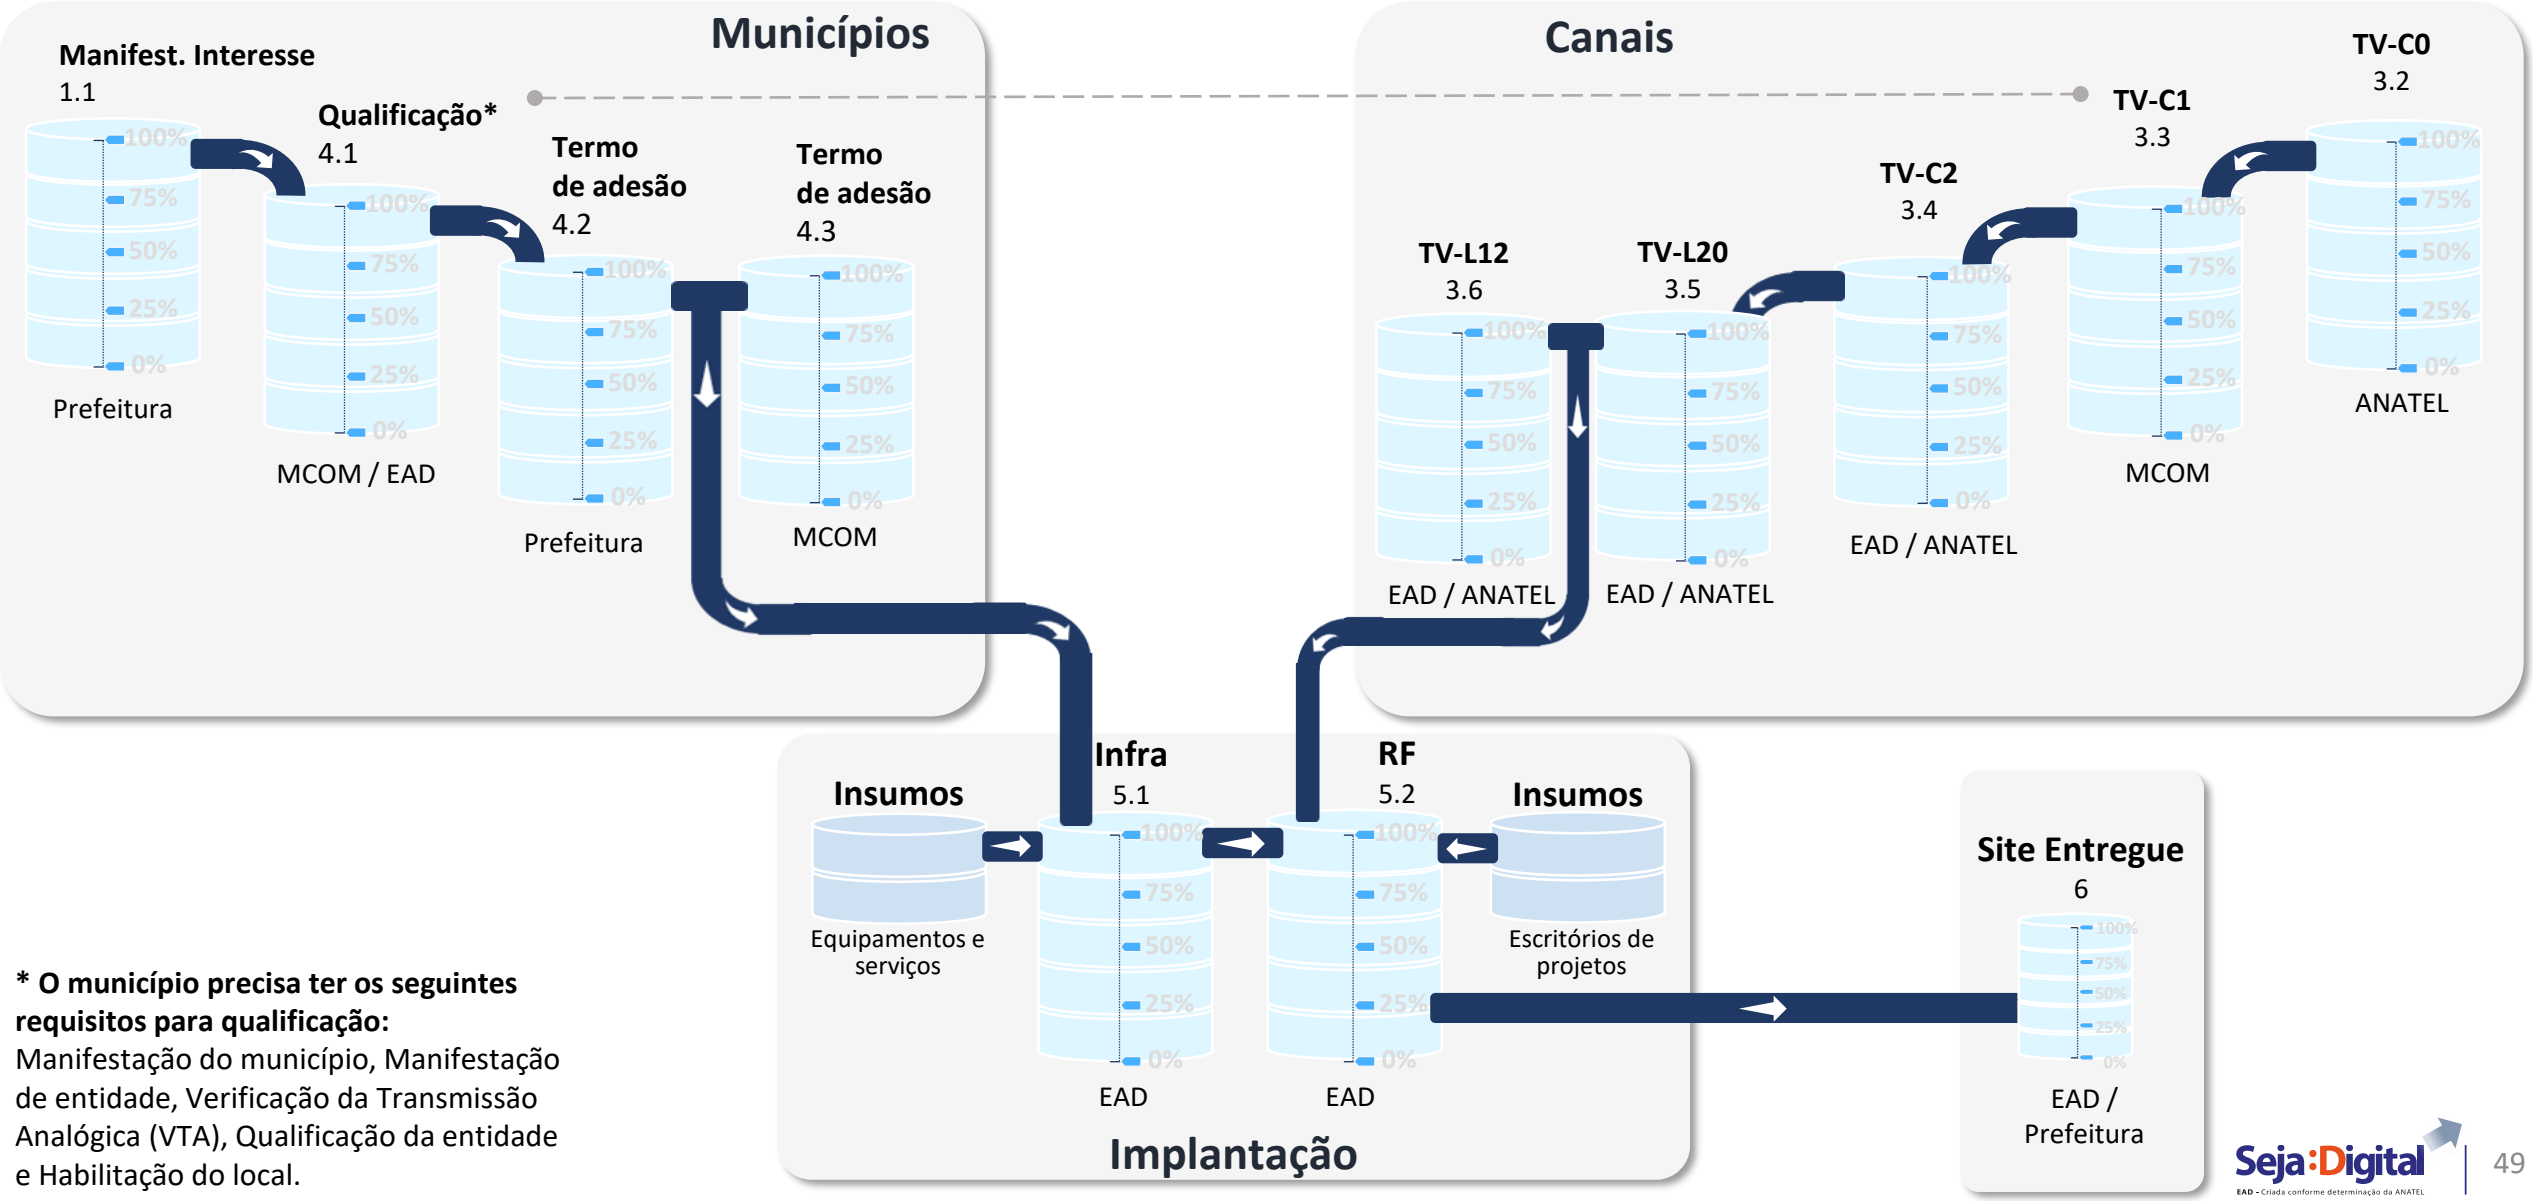

*** O município precisa ter os seguintes requisitos para qualificação:**
Manifestação do município, Manifestação de entidade, Verificação da Transmissão Analógica (VTA), Qualificação da entidade e Habilitação do local.

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

Manifestação de interesse da entidade
2.1

Entidade

VTA positiva da entidade manifestante
2.2

EAD

Entidade manifestante qualificada
2.3

MCOM

Local Habilitado
1.2

Prefeitura / EAD

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

ESTEIRA

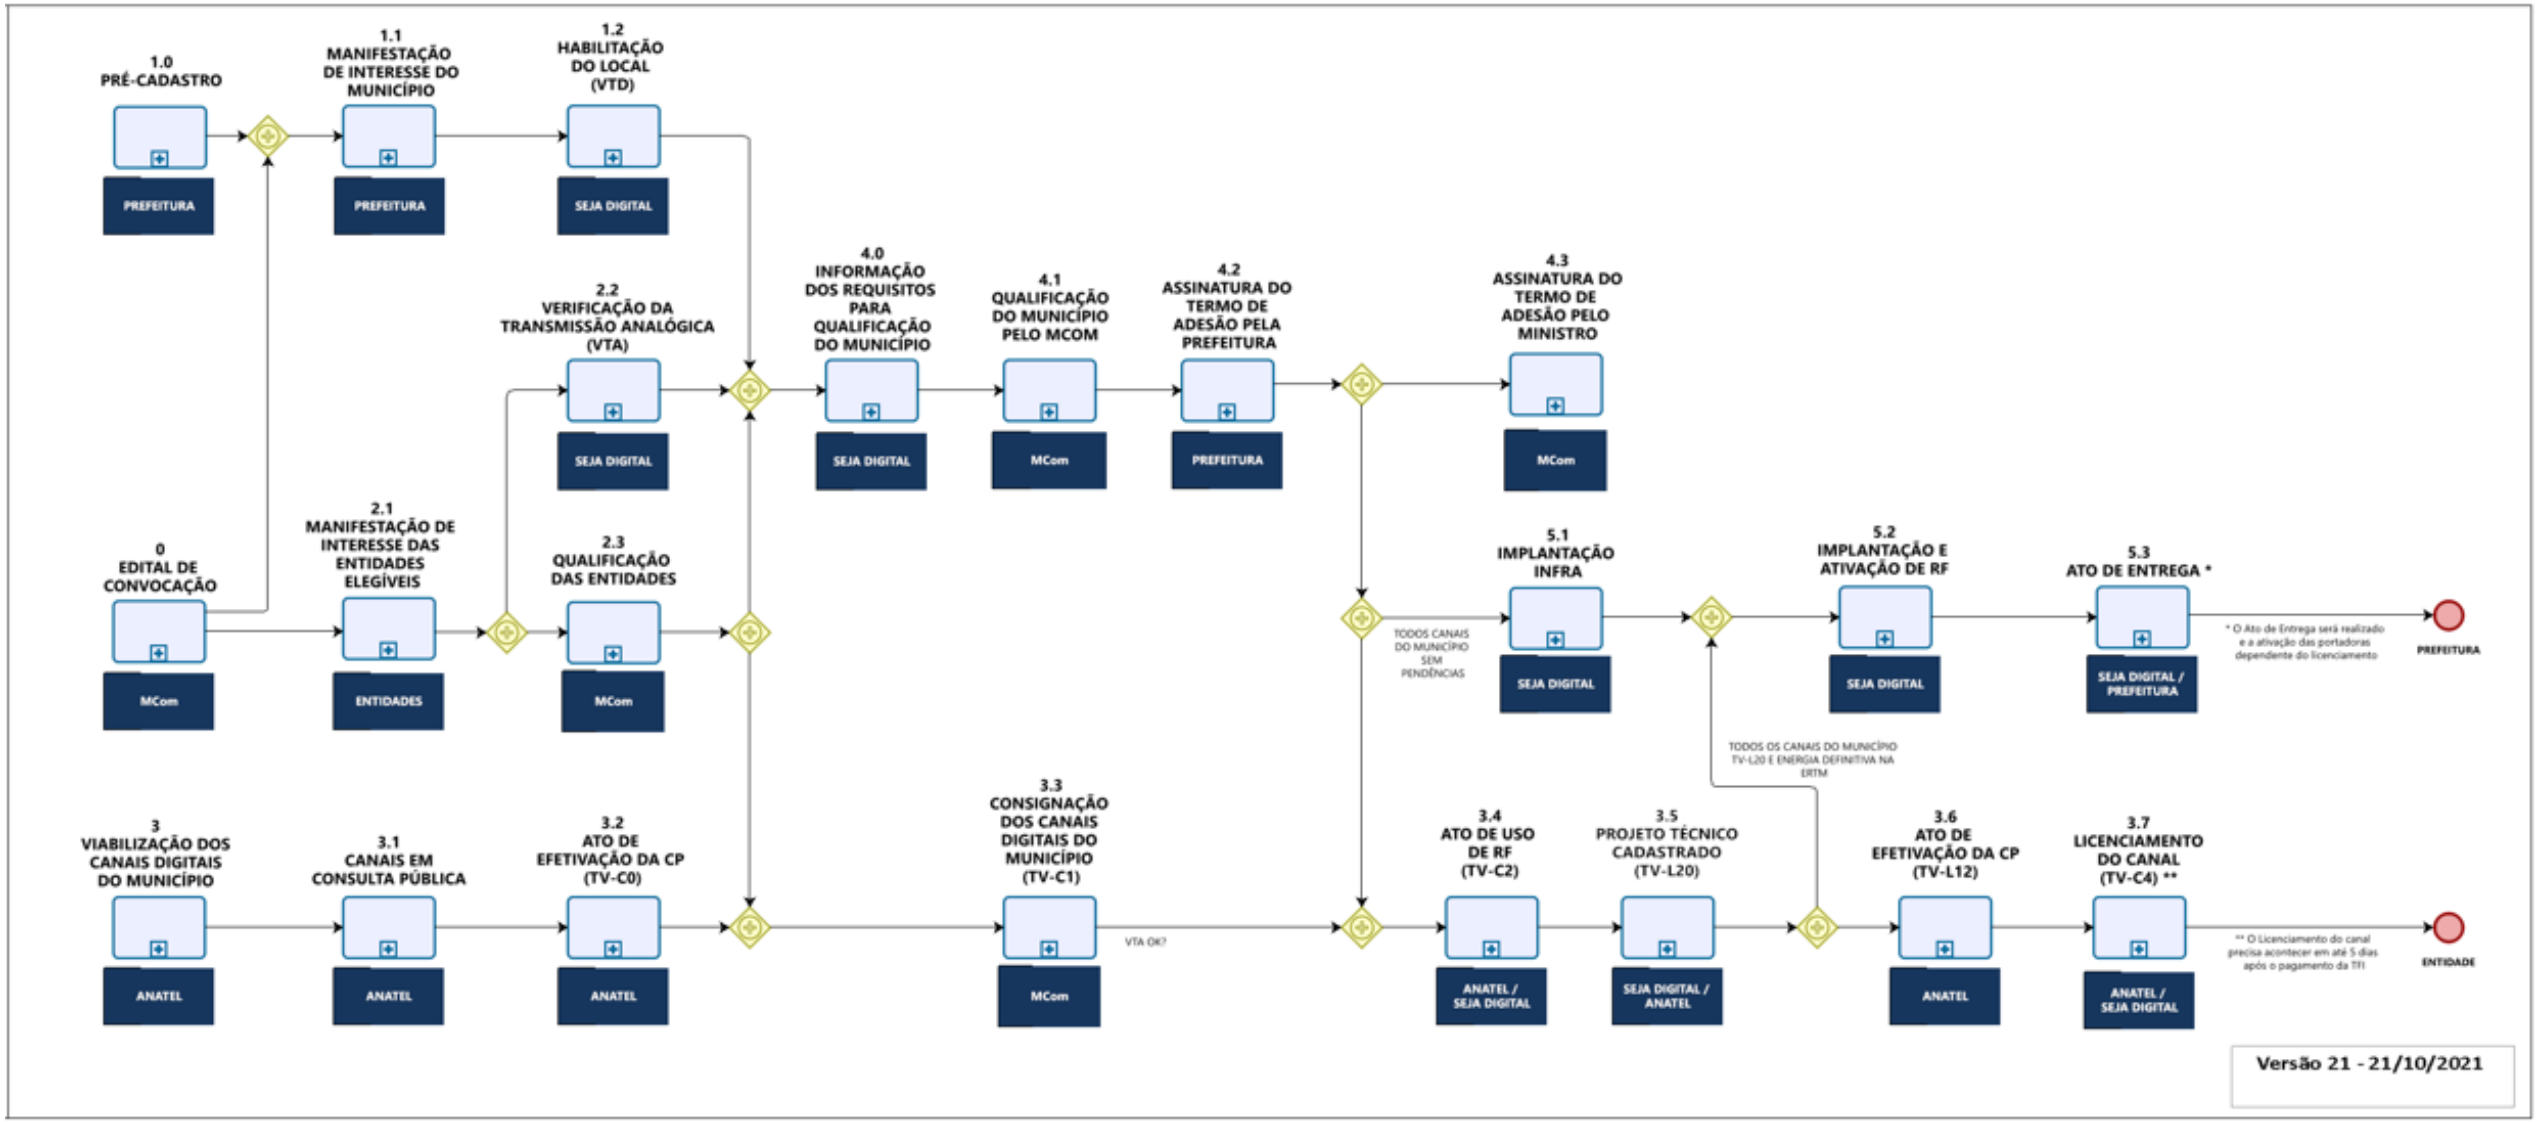
1.0
PRÉ-CADASTRO
PREFEITURA
1.1
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
PREFEITURA
1.2
HABILITAÇÃO DO LOCAL (VTD)
SEJA DIGITAL
0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
MCom
2.1
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DAS ENTIDADES ELEGÍVEIS
ENTIDADES
2.2
VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO ANALÓGICA (VTA)
SEJA DIGITAL
2.3
QUALIFICAÇÃO DAS ENTIDADES
MCom
4.0
INFORMAÇÃO DOS REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO
SEJA DIGITAL
4.1
QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO PELO MCOM
MCom
4.2
ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO PELA PREFEITURA
PREFEITURA
4.3
ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO PELO MINISTRO
MCom
TODOS CANAIS DO MUNICÍPIO SEM PENDÊNCIAS
5.1
IMPLANTAÇÃO INFRA
SEJA DIGITAL
5.2
IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DE RF
SEJA DIGITAL
5.3
ATO DE ENTREGA *
SEJA DIGITAL / PREFEITURA
* O Ato de Entrega será realizado e a ativação das portadoras dependente do licenciamento
PREFEITURA
TODOS OS CANAIS DO MUNICÍPIO TV-L20 E ENERGIA DEFINITIVA NA ERTM
3
VIABILIZAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO
ANATEL
3.1
CANAIS EM CONSULTA PÚBLICA
ANATEL
3.2
ATO DE EFETIVAÇÃO DA CP (TV-C0)
ANATEL
3.3
CONSIGNAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO (TV-C1)
MCom
VTA OK?
3.4
ATO DE USO DE RF (TV-C2)
ANATEL / SEJA DIGITAL
3.5
PROJETO TÉCNICO CADASTRADO (TV-L20)
SEJA DIGITAL / ANATEL
3.6
ATO DE EFETIVAÇÃO DA CP (TV-L12)
ANATEL
3.7
LICENCIAMENTO DO CANAL (TV-C4) **
ANATEL / SEJA DIGITAL
** O Licenciamento do canal precisa acontecer em até 5 dias após o pagamento da TFI
ENTIDADE
Versão 21 - 21/10/2021

Seja:Digital

EAD - Criada conforme determinação da ANATEL
