EAD
Criada conforme determinação da ANATEL

RELATÓRIO SEMANAL

17.Jan.22

VISÃO EXECUTIVA

FASES 1.1 E 1.2

17/Jan/22

		Acumulado dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	
INFRA	GIRED (Infra) - Fase 1.1 + 1.2	204	11			215
	Programado	204	21			225
	Realizado (Infra)	196	0	0	0	196
RF	GIRED (RF) - Fase 1.1 + 1.2	25	35	92	32	184
	Programado	25	35	92	55	207
	Realizado (RF)	25	3	0	0	28

	INFRA			RF			
	Realizado	Programada	Com pendência	Realizado	Programadas	Pendência ou sem L20	TOTAL
CE	45	3	0	13	32	3	48
PI	16	0	1	4	12	1	17
RN	27	2	3	11	18	3	32
PB	65	10	19	0	69	25	94
MA	43	14	10	0	48	19	67
TOTAL	196	29	33	28	179	51	258

Nota: a programação de RF não considera o status dos canais da TV Câmara.

Seja:Digital
EAD - Criada conforme determinação da ANATEL

VISÃO EXECUTIVA

FASES 1.3 E 1.4 – INFRAESTRUTURA

17/Jan/22

		Acumulado Dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total
Municípios com entidade elegível qualificada	Previsto	431	221	140											792
	Real	574	149												723
Fase 1.3	Previsto	281	41												322
	Real	311	0												311
Fase 1.4	Previsto	150	180	140											470
	Real	263	149												412
T.A. assinado	Previsto	200	220	232	140										792
	Real	420	152												572
Fase 1.3	Previsto	200	70	52											322
	Real	275	22												297
Fase 1.4	Previsto	0	150	180	140										470
	Real	145	130												275
Município com infra programável (TA-A & s/ P1-P6 & s/P2-P5 se especial)	Previsto	150	50	120	217	205	50								792
	Real	243	281												524
Fase 1.3	Previsto	150	50	70	52										322
	Real	243	30												273
Fase 1.4	Previsto	0	0	50	165	205	50								470
	Real	0	251												251
Infra concluída (TA + premissas)	Previsto				100	140	140	140	140	140	140	140	160	140	1.380
	Real														
Fase 1.3	Previsto				60	90	90	90							330
	Real														
Fase 1.4	Previsto				40	50	50	50	50	50	50	50	50		440
	Real														

VISÃO EXECUTIVA

FASES 1.3 E 1.4 – REGULATÓRIO

17/Jan/22

		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total
Todos os canais dos municípios em TV-C2 (municípios com infra planejada para conclusão)	Previsto		100	140	140	140	50	50	50	50	50			770
	Real	0												0
Fase 1.3	Previsto		60	90	90	90								330
	Real	0												0
Fase 1.4	Previsto		40	50	50	50	50	50	50	50	50			440
	Real	0												0
Todos os canais dos municípios em TV-L20 (municípios com infra concluída)	Previsto			100	140	140	140	50	50	50	50	50		770
	Real	0												0
Fase 1.3	Previsto			60	90	90	90							330
	Real	0												0
Fase 1.4	Previsto			40	50	50	50	50	50	50	50	50		440
	Real	0												0
Entrega (Infra + RF)	Previsto				100	140	140	140	50	50	50	50	50	770
	Real	0												0
Fase 1.3	Previsto				60	90	90	90						330
	Real	0												0
Fase 1.4	Previsto				40	50	50	50	50	50	50	50	50	440
	Real	0												0

ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

17/Jan/22

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

CEARÁ

48 municípios

INFRA		
Realizado	Programada	Com pendência
45	3	0

RF		
Realizado	Programadas	Pendência ou sem L20
13	32	3

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Abaiara	Realizado	11-nov-21	Sim	Realizado	2-dez-21
Aiuaba	Realizado	31-out-21	Sim	Realizado	6-dez-21
Alcântaras	Realizado	24-out-21	Sim	--	5-fev-22
Altaneira	Realizado	28-nov-21	Sim	Realizado	16-jan-22
Antonina do Norte	Realizado	10-nov-21	Sim	--	6-fev-22
Araripe	Realizado	31-out-21	Sim	--	31-jan-22
Aratuba	Realizado	10-nov-21	Sim	--	29-jan-22
Arneiroz	Realizado	5-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Assaré	Realizado	8-nov-21		--	5-fev-22
Baixio	Realizado	8-nov-21		--	28-fev-22
Capistrano	Realizado	10-nov-21	Sim	--	26-jan-22
Catarina	Realizado	11-nov-21		--	9-fev-22
Chaval	Realizado	15-out-21	Sim	--	6-fev-22
Choró	--	28-jan-22		--	28-fev-22
Farias Brito	Realizado	4-nov-21	Sim	--	29-jan-22
Fortim	Realizado	27-out-21	Sim	Realizado	8-dez-21
General Sampaio	Realizado	10-nov-21	Sim	--	31-jan-22
Granjeiro	Realizado	8-nov-21	Sim	Realizado	14-jan-22
Guaraciaba do Norte	Realizado	8-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Hidrolândia	--	28-jan-22		--	28-fev-22
Ibiapina	Realizado	23-out-21	Sim	Realizado	15-dez-21
Independência	Realizado	20-out-21	Sim	--	14-fev-22
Ipaumirim	Realizado	18-out-21		--	28-fev-22
Itaiçaba	Realizado	24-out-21	Sim	Realizado	7-dez-21

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Itapiúna	Realizado	12-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Itatira	Realizado	21-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Jaguaretama	Realizado	17-out-21	Sim	--	13-fev-22
Jaguaribara	Realizado	5-nov-21	Sim	Realizado	14-dez-21
Jati	Realizado	11-nov-21		--	26-jan-22
Lavras da Mangabeira	Realizado	9-nov-21	Sim	Realizado	3-dez-21
Meruoca	Realizado	27-nov-21	Sim	S/P	P6 / FR
Mulungu	Realizado	25-out-21	Sim	--	30-jan-22
Nova Russas	Realizado	23-out-21	Sim	S/P	P2 / P6 / FR
Novo Oriente	Realizado	5-nov-21	Sim	--	15-fev-22
Ocara	Realizado	12-nov-21		--	25-jan-22
Orós	Realizado	22-out-21		--	12-fev-22
Pacujá	Realizado	30-out-21		--	7-fev-22
Parambu	Realizado	12-nov-21	Sim	--	16-fev-22
Pedra Branca	--	31-jan-22		S/P	FR
Penaforte	Realizado	16-out-21	Sim	Realizado	30-nov-21
Pereiro	Realizado	15-out-21	Sim	Realizado	4-dez-21
Poranga	Realizado	22-out-21	Sim	--	9-fev-22
Porteiras	Realizado	22-out-21	Sim	Realizado	28-nov-21
Potengi	Realizado	29-out-21	Sim	--	31-jan-22
Saboeiro	Realizado	25-out-21	Sim	--	31-jan-22
Santana do Cariri	Realizado	5-nov-21		--	31-jan-22
São Luís do Curu	Realizado	12-nov-21		--	28-fev-22
Umari	Realizado	18-out-21	Sim	Realizado	17-dez-21

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

17/Jan/22

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

PIAUÍ

17 municípios

INFRA		
Realizado	Programada	Com pendência
16	0	1

RF		
Realizado	Programadas	Pendência ou sem L20
4	12	1

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Alto Longá	Realizado	23-out-21		--	30-jan-22
Avelino Lopes	Realizado	25-out-21	Sim	--	6-fev-22
Barro Duro	Realizado	22-out-21	Sim	--	31-jan-22
Beneditinos	Realizado	23-out-21	Sim	Realizado	17-dez-21
Bertolínia	Realizado	14-nov-21	Sim	--	12-fev-22
Capitão de Campos	Realizado	4-nov-21	Sim	Realizado	14-dez-21
Flores do Piauí	Realizado	21-out-21	Sim	--	7-fev-22
Fronteiras	Realizado	8-nov-21	Sim	--	15-fev-22
Gilbués	Realizado	19-out-21	Sim	Realizado	9-dez-21
Inhuma	S/P	P1		S/P	FR
Manoel Emídio	Realizado	17-nov-21	Sim	--	13-fev-22
Pedro II	Realizado	28-out-21	Sim	--	28-fev-22
Pio IX	Realizado	10-nov-21	Sim	--	14-fev-22
Porto	Realizado	4-nov-21	Sim	--	29-jan-22
Santa Filomena	Realizado	19-out-21	Sim	Realizado	10-dez-21
Simplício Mendes	Realizado	11-nov-21	Sim	--	31-jan-22
Várzea Grande	Realizado	8-nov-21	Sim	--	31-jan-22

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.1 + 1.1 Complemento

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

RIO GRANDE DO NORTE

32 municípios

INFRA		
Realizado	Programada	Com pendência
27	2	3

RF		
Realizado	Programadas	Pendência ou sem L20
11	18	3

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Alexandria	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	14-dez-21
Almino Afonso	--	14-jan-22		--	28-fev-22
Angicos	Realizado	27-out-21	Sim	--	6-fev-22
Augusto Severo	Realizado	29-out-21	Sim	--	9-fev-22
Baía Formosa	Realizado	12-nov-21	Sim	Realizado	18-dez-21
Barcelona	Realizado	12-nov-21		Realizado	16-jan-22
Bento Fernandes	Realizado	16-nov-21	Sim	Realizado	8-dez-21
Caiçara do Rio do Vento	Realizado	15-nov-21	Sim	--	31-jan-22
Canguaretama	Realizado	6-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Coronel João Pessoa	Realizado	31-out-21	Sim	Realizado	15-dez-21
Doutor Severiano	Realizado	29-out-21	Sim	--	14-fev-22
Frutuoso Gomes	S/P	P1		S/P	FR
Governador Dix-Sept Rosado	Realizado	31-out-21	Sim	--	28-fev-22
Guamaré	Realizado	4-dez-21		--	28-fev-22
Itaú	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Lagoa de Velhos	Realizado	17-nov-21	Sim	--	31-jan-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Lagoa Nova	S/P	P1		S/P	FR
Montanhas	--	31-jan-22		--	28-fev-22
Pedra Preta	Realizado	12-nov-21		--	31-jan-22
Pedro Avelino	Realizado	25-out-21	Sim	--	28-fev-22
Pedro Velho	Realizado	12-nov-21	Sim	--	7-fev-22
Portalegre	Realizado	31-out-21	Sim	--	13-fev-22
Rafael Fernandes	Realizado	11-nov-21	Sim	--	31-jan-22
Rafael Godeiro	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	15-dez-21
Santo Antônio	Realizado	10-nov-21	Sim	Realizado	17-dez-21
São Bento do Trairí	Realizado	25-nov-21	Sim	Realizado	10-dez-21
São João do Sabugi	Realizado	11-nov-21	Sim	--	15-fev-22
Serra Negra do Norte	Realizado	12-nov-21	Sim	Realizado	11-dez-21
Serrinha	Realizado	11-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Tenente Ananias	Realizado	2-mai-21	Sim	Realizado	7-mai-21
Touros	Realizado	9-nov-21	Sim	Realizado	26-nov-21
Umarizal	Realizado	30-out-21		--	28-fev-22

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.2 (1/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

PARAÍBA (1/2)

94 municípios

INFRA		
Realizado	Programada	Com pendência
65	10	19

RF		
Realizado	Programadas	Pendência ou sem L20
0	69	25

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Água Branca	Realizado	29-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Aguiar	Realizado	25-nov-21	Sim	--	18-jan-22
Alagoa Grande	Realizado	10-dez-21		--	28-fev-22
Alagoinha	Realizado	21-nov-21		--	31-mar-22
Alcantil	Realizado	12-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Algodão de Jandaíra	Realizado	6-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Araruna	Realizado	19-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Areia	S/P	P2 / P3 / P6		S/P	P2 / P3 / P6 / FR
Aroeiras	Realizado	22-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Bananeiras	S/P	P1		S/P	P3 / FR
Barra de Santa Rosa	Realizado	1-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Barra de Santana	Realizado	19-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Belém	S/P	P1		S/P	FR
Boa Ventura	Realizado	15-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Bonito de Santa Fé	S/P	P1		S/P	FR
Brejo do Cruz	Realizado	4-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Caaporã	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Cacimba de Dentro	S/P	P1		S/P	FR
Camalaú	Realizado	15-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Casserengue	S/P	P1		S/P	FR
Catingueira	Realizado	9-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Conceição	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Condado	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Coremas	Realizado	9-dez-21	Sim	--	31-mar-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Cubati	Realizado	9-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Curral Velho	Realizado	30-nov-21	Sim	--	20-jan-22
Dona Inês	Realizado	8-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Duas Estradas	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Fagundes	PPTA	15-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Frei Martinho	Realizado	30-nov-21	Sim	--	14-jan-22
Gado Bravo	Realizado	1-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Gurinhém	Realizado	26-nov-21	Sim	S/P	P3 / FR
Gurjão	Realizado	5-dez-21	Sim	--	14-jan-22
Igaracy	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Imaculada	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Ingá	Realizado	19-nov-21		--	31-mar-22
Itabaiana	--	31-jan-22		--	31-mar-22
Itatuba	Realizado	29-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Jericó	S/P	P1		S/P	FR
Juarez Távora	Realizado	20-nov-21	Sim	S/P	FR
Juazeirinho	Realizado	1-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Junco do Seridó	Realizado	25-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Juru	Realizado	27-dez-21		--	31-mar-22
Lagoa	Realizado	19-dez-21	Sim	--	31-mar-22
Lagoa de Dentro	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Livramento	S/P	P1		S/P	FR
Logradouro	Realizado	18-nov-21	Sim	--	31-mar-22
Malta	S/P	P1		S/P	P2 / FR

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.2 (2/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

PARAÍBA (2/2)

94 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Mataraca	Realizado	4-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Matinhas	Realizado	4-dez-21	Sim	S/P	FR
Monte Horebe	Realizado	10-dez-21	Sim	--	17-jan-22
Ouro Velho	Realizado	29-nov-21	Sim	S/P	FR
Paulista	Realizado	15-dez-21	Sim	S/P	FR
Piancó	Realizado	19-dez-21	Sim	S/P	P2 / FR
Picuí	--	28-jan-22		S/P	P2 / FR
Pilar	S/P	P1		S/P	FR
Pilões	Realizado	22-nov-21	Sim	--	14-jan-22
Pitimbu	--	28-jan-22		S/P	FR
Pocinhos	Realizado	4-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Prata	Realizado	29-nov-21	Sim	--	21-jan-22
Princesa Isabel	Realizado	22-nov-21	Sim	S/P	P2 / FR
Queimadas	--	31-jan-22		S/P	P2 / P3 / FR
Remígio	Realizado	12-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Riachão	Realizado	21-nov-21		S/P	FR
Riacho dos Cavalos	Realizado	19-dez-21		S/P	FR
Rio Tinto	Realizado	3-dez-21	Sim	S/P	P2 / P3 / FR
Salgadinho	Realizado	18-nov-21	Sim	--	14-jan-22
Salgado de São Félix	Realizado	12-dez-21	Sim	S/P	FR
Santa Cruz	S/P	P1		S/P	P2 / FR
Santa Luzia	--	28-jan-22		S/P	FR
Santa Teresinha	Realizado	21-nov-21	Sim	S/P	FR
Santana de Mangueira	Realizado	25-nov-21	Sim	--	19-jan-22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Santo André	Realizado	29-nov-21	Sim	S/P	FR
São Bentinho	Realizado	12-dez-21	Sim	S/P	FR
São Bento	--	31-jan-22		S/P	P2 / P3 / FR
São Francisco	Realizado	10-dez-21		--	14-jan-22
São José da Lagoa Tapada	Realizado	21-nov-21	Sim	S/P	FR
São José de Piranhas	S/P	P1		S/P	P2 / FR
São José do Brejo do Cruz	Realizado	4-dez-21		S/P	FR
São José dos Ramos	S/P	P1		S/P	P2 / P4 / FR
São Mamede	Realizado	19-dez-21	Sim	S/P	FR
São Sebastião do Umbuzeiro	Realizado	7-dez-21	Sim	--	22-jan-22
São Vicente do Seridó	Realizado	27-nov-21	Sim	S/P	FR
Serra Branca	--	13-dez-21		S/P	P2 / FR
Serra Grande	S/P	P1		S/P	FR
Serraria	Realizado	29-nov-21	Sim	S/P	P2 / P4 / FR
Sertãozinho	S/P	P1		S/P	FR
Soledade	Realizado	1-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Sumé	--	28-jan-22		S/P	FR
Tacima	Realizado	20-nov-21	Sim	S/P	FR
Taperoá	Realizado	5-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Teixeira	--	28-jan-22	Sim	S/P	P2 / FR
Uiraúna	Realizado	10-dez-21	Sim	S/P	FR
Vista Serrana	Realizado	7-dez-21	Sim	--	14-jan-22

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.2 (3/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MARANHÃO (1/2)

67 municípios

INFRA		
Realizado	Programada	Com pendência
43	14	10

RF		
Realizado	Programadas	Pendência ou sem L20
0	48	19

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Altamira do Maranhão	Realizado	18-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Alto Parnaíba	--	24-nov-21		--	28/02/22
Anajatuba	Realizado	19-dez-21	Sim	S/P	P2 / P6 / FR
Araguanã	Realizado	13-dez-21	Sim	--	28/02/22
Arari	Realizado	19-dez-21		S/P	FR
Axixá	Realizado	18-dez-21		--	28/02/22
Barão de Grajaú	Realizado	8-dez-21	Sim	--	28/02/22
Barreirinhas	S/P	P1		S/P	P3 / FR
Bequimão	Realizado	16-dez-21	Sim	--	28/02/22
Buriticupu	PPTA	25-nov-21		--	28/02/22
Cajapió	Realizado	13-dez-21		--	28/02/22
Campestre do Maranhão	Realizado	19-dez-21	Sim	--	28/02/22
Cedral	Realizado	18-nov-21	Sim	--	28/02/22
Centro do Guilherme	Realizado	28-nov-21	Sim	--	28/02/22
Coelho Neto	Realizado	29-dez-21	Sim	--	28/02/22
Conceição do Lago-Açu	PPTA	6-dez-21		--	28/02/22
Cururupu	Realizado	29-nov-21	Sim	--	28/02/22
Gonçalves Dias	S/P	P1		S/P	FR
Governador Archer	Realizado	7-dez-21	Sim	S/P	FR
Governador Luiz Rocha	PPTA	7-dez-21		--	28/02/22
Guimarães	Realizado	12-dez-21	Sim	--	28/02/22
Humberto de Campos	Realizado	14-nov-21	Sim	--	28/02/22
Itapecuru Mirim	Realizado	19-dez-21	Sim	--	28/02/22

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Joselândia	Realizado	26-dez-21		S/P	P3 / FR
Lago do Junco	Realizado	6-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Lago dos Rodrigues	Realizado	18-dez-21		--	28-fev-22
Lagoa Grande do Maranhão	Realizado	19-dez-21		--	28-fev-22
Lima Campos	Realizado	19-dez-21		--	28-fev-22
Magalhães de Almeida	S/P	P1		S/P	FR
Marajá do Sena	S/P	P1		S/P	FR
Maranhãozinho	Realizado	18-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Mata Roma	S/P	P1		S/P	FR
Mirador	S/P	P1		S/P	FR
Miranda do Norte	Realizado	28-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Mirinzal	--	30-jan-22		--	28-fev-22
Montes Altos	Realizado	26-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Morros	PPTA	20-dez-21		--	28-fev-22
Nina Rodrigues	Realizado	18-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Nova Olinda do Maranhão	Realizado	12-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Olinda Nova do Maranhão	Realizado	16-dez-21		S/P	FR
Palmeirândia	Realizado	25-nov-21		--	28-fev-22
Passagem Franca	--	21-dez-21	Sim	S/P	P2 / FR
Paulo Ramos	Realizado	9-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Peri Mirim	Realizado	27-nov-21		--	28-fev-22
Presidente Dutra	Realizado	7-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
Presidente Juscelino	Realizado	21-nov-21	Sim	--	28-fev-22

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.2 (4/4)

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MARANHÃO (2/2)

67 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Presidente Vargas	Realizado	18-dez-21		--	28-fev-22
Primeira Cruz	Realizado	18-nov-21	Sim	--	28-fev-22
Santa Luzia	Realizado	19-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Santo Antônio dos Lopes	--	21-dez-21		S/P	P3 / FR
São Benedito do Rio Preto	Realizado	27-nov-21	Sim	--	28-fev-22
São Domingos do Maranhão	--	21-dez-21	Sim	S/P	P3 / FR
São João Batista	Realizado	28-nov-21	Sim	--	28-fev-22
São João do Carú	--	21-dez-21	Sim	--	28-fev-22
São João dos Patos	S/P	P1		S/P	FR
São José dos Basílios	Realizado	7-dez-21		--	28-fev-22
São Vicente Ferrer	--	30-jan-22		--	28-fev-22
Satubinha	--	30-jan-22		--	28-fev-22
Timbiras	--	30-jan-22		--	28-fev-22
Tutóia	S/P	P1		S/P	FR
Vitória do Mearim	S/P	P2 / P3 / P6		S/P	P2 / P3 / P6 / FR
Amapá do Maranhão	Realizado	19-dez-21		--	28-fev-22
Graça Aranha	S/P	P1		S/P	FR
Junco do Maranhão	Realizado	9-dez-21	Sim	--	28-fev-22
Luís Domingues	Realizado	21-nov-21		--	28-fev-22
Presidente Médici	Realizado	26-nov-21	Sim	--	08/02/22
Tufilândia	--	30-jan-22		--	28-fev-22

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.3

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

PERNANBUCO (1/3)

124 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Afrânio	--	mai-22			
Agrestina	--	abr-22			
Água Preta	--	abr-22			
Águas Belas	--	mai-22			
Alagoinha	--	mai-22			
Aliança	--	abr-22			
Altinho					
Amaraji	--	abr-22			
Angelim	--	abr-22			
Araripina	--	mai-22			
Barra de Guabiraba	--	abr-22			
Barreiros					
Belém de Maria	--	abr-22			
Belém do São Francisco	--	mai-22			
Betânia	--	mai-22			
Bodocó	--	mai-22			
Bom Conselho					
Bonito	--	abr-22			
Brejão	--	mai-22			
Brejinho	--	mai-22			
Brejo da Madre de Deus					
Buíque	--	mai-22			
Cabrobó	--	mai-22			
Cachoeirinha	--	abr-22			
Caetés	--	mai-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Calçado	--	abr-22			
Camocim de São Félix	--	abr-22			
Canhotinho	--	abr-22			
Capoeiras	--	mai-22			
Carnaíba	--	mai-22			
Carnaubeira da Penha	--	mai-22			
Casinhas	--	abr-22			
Condado	--	abr-22			
Correntes	--	abr-22			
Cortês	--	abr-22			
Cumaru	--	abr-22			
Cupira	--	abr-22			
Custódia					
Exu	--	mai-22			
Feira Nova	--	abr-22			
Flores	--	mai-22			
Frei Miguelinho					
Gameleira	--	abr-22			
Glória do Goitá					
Gravatá					
Iati	--	mai-22			
Ibimirim	--	mai-22			
Ibirajuba	--	abr-22			
Iguaracy					
Inajá	--	mai-22			

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.3

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

PERNANBUCO (2/3)

124 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Ipubi					
Itaíba	--	mai-22			
Itapetim	--	mai-22			
Jaqueira					
Jataúba	--	mai-22			
Jatobá	--	mai-22			
João Alfredo					
Joaquim Nabuco	--	abr-22			
Jucati	--	abr-22			
Jupi	--	abr-22			
Jurema	--	abr-22			
Lagoa de Itaenga	--	abr-22			
Lagoa do Ouro	--	abr-22			
Lagoa dos Gatos	--	abr-22			
Lagoa Grande	--	mai-22			
Lajedo	--	abr-22			
Manari	--	mai-22			
Maraial	--	abr-22			
Mirandiba	--	mai-22			
Orobó	--	abr-22			
Ouricuri	--	mai-22			
Palmares					
Palmeirina	--	abr-22			
Panelas					
Paranatama	--	mai-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Parnamirim					
Passira					
Paudalho					
Pedra	--	mai-22			
Petrolândia	--	mai-22			
Poção	--	mai-22			
Pombos	--	abr-22			
Primavera					
Quipapá	--	abr-22			
Riacho das Almas	--	abr-22			
Ribeirão	--	abr-22			
Rio Formoso	--	abr-22			
Sairé	--	abr-22			
Salgueiro	--	mai-22			
Saloá	--	mai-22			
Sanharó	--	abr-22			
Santa Cruz da Baixa Verde	--	mai-22			
Santa Maria da Boa Vista	--	mai-22			
Santa Maria do Cambucá	--	abr-22			
Santa Terezinha	--	mai-22			
São Benedito do Sul	--	abr-22			
São Bento do Una					
São João	--	abr-22			
São Joaquim do Monte	--	abr-22			
São José da Coroa Grande	--	abr-22			

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.3

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

PERNANBUCO (3/3)

124 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
São José do Belmonte	--	mai-22			
São José do Egito					
Serra Talhada					
Sertânia	--	mai-22			
Surubim	--	abr-22			
Tabira	--	mai-22			
Tacaimbó					
Tacaratu	--	mai-22			
Terezinha	--	mai-22			
Toritama	--	abr-22			
Trindade	--	mai-22			
Triunfo	--	mai-22			
Tupanatinga	--	mai-22			
Tuparetama	--	mai-22			
Venturosa	--	mai-22			
Verdejante	--	mai-22			
Vertente do Lério	--	abr-22			
Vertentes	--	abr-22			
Vicência					
Xexéu	--	abr-22			
Calumbi	--	mai-22			
Ingazeira	--	mai-22			
Itacuruba	--	mai-22			
Solidão	--	mai-22			

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MINAS GERAIS (1/10)

470 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Abadia dos Dourados	--	mai-22			
Abaeté	--	mar-22			
Abre Campo					
Acaiaca	--	fev-22			
Água Boa					
Águas Vermelhas					
Aimorés	--	fev-22			
Aiuruoca	--	abr-22			
Albertina	--	fev-22			
Além Paraíba	--	fev-22			
Alfredo Vasconcelos	--	mar-22			
Alto Caparaó	--	fev-22			
Alto Jequitibá	--	fev-22			
Alto Rio Doce	--	fev-22			
Alvarenga	--	fev-22			
Alvinópolis	--	mar-22			
Alvorada de Minas	--	mar-22			
Amparo do Serra	--	fev-22			
Antônio Dias					
Antônio Prado de Minas					
Aracitaba	--	abr-22			
Arantina					
Araponga					
Arapuá					
Araújos	--	fev-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Arceburgo	--	fev-22			
Areado	--	fev-22			
Argirita	--	fev-22			
Astolfo Dutra	--	fev-22			
Ataléia	--	mar-22			
Augusto de Lima	--	mar-22			
Baependi					
Bandeira					
Bandeira do Sul	--	fev-22			
Barra Longa	--	fev-22			
Bela Vista de Minas	--	mar-22			
Belmiro Braga	--	abr-22			
Belo Oriente	--	mar-22			
Berilo	--	mar-22			
Berizal	--	mar-22			
Bertópolis	--	mar-22			
Bias Fortes	--	fev-22			
Bicas	--	fev-22			
Boa Esperança	--	fev-22			
Bom Despacho					
Bom Jardim de Minas					
Bom Jesus da Penha	--	fev-22			
Bom Jesus do Amparo					
Bom Repouso	--	fev-22			
Bom Sucesso	--	fev-22			

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MINAS GERAIS (2/10)

470 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Bonfinópolis de Minas	--	mar-22			
Bonito de Minas	--	mar-22			
Borda da Mata	--	fev-22			
Botumirim	--	mar-22			
Brás Pires	--	fev-22			
Brasilândia de Minas	--	mar-22			
Braúnas	--	mar-22			
Brazópolis	--	fev-22			
Bueno Brandão					
Buenópolis	--	mar-22			
Cabo Verde	--	fev-22			
Cachoeira de Minas	--	fev-22			
Cachoeira de Pajeú					
Cachoeira Dourada					
Cajuri					
Caldas					
Camanducaia	--	fev-22			
Cambuquira	--	fev-22			
Campanário	--	mar-22			
Campestre					
Campo do Meio	--	fev-22			
Campo Florido	--	mar-22			
Campos Altos					
Campos Gerais					
Cana Verde	--	fev-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Canaã	--	fev-22			
Candeias	--	fev-22			
Caparaó	--	fev-22			
Capetinga	--	fev-22			
Capinópolis					
Capitão Andrade	--	fev-22			
Capitólio					
Caputira					
Caraí					
Carandaí	--	mar-22			
Carangola	--	fev-22			
Carbonita					
Careaçu					
Carlos Chagas					
Carmo da Mata	--	fev-22			
Carmo de Minas					
Carmópolis de Minas	--	fev-22			
Carneirinho					
Carrancas					
Carvalhópolis					
Cascalho Rico					
Catas Altas da Noruega					
Catuti	--	mar-22			
Caxambu					
Cedro do Abaeté					

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MINAS GERAIS (3/10)

470 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Central de Minas					
Centralina					
Chácara	--	fev-22			
Chapada do Norte					
Chiador					
Cipotânea	--	fev-22			
Coimbra					
Coluna					
Comendador Gomes					
Comercinho					
Conceição da Aparecida					
Conceição das Pedras					
Conceição de Ipanema					
Conceição do Mato Dentro					
Conceição do Rio Verde					
Conceição dos Ouros					
Cônego Marinho	--	mar-22			
Congonhal					
Conselheiro Pena					
Coqueiral	--	fev-22			
Cordislândia					
Corinto	--	abr-22			
Coroaci	--	mar-22			
Coronel Murta	--	mar-22			
Coronel Pacheco	--	fev-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Córrego Danta					
Córrego do Bom Jesus					
Córrego Fundo	--	fev-22			
Córrego Novo					
Cristais					
Cristina					
Crucilândia	--	abr-22			
Cruzeiro da Fortaleza	--	mar-22			
Cruzília					
Curral de Dentro	--	mar-22			
Datas					
Delfim Moreira	--	abr-22			
Delfinópolis					
Delta	--	mar-22			
Descoberto	--	abr-22			
Desterro de Entre Rios					
Desterro do Melo					
Diogo de Vasconcelos					
Divinésia					
Divino					
Divino das Laranjeiras					
Divinolândia de Minas	--	abr-22			
Dom Joaquim					
Dom Viçoso					
Dona Eusébia					

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MINAS GERAIS (4/10)

470 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Dores de Guanhães					
Dores do Indaiá					
Dores do Turvo					
Doresópolis					
Douradoquara	--	mar-22			
Elói Mendes					
Engenheiro Caldas	--	fev-22			
Engenheiro Navarro	--	abr-22			
Entre Rios de Minas					
Ervália	--	fev-22			
Espera Feliz	--	fev-22			
Espinosa	--	abr-22			
Espírito Santo do Dourado	--	fev-22			
Estiva	--	fev-22			
Estrela Dalva					
Estrela do Sul					
Eugenópolis	--	fev-22			
Ewbank da Câmara					
Extrema					
Faria Lemos					
Felisburgo	--	abr-22			
Felixlândia	--	jun-22			
Fernandes Tourinho					
Formoso					
Fortaleza de Minas	--	mar-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Francisco Badaró	--	jun-22			
Francisco Sá	--	abr-22			
Frei Gaspar	--	abr-22			
Frei Inocêncio	--	abr-22			
Fronteira					
Galiléia					
Goianá					
Gonçalves					
Gouveia	--	abr-22			
Grão Mogol	--	abr-22			
Grupiara	--	mar-22			
Guapé	--	mar-22			
Guaraciaba	--	mar-22			
Guaranésia	--	mar-22			
Guarani					
Guarará					
Guarda-Mor					
Guidoval	--	mar-22			
Guiricema					
Gurinhatã					
Heliodora					
Iapu	--	mai-22			
Ibertioga					
Ibiaí	--	abr-22			
Ibiraci	--	mar-22			

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MINAS GERAIS (5/10)

470 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Ibitiúra de Minas					
Ibituruna	--	mar-22			
Icaraí de Minas	--	abr-22			
Igaratinga					
Iguatama					
Ijaci	--	mar-22			
Ilicínea	--	mar-22			
Indaiabira	--	abr-22			
Inimutaba	--	abr-22			
Ipuiúna					
Iraí de Minas	--	mar-22			
Itabirinha	--	mai-22			
Itacarambi	--	abr-22			
Itaipé					
Itamarandiba	--	abr-22			
Itamarati de Minas					
Itambacuri	--	abr-22			
Itambé do Mato Dentro					
Itamogi	--	mar-22			
Itamonte	--	mar-22			
Itanhandu					
Itanhomi					
Itaobim	--	abr-22			
Itapagipe					
Itapecerica	--	abr-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Itapeva	--	mar-22			
Itaú de Minas					
Itaverava	--	abr-22			
Itinga					
Itueta	--	mai-22			
Itumirim					
Jacuí	--	mar-22			
Jaíba	--	abr-22			
Japonvar	--	mai-22			
Jeceaba	--	abr-22			
Jenipapo de Minas	--	mai-22			
Jequeri					
Jequitaí					
Jesuânia	--	abr-22			
Joaíma					
Joaquim Felício	--	jun-22			
Josenópolis	--	mai-22			
Juramento					
Juruaia	--	mar-22			
Ladainha	--	mai-22			
Lagamar					
Lagoa Dourada	--	abr-22			
Lagoa Formosa	--	mai-22			
Lajinha	--	mar-22			
Lamim	--	mar-22			

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MINAS GERAIS (6/10)

470 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Laranjal	--	mar-22			
Lassance	--	mai-22			
Leme do Prado	--	mai-22			
Liberdade					
Lima Duarte					
Limeira do Oeste	--	abr-22			
Lontra	--	mai-22			
Luisburgo	--	mar-22			
Luislândia	--	mai-22			
Luminárias	--	mar-22			
Madre de Deus de Minas	--	abr-22			
Malacacheta	--	mai-22			
Manhumirim					
Maravilhas					
Maria da Fé	--	abr-22			
Marilac	--	jun-22			
Maripá de Minas					
Marliéria	--	abr-22			
Martinho Campos	--	mar-22			
Martins Soares	--	mar-22			
Materlândia					
Matipó					
Mato Verde	--	mai-22			
Matutina	--	abr-22			
Medeiros	--	mar-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Medina					
Mendes Pimentel	--	mar-22			
Mercês					
Mesquita					
Minas Novas					
Minduri	--	abr-22			
Mirabela	--	jun-22			
Miradouro					
Miraí					
Moeda					
Moema					
Monsenhor Paulo	--	abr-22			
Monte Alegre de Minas					
Monte Santo de Minas	--	mar-22			
Montezuma					
Morro da Garça					
Morro do Pilar					
Munhoz					
Mutum					
Muzambinho					
Natalândia	--	mai-22			
Natércia	--	mar-22			
Nazareno	--	mar-22			
Nova Módica	--	mai-22			
Nova Serrana					

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MINAS GERAIS (7/10)

470 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Novo Cruzeiro	--	mai-22			
Olaria	--	mar-22			
Olhos-d Água	--	mai-22			
Olímpio Noronha	--	abr-22			
Oliveira Fortes					
Onça de Pitangui	--	mai-22			
Oratórios	--	mai-22			
Ouro Verde de Minas					
Padre Paraíso	--	jun-22			
Paineiras	--	mai-22			
Pains	--	mar-22			
Paiva	--	mar-22			
Palma	--	mar-22			
Paraisópolis					
Passa Quatro					
Passa Tempo	--	mar-22			
Passa-Vinte	--	abr-22			
Patrocínio do Muriaé	--	mar-22			
Paula Cândido					
Paulistas					
Pavão	--	jun-22			
Peçanha	--	jun-22			
Pedra do Anta	--	mar-22			
Pedra do Indaiá	--	abr-22			
Pedra Dourada	--	mar-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Pedralva	--	abr-22			
Pedras de Maria da Cruz					
Pedrinópolis	--	abr-22			
Pequeri	--	mar-22			
Perdizes	--	abr-22			
Perdões					
Pescador	--	jun-22			
Piau	--	mar-22			
Piedade de Ponte Nova	--	mar-22			
Piedade do Rio Grande	--	mai-22			
Pirajuba	--	abr-22			
Piranga	--	mar-22			
Piranguçu	--	abr-22			
Pirapetinga	--	mar-22			
Piraúba	--	mar-22			
Pitangui	--	mai-22			
Planura	--	mai-22			
Poço Fundo	--	abr-22			
Pocrane	--	abr-22			
Pompéu	--	mai-22			
Ponto Chique	--	jun-22			
Porto Firme	--	abr-22			
Poté					
Pouso Alto					
Pratápolis					

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MINAS GERAIS (8/10)

470 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Pratinha					
Presidente Juscelino	--	mai-22			
Presidente Kubitschek	--	mai-22			
Presidente Olegário					
Quartel Geral	--	abr-22			
Recreio	--	abr-22			
Reduto					
Resplendor	--	abr-22			
Riachinho					
Rio Casca	--	abr-22			
Rio do Prado	--	jun-22			
Rio Doce	--	abr-22			
Rio Espera					
Rio Novo	--	abr-22			
Rio Paranaíba					
Rio Pardo de Minas					
Rio Piracicaba	--	mai-22			
Rio Pomba	--	abr-22			
Rio Preto					
Rio Vermelho	--	mai-22			
Ritápolis	--	mai-22			
Rochedo de Minas	--	abr-22			
Rodeiro	--	abr-22			
Romaria	--	mai-22			
Rubelita	--	jun-22			

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Rubim					
Sabinópolis					
Salto da Divisa					
Santa Bárbara do Monte Verde	--	abr-22			
Santa Bárbara do Tugúrio	--	jun-22			
Santa Cruz do Escalvado	--	abr-22			
Santa Juliana					
Santa Margarida	--	abr-22			
Santa Maria de Itabira					
Santa Maria do Salto					
Santa Maria do Suaçuí					
Santa Rita de Caldas					
Santa Rita de Minas	--	abr-22			
Santana do Deserto	--	abr-22			
Santana do Jacaré	--	abr-22			
Santana do Manhuaçu					
Santana dos Montes					
Santo Antônio do Amparo					
Santo Antônio do Aventureiro	--	mai-22			
Santo Antônio do Grama	--	abr-22			
Santo Antônio do Itambé	--	jun-22			
Santo Antônio do Jacinto					
Santo Antônio do Monte					
Santo Antônio do Rio Abaixo					
São Geraldo	--	abr-22			

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MINAS GERAIS (9/10)

470 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
São Gonçalo do Abaeté	--	jun-22			
São Gonçalo do Pará	--	abr-22			
São Gonçalo do Rio Abaixo					
São Gonçalo do Sapucaí	--	abr-22			
São Gotardo					
São João Batista do Glória					
São João da Mata					
São João da Ponte	--	jun-22			
São João do Manhuaçu					
São João do Oriente					
São João Evangelista	--	jun-22			
São José da Barra					
São José do Divino	--	jun-22			
São José do Goiabal					
São José do Mantimento					
São Miguel do Anta					
São Pedro da União					
São Pedro dos Ferros					
São Romão					
São Roque de Minas					
São Thomé das Letras					
São Tiago					
São Tomás de Aquino					
Senador Amaral					
Senador Cortes					

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Senador Firmino					
Senador José Bento	--	abr-22			
Senhora de Oliveira					
Senhora do Porto					
Senhora dos Remédios					
Sericita	--	mai-22			
Serra Azul de Minas					
Serra do Salitre					
Serra dos Aimorés					
Serrania					
Serranos					
Serro	--	jun-22			
Silvianópolis	--	abr-22			
Simão Pereira					
Simonésia					
Soledade de Minas					
Tabuleiro					
Tapira					
Tapiraí					
Tarumirim	--	mai-22			
Teixeiras					
Tiros					
Tocantins					
Tombos					
Turmalina	--	jun-22			

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

ENTREGAS | FASE 1.4

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO

17/Jan/22

MINAS GERAIS (10/10)

470 municípios

Município	Instalação de Infraestrutura (Torre e abrigo)		Energia definitiva	Instalação de RF (Antenas e transmissores)	
Turvolândia					
Umburatiba					
União de Minas					
Urucânia					
Urucuia	--	jul-22			
Vargem Bonita					
Varjão de Minas					
Varzelândia	--	jun-22			
Vazante	--	jul-22			
Verdelândia					
Veredinha					
Veríssimo					
Vermelho Novo					
Vieiras					
Virgem da Lapa	--	jul-22			
Virgínia					
Virginópolis	--	jun-22			
Virgolândia	--	jul-22			
Volta Grande					
Wenceslau Braz	--	abr-22			

S/P - Sem previsão; **E/P** - Em programação; **FQ** - Fluxo qualificatório; **FR** - Fluxo regulatório; **P1** - Pendência do município; **P2/P3/P4/P5** - pendência de canal; **PPTA** – Pendência Pós Termo de Adesão

FLUXO | FASE 1.1 | CE • PI • RN

73 MUNICÍPIOS • 267 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

17/Jan/22
Status d+180

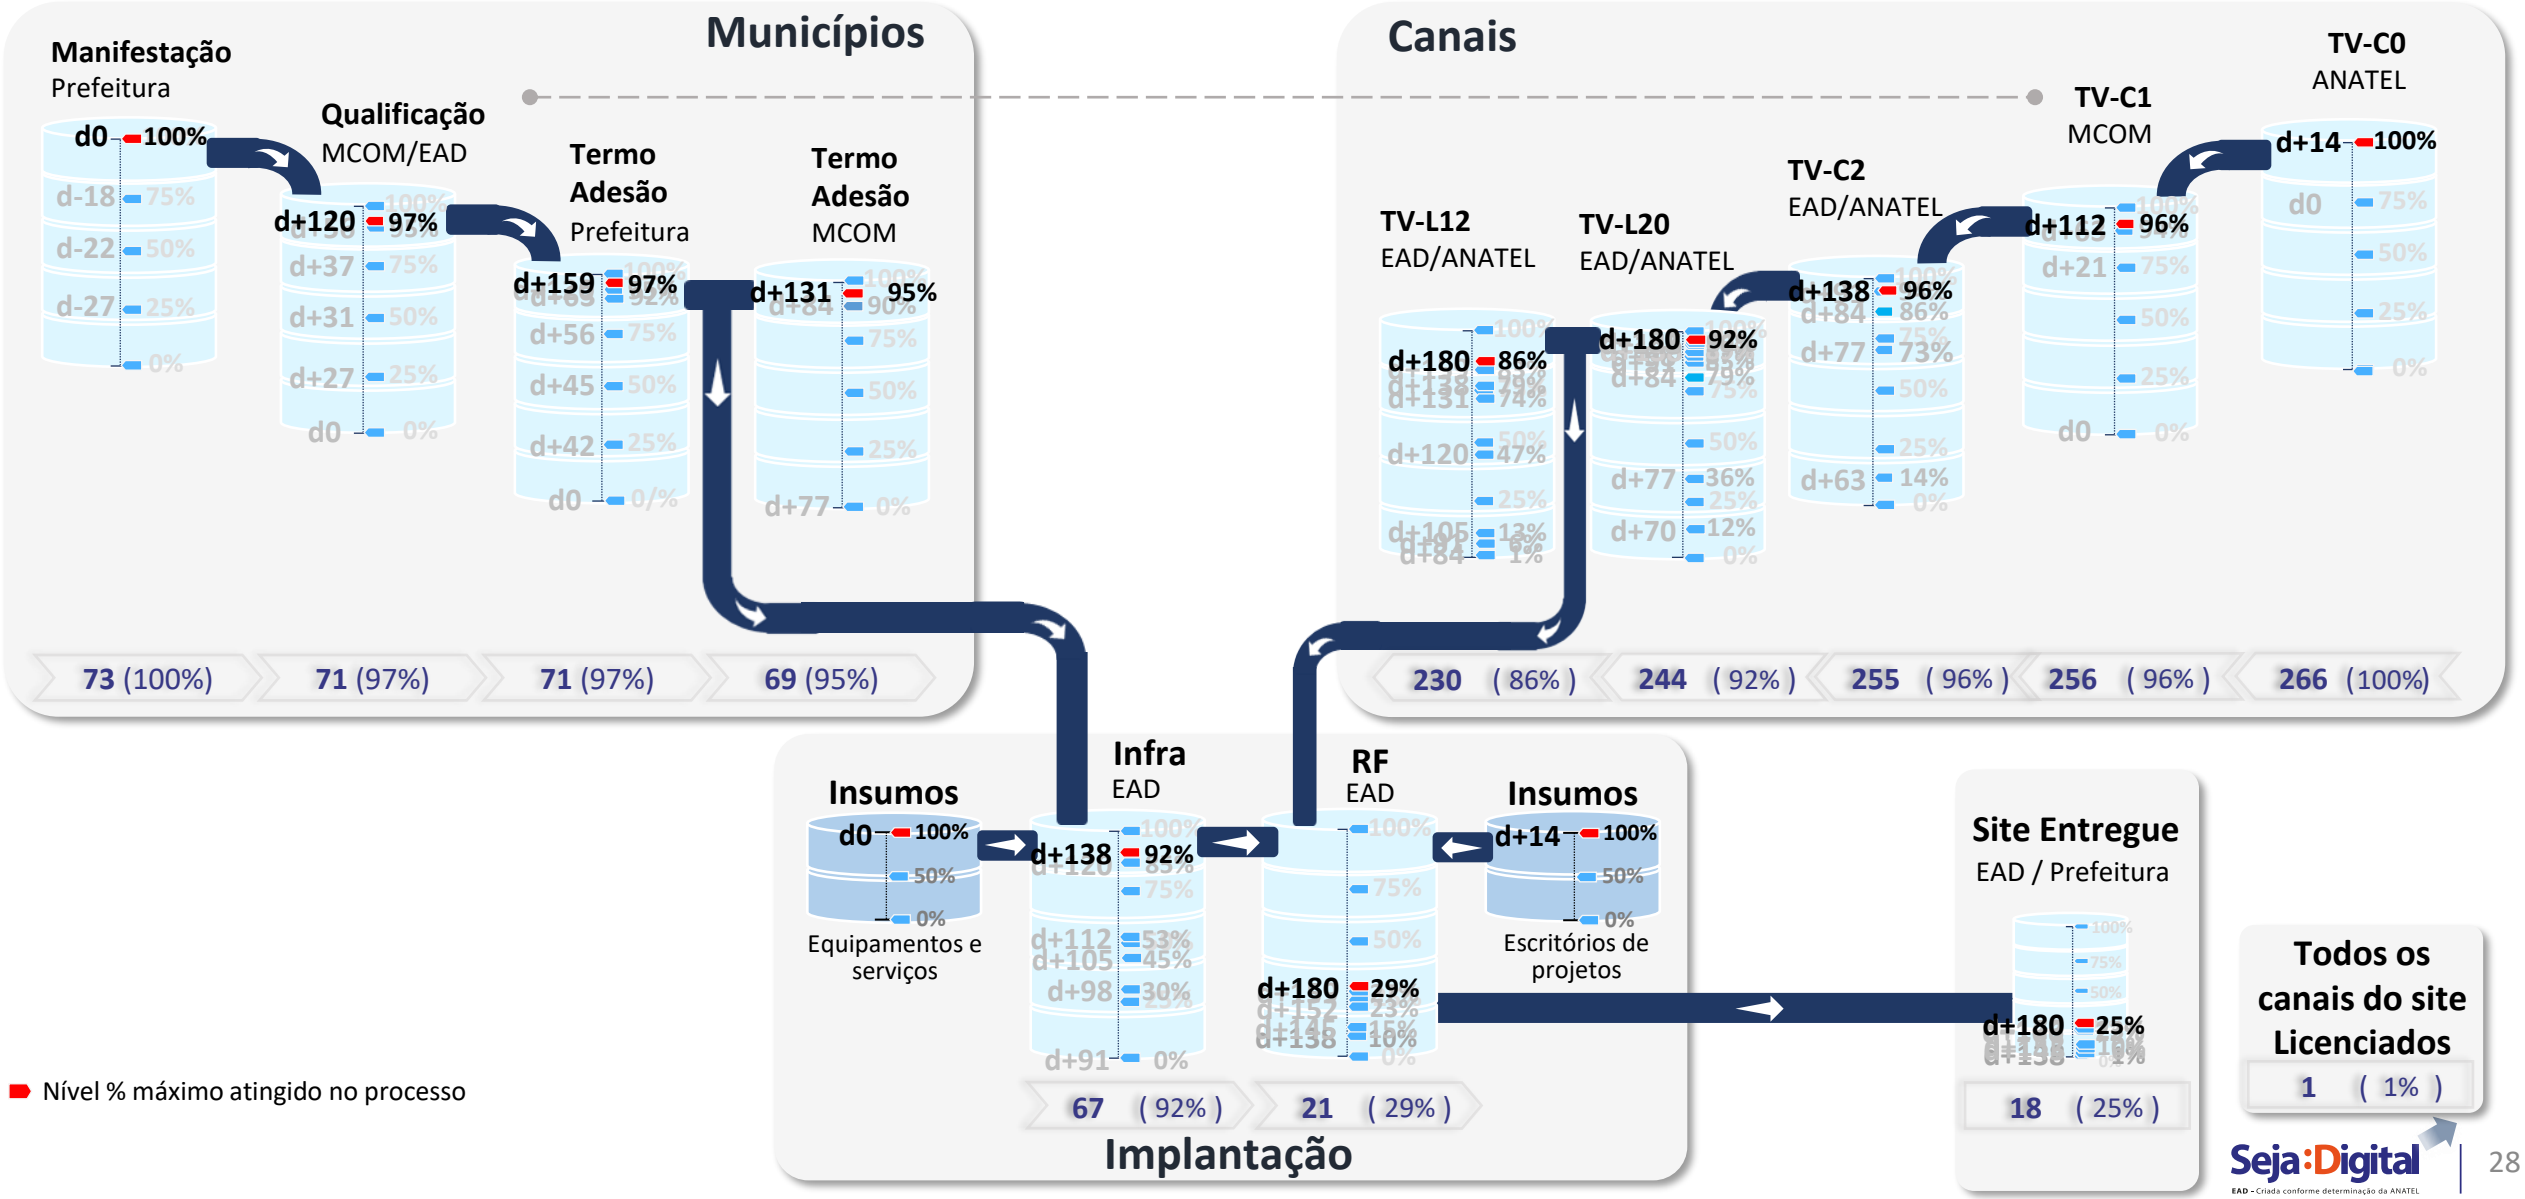

Nível % máximo atingido no processo

Seja:Digital
EAD - Criada conforme determinação da ANATEL

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.1 • 73 MUNICÍPIOS • 267 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

17/Jan/22
Status d+180

Manifestação de interesse da entidade

Entidade

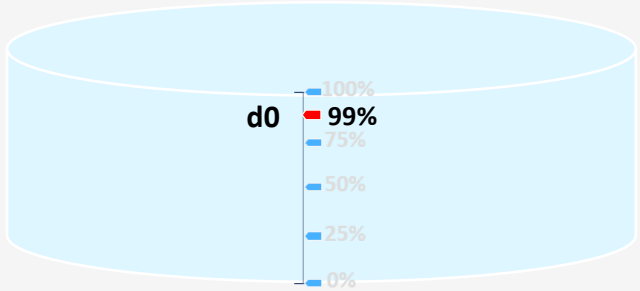

72 (99%)

VTA positiva da entidade manifestante

EAD

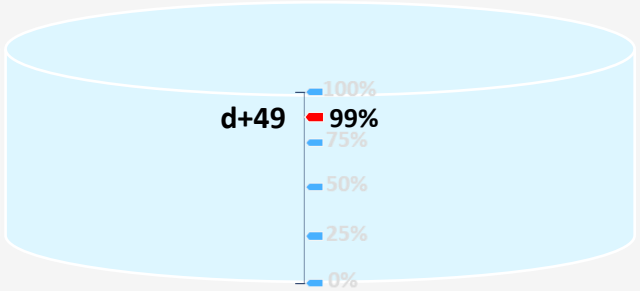

72 (99%)

Entidade manifestante qualificada

MCOM

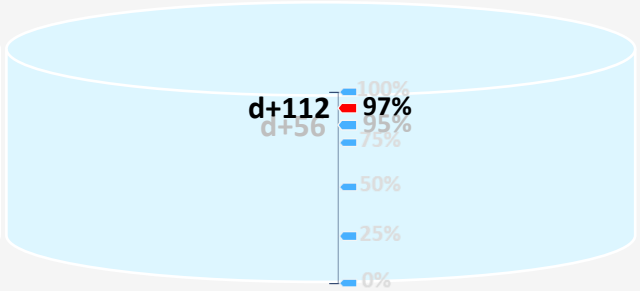

71 (97%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD

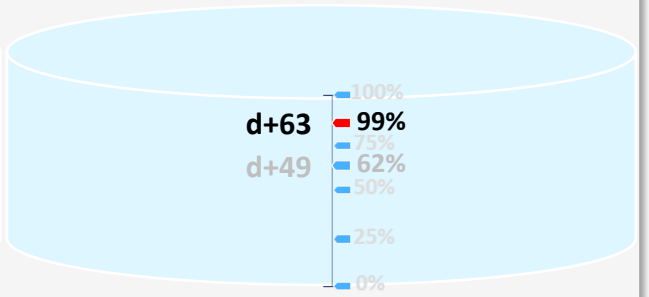

72 (99%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.1 • 73 MUNICÍPIOS • 266 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = d0

17/Jan/22
Status d+180

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.1	Lagoa Nova/RN	15.477	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.1	Inhuma/PI	15.296	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.1

17/Jan/22
Status d+180

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	9	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	10	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	11	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	13	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	8	STM 10	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Guaraciaba do Norte	FUNDACAO JOAO PAULO II	26	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.1	CE	Itapiúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	3	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.1	CE	Nova Russas	RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA	2	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.1	PI	Pedro II	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	26	STM 6	STM 5	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P3 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.1

17/Jan/22
Status d+180

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1	CE	Arneiroz	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A		7	STM 10	STM 9	SIM	SIM
1.1	CE	São Luís do Curu	FUNDACAO DE TELEDU. DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC	Televisão Verdes Mares		11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.1	RN	Umarizal	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	TVSBT Canal 4 de São Paulo		12	STM 6	STM4	NÃO	SIM

Entidade que manifestou interesse

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P4 • CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.1

17/Jan/22
Status d+180

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P5 • CANAIS PENDENTES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.1

17/Jan/22
Status d+180

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P6 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.1

17/Jan/22
Status d+180

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1	CE	Meruoca	FUNDACAO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC	43	STM 4	SIM	SIM
1.1	CE	Meruoca	FUNDACAO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC	28	STM 4	SIM	SIM
1.1	CE	Nova Russas	RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA	42	STM 5	SIM	SIM
1.1	CE	Nova Russas	RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA	20	STM 5	SIM	SIM

FLUXO | FASE 1.1 Complemento | CE • PI • RN

24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

17/Jan/22
Status d+150

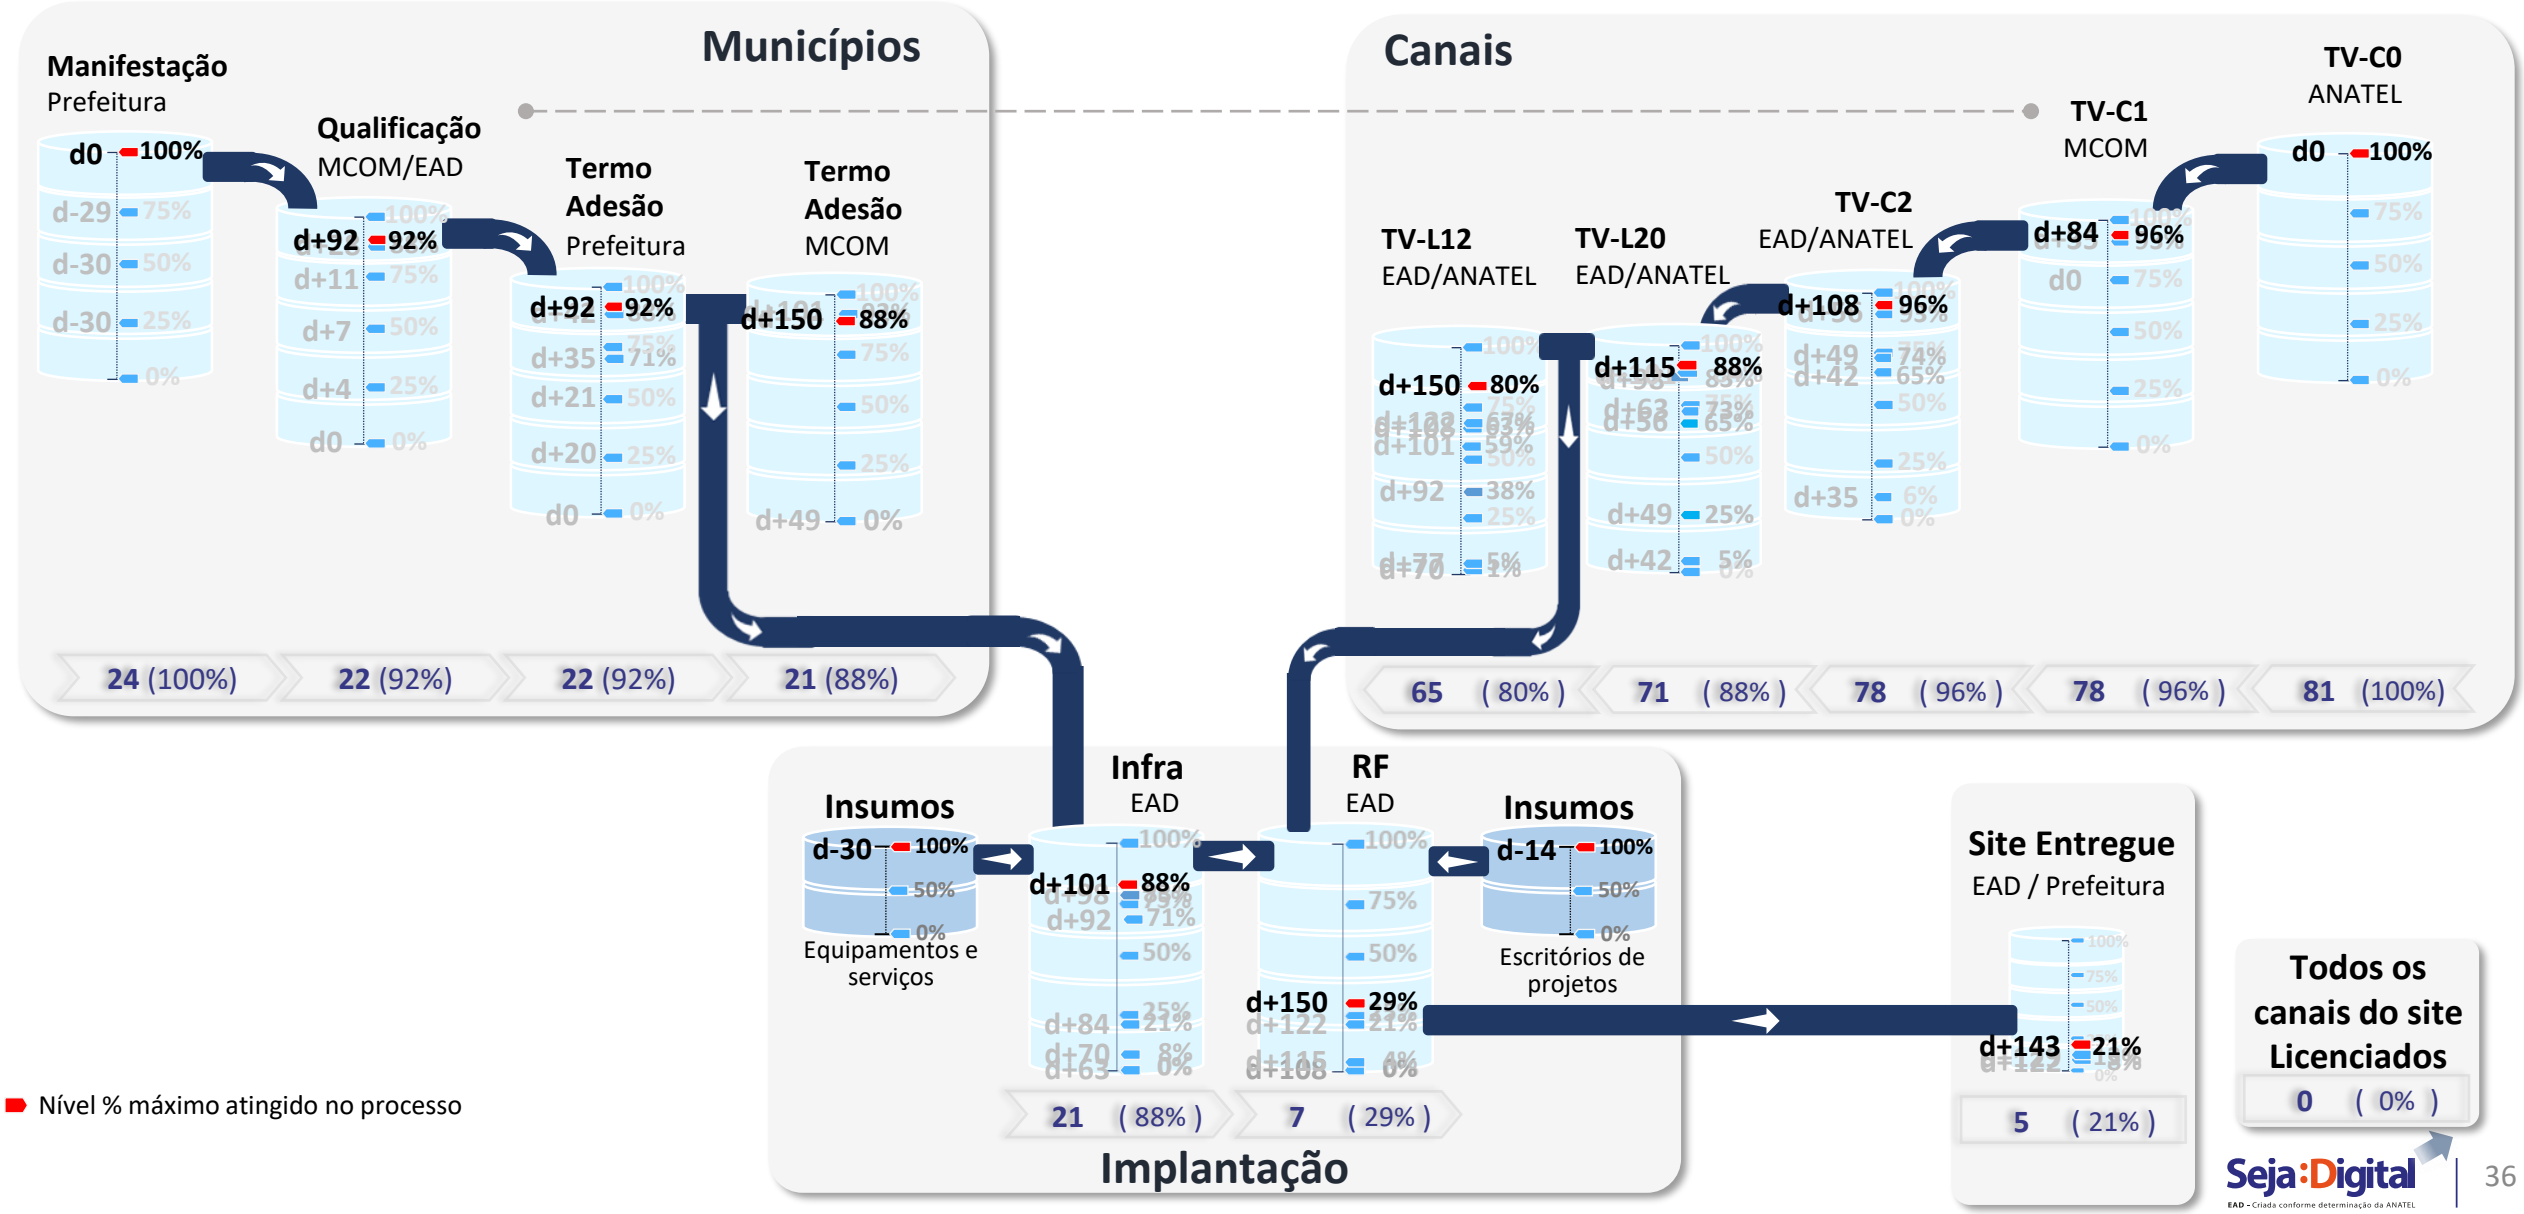

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.1 COMP. • 24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

17/Jan/22
Status d+150

Manifestação de interesse da entidade

Entidade

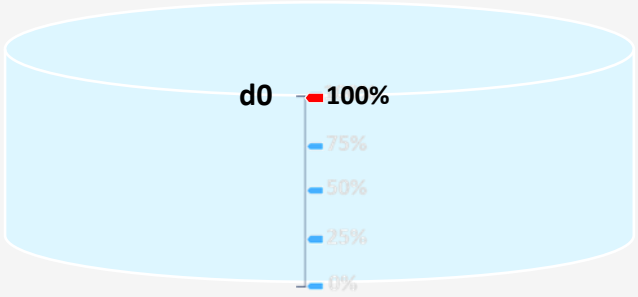

24 (100%)

VTA positiva da entidade manifestante

EAD

24 (100%)

Entidade manifestante qualificada

MCOM

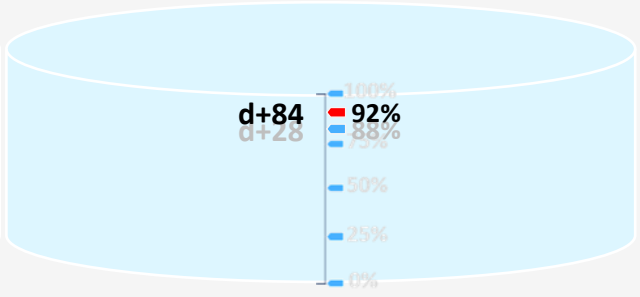

22 (92%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD

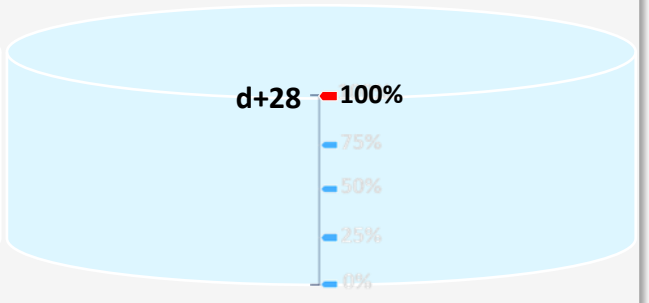

24 (100%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.1 COMP. • 24 MUNICÍPIOS • 81 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = d0

17/Jan/22
Status d+150

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.1 compl.	Frutuoso Gomes/RN	4.095	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.1 compl.	Itaú/RN	5.858	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.1 COMP.

17/Jan/22
Status d+150

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1 comp	RN	Itaú	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU	4	STM 4	STM 3	NÃO	SIM

P3 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.1 COMP.

17/Jan/22
Status d+150

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	Observação	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.1 Comp	CE	Baixio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO	TVSBT Canal 4 de São Paulo		2	A manifestação deveria ter ocorrido pela CPB	STM 4	STM 3	NÃO	SIM

Entidade que manifestou interesse

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P4 • CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.1 COMP.

17/Jan/22
Status d+150

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P5 • CANAIS PENDENTES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.1 COMP.

17/Jan/22
Status d+150

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P6 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.1 COMP.

17/Jan/22
Status d+150

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

FLUXO | FASE 1.2 | MA • PB

161 MUNICÍPIOS • 605 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

17/Jan/22
Status d+143

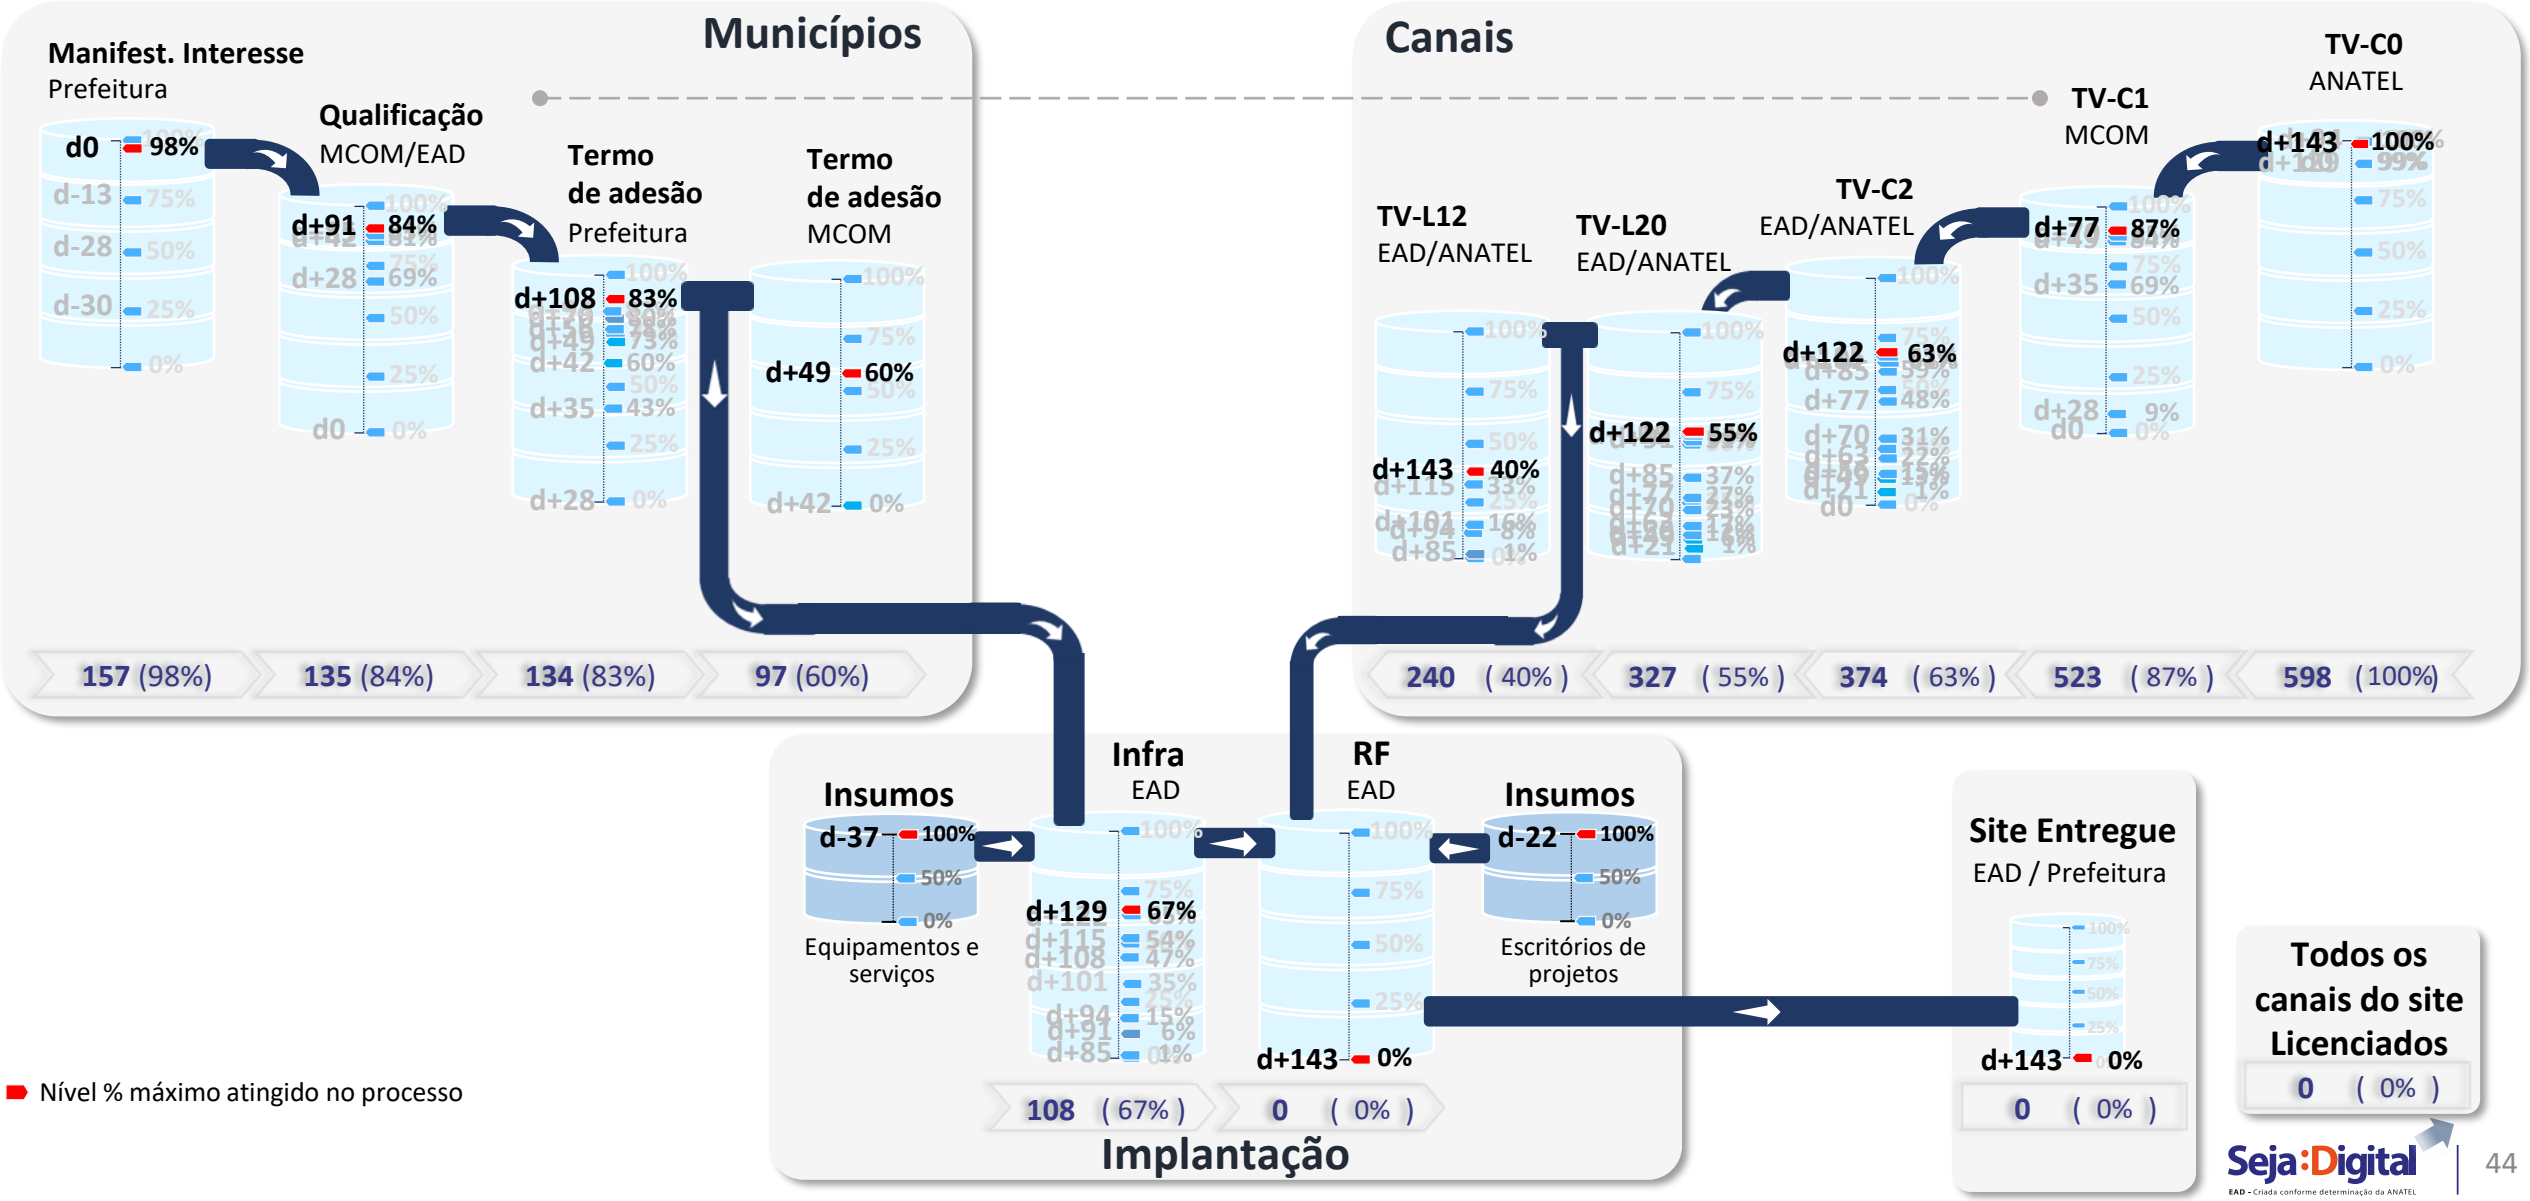

Nível % máximo atingido no processo

Seja:Digital
EAD - Criada conforme determinação da ANATEL

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 605 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

17/Jan/22
Status d+143

Manifestação de interesse da entidade
Entidade

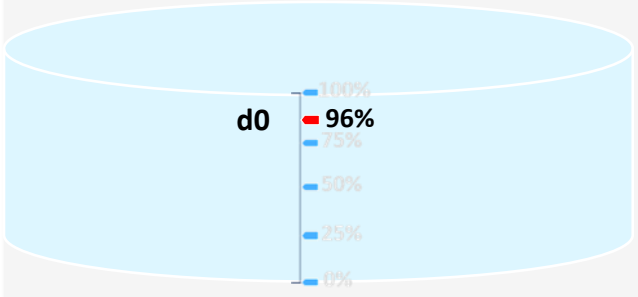

154 (96%)

VTA positiva da entidade manifestante
EAD

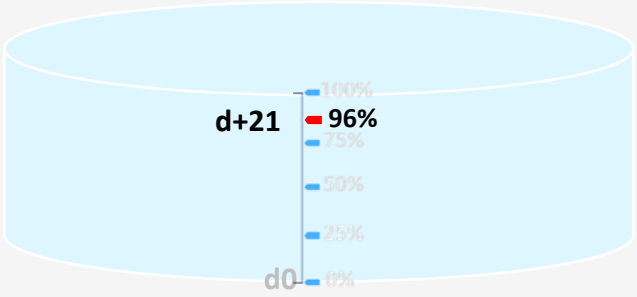

154 (96%)

Entidade manifestante qualificada
MCOM

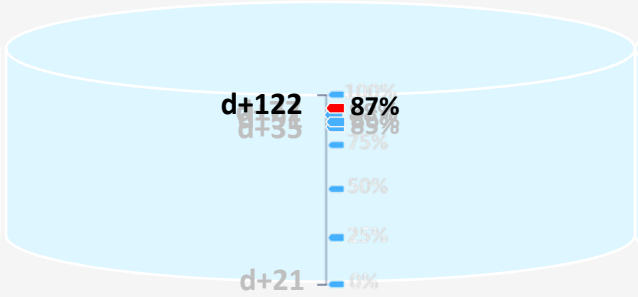

140 (87%)

Local Habilitado
Prefeitura / EAD

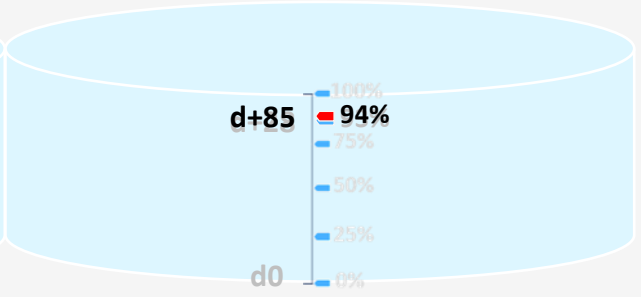

151 (94%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES (1/2)

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

17/Jan/22
Status d+143

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.2	Malta/PB	5.766	Não	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Pilar/PB	11.855	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	4	SIM	SIM
1.2	Serra Grande/PB	3.089	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Sertãozinho/PB	4.958	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Caaporã/PB	21.698	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Imaculada/PB	11.790	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	São José de Piranhas/PB	20.053	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Condado/PB	6.649	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Santa Cruz/PB	6.585	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	São José dos Ramos/PB	5.915	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Gonçalves Dias/MA	17.924	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Graça Aranha/MA	6.263	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Magalhães de Almeida/MA	19.620	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Mata Roma/MA	16.679	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Mirador/MA	21.000	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	São João dos Patos/MA	25.860	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES (2/2)

FASE 1.2 • 161 MUNICÍPIOS • 598 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

17/Jan/22
Status d+143

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.2	Tutóia/MA	58.311	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Belém/PB	17.640	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Bonito de Santa Fé/PB	11.797	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Cacimba de Dentro/PB	17.159	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Jericó/PB	7.732	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Livramento/PB	7.371	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM
1.2	Barreirinhas/MA	61.828	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.2	Bananeiras/PB	21.210	Sim	Sim	Sim	Não	Inviável	Não	6	SIM	SIM
1.2	Marajá do Sena/MA	7.810	Sim	Sim	Sim	Não	Inviável	Não	3	SIM	SIM
1.2	Casserengue/PB	7.431	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.2	Conceição/PB	18.904	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	6	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.2

17/Jan/22
Status d+143

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	MA	Anajatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	9	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Anajatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	11	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Itapecuru Mirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM	5	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	MA	Passagem Franca	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM	4	STM 9	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Alagoa Grande	TELEVISAO BORBOREMA S/A	19	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.2	PB	Alagoa Grande	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	33	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.2	PB	Areia	PABLO COMUNICACOES LTDA EPP	15	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Areia	TELEVISAO BORBOREMA SA	21	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Caaporã	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	46	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Conceição	SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME	32	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Conceição	F S M COMUNICACAO LTDA - EPP	38	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Coremas	FUNDACAO BRASIL ECOAR	26	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Cubati	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	10	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Imaculada	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA	13	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Ingá	FUNDACAO PADRE IBIAPINA	7	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	Itabaiana	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	13	STM 8	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	Juazeirinho	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA	14	STM 5	STM 4	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P2 • CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.2

17/Jan/22
Status d+143

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	PB	Piancó	FUNDACAO BRASIL ECOAR	29	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Picuí	FUNDACAO BRASIL ECOAR	21	STM 5	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Picuí	TELEVISAO BORBOREMA S/A	22	STM 5	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Princesa Isabel	TELEVISAO BORBOREMA S/A	14	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Queimadas	FUNDACAO PEDRO AMERICO	8	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Queimadas	FUNDACAO BRASIL ECOAR	33	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Rio Tinto	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST MARISCHEN	30	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.2	PB	São Bento	FUNDACAO BRASIL ECOAR	25	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	São Bento	PRINTSTEL ENGENHARIA LTDA	48	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	São José de Piranhas	FUNDACAO BRASIL ECOAR	29	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Serra Branca	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA	4	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Serra Branca	TELEVISAO BORBOREMA S/A	14	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Teixeira	MUNICIPIO DE TEIXEIRA	8	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Condado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	10	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Malta	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA	5	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	Santa Cruz	FUNDACAO BRASIL ECOAR	25	STM 3	STM 2	SIM	SIM
1.2	PB	São José dos Ramos	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	16	STM 3	STM 2	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P3 • CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.2

17/Jan/22
Status d+143

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	MA	Barreirinhas	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO LTDA	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO		11	STM 4	STM 2	SIM	SIM
1.2	MA	Barreirinhas	TELEVISAO MIRANTE LTDA			13	STM 4	STM 2	SIM	SIM
1.2	MA	Coelho Neto	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO	SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTD		5	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Coelho Neto	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACI	TV Itapicuru Ltda	12	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Governador Archer	TVMARANHAOCENTRALLTDA			7	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Itapecuru Mirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACI	Televisão Mirante Ltda	11	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	MA	Joselândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	TV Itapicuru Ltda	10	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lago do Junco	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LT		4	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lago do Junco	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACI	TV Itapicuru Ltda	9	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lago do Junco	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LT		13	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Lima Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO		7	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Passagem Franca	PREFEITURAMUNICIPALDEPASSAGEMFRANCA		Rádio Mirante do Maran	6	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	MA	Presidente Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	TV Itapicuru Ltda	7	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	MA	Santo Antônio dos Lopes	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOP	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO		10	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Santo Antônio dos Lopes	PREFEITURAMUNICIPALDESANTOANTONIODOSLOPES		TV Itapicuru Ltda	13	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Santo Antônio dos Lopes	PREFEITURAMUNICIPALDESANTOANTONIODOSLOPES			2	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	São Domingos do Maranhão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARA	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	TV Itapicuru Ltda	8	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	São Domingos do Maranhão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARA	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LT		13	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	São Domingos do Maranhão	TVMARANHAOCENTRALLTDA			7	STM 6	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Timbiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO		11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LT		10	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACI	TV Itapicuru Ltda	13	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.2	PB	Alagoa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA		11	STM 8	STM 6	NÃO	SIM

P3 • CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.2

17/Jan/22
Status d+143

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização - EDA	ECP	CPB	Canal Analóg.	STM Original	STM Proj.	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	PB	Areia	USINA SANTA MARIA SA	TELEVISAO PARAIBA LTDA		13	STM 10	STM 9	SIM	SIM
1.2	PB	Bananeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA	Rádio e Televisão Band	4	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Bananeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA		7	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Barra de Santa Rosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO PARAÍBA	9	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Brejo do Cruz	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LT		9	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Dona Inês	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO CABO BRA	4	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Gurinhém	TELEVISAO BORBOREMA S/A	TELEVISAO BORBOREMA S/A	TELEVISÃO TAMBAÚ L	4	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Ingá	PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA	TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO L		9	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	Itabaiana	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE I	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LT		4	STM 8	STM 4	SIM	SIM
1.2	PB	Itabaiana	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE I	TV OMEGA LTDA		8	STM 8	STM 4	SIM	SIM
1.2	PB	Itabaiana	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO SISTEMA DE TV DE I	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA		11	STM 8	STM 4	SIM	SIM
1.2	PB	Juazeirinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO	TV OMEGA LTDA		10	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Mataraca	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LT		12	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Pocinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO PARAÍBA	12	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Queimadas	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO PARAÍBA	7	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Queimadas	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE	TELEVISAO SUL BAHIA	40	STM 7	STM 5	SIM	SIM
1.2	PB	Remígio	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO PARAÍBA	5	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.2	PB	Rio Tinto	AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	TELEVISÃO CABO BRA	7	STM 7	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	Rio Tinto	PRINTSTEL ENGENHARIA LTDA	FUNDACAO SECULO VINTE E UM		2	STM 7	STM 5	NÃO	SIM
1.2	PB	São Bento	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE	Tlevisão Sul Bahia de Te	40	STM 9	STM 8	SIM	SIM
1.2	PB	Soledade	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	TELEVISAO PARAIBA LTDA		7	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Sumé	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME	TV OMEGA LTDA		11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.2	PB	Taperoá	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	TELEVISAO PARAIBA LTDA		13	STM 4	STM 3	NÃO	SIM

P4 • CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.2

17/Jan/22
Status d+143

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	PB	São José dos Ramos	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	16	STM 3	STM 1	SIM	SIM
1.2	PB	São José dos Ramos	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 1	SIM	SIM
1.2	PB	Serraria	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P5 • CANAIS PENDENTES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.2

17/Jan/22
Status d+143

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P6 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.2

17/Jan/22
Status d+143

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.2	MA	Anajatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	44	STM 5	SIM	SIM
1.2	MA	Anajatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	36	STM 5	SIM	SIM
1.2	MA	Areia	TELEVISAO PARAIBA LTDA	20	STM 10	SIM	SIM
1.2	MA	Areia	TELEVISAO PARAIBA LTDA	31	STM 10	SIM	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	TV MARANHAO CENTRAL LTDA	31	STM 9	SIM	SIM
1.2	MA	Vitória do Mearim	TV MARANHAO CENTRAL LTDA	30	STM 9	SIM	SIM

FLUXO | FASE 1.3 | AL • BA • PE • SE

322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = d0

17/Jan/22
Status d+101

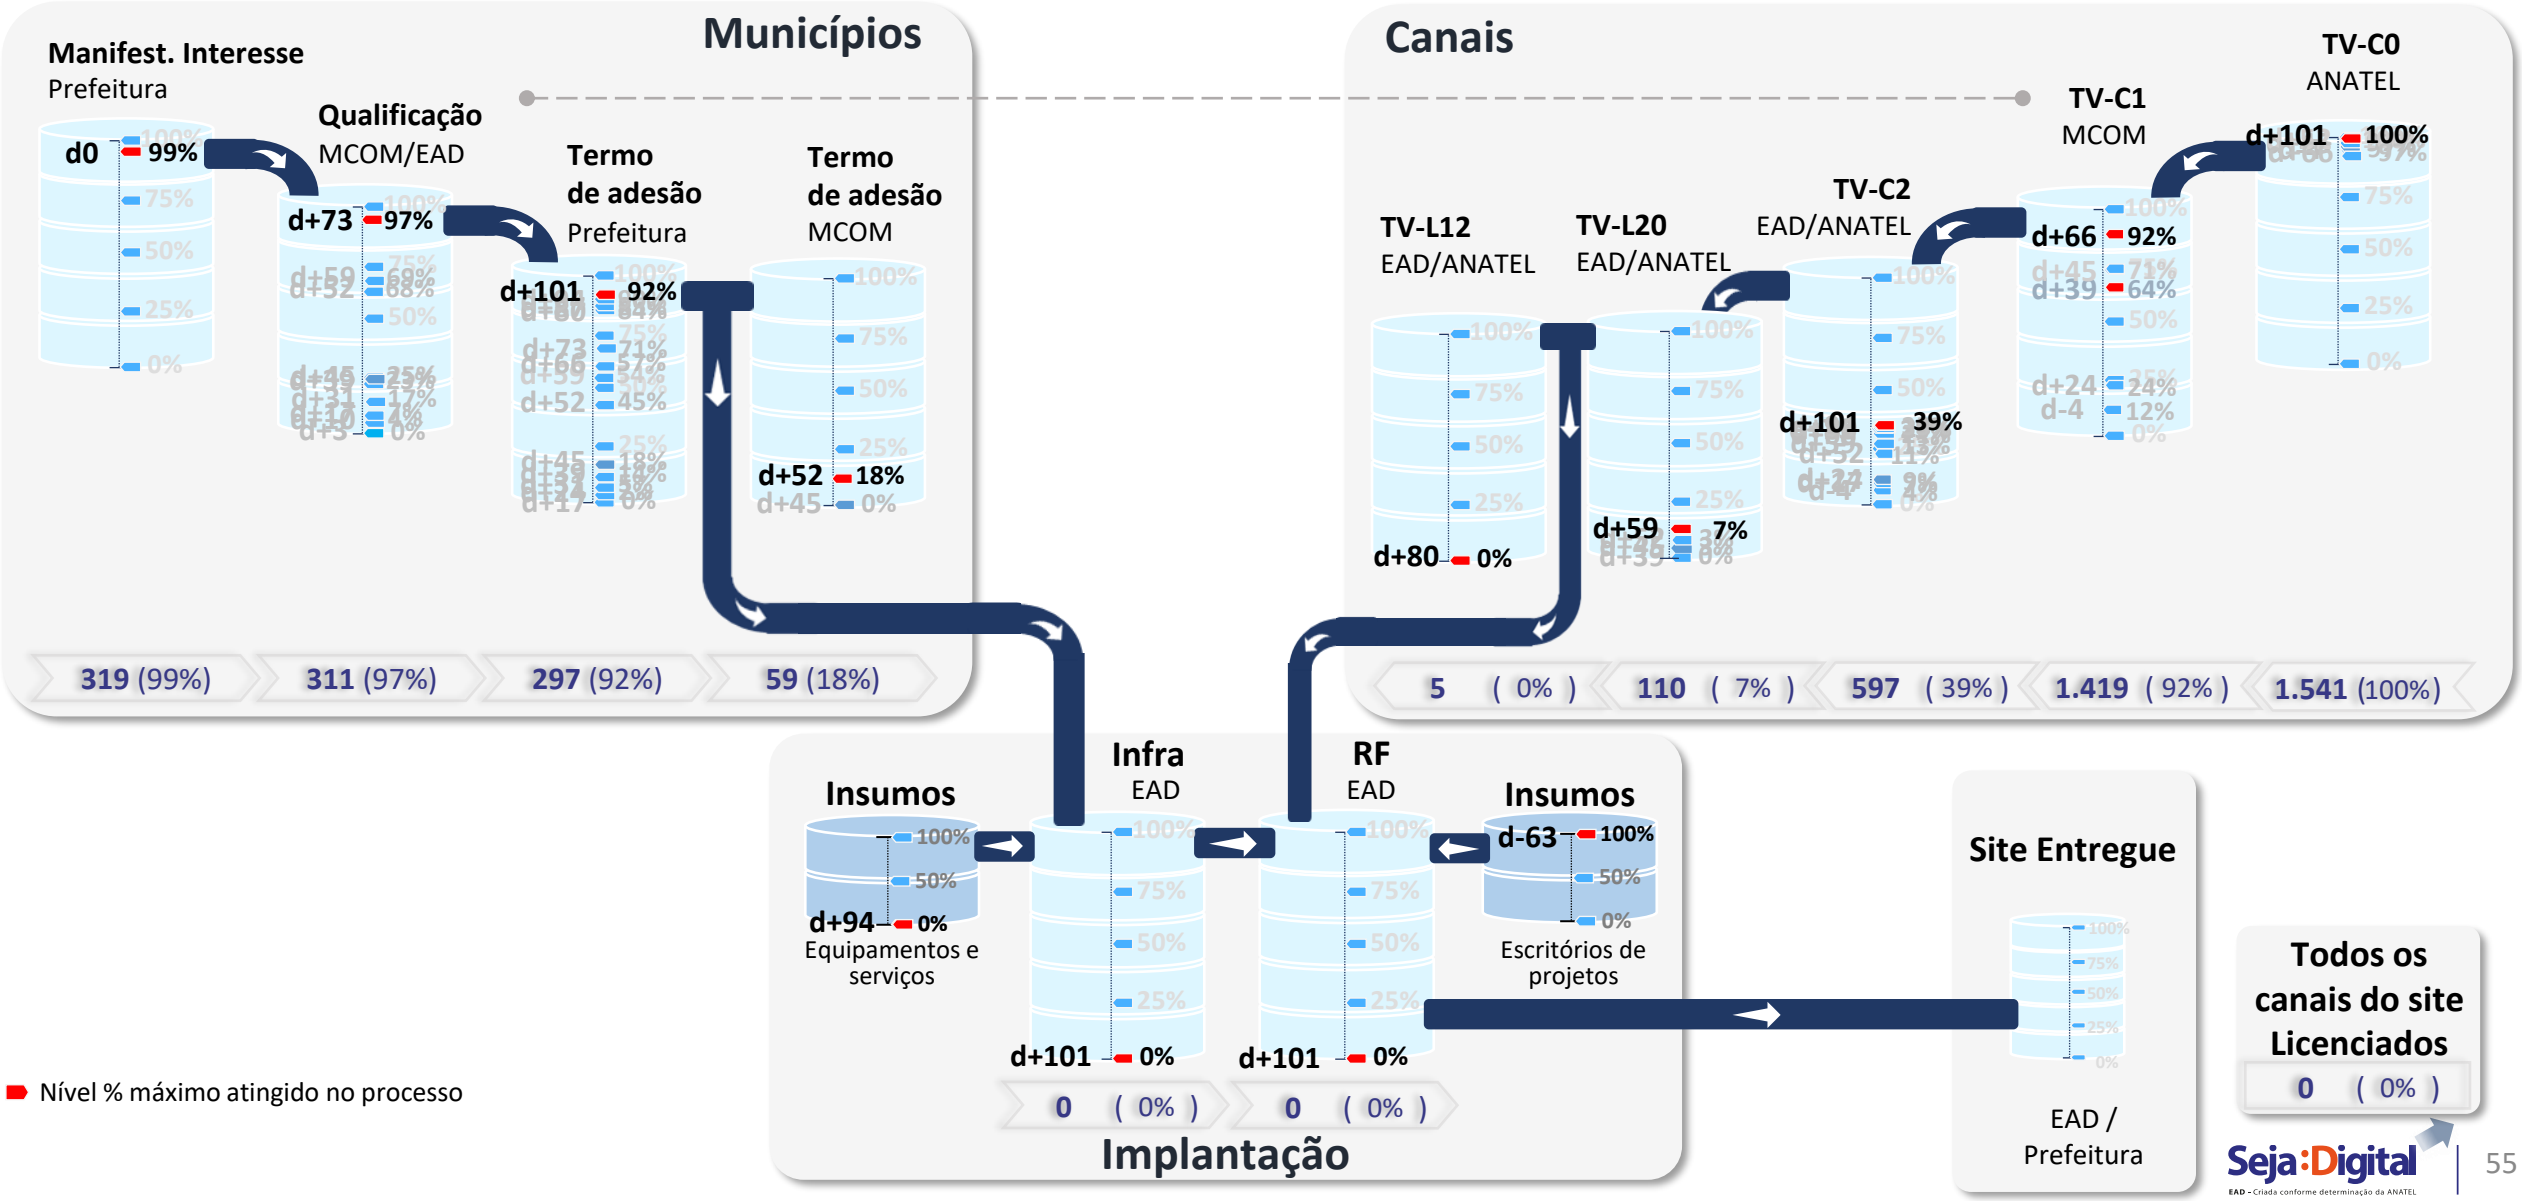

Nível % máximo atingido no processo

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRA EM 08/OUT/21 = d0

17/Jan/22
Status d+101

Manifestação de interesse da entidade

Entidade

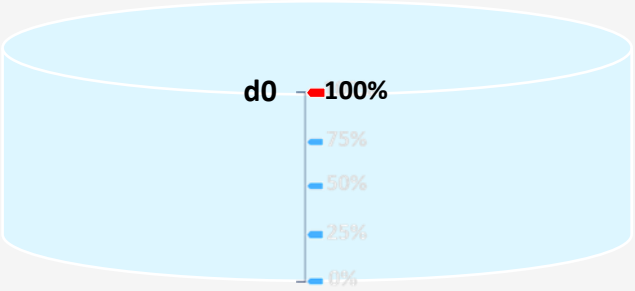

322 (100%)

VTA positiva da entidade manifestante

EAD

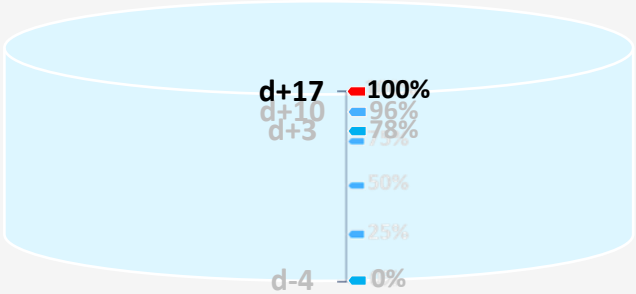

322 (100%)

Entidade manifestante qualificada

MCOM

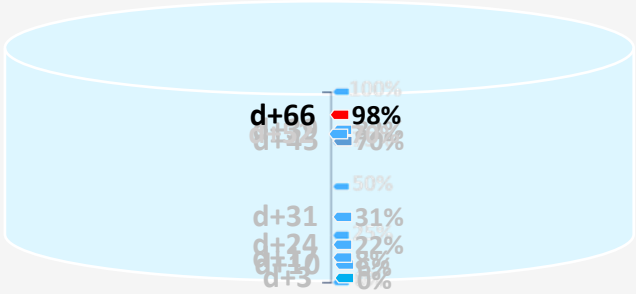

316 (98%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD

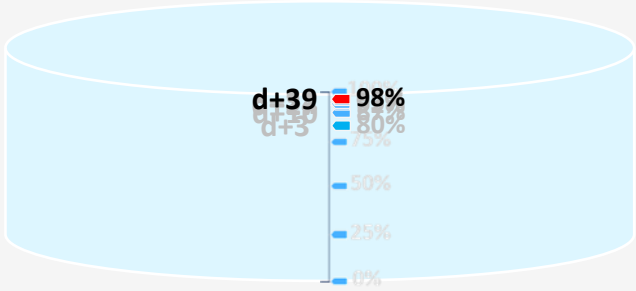

317 (98%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.3 • 322 MUNICÍPIOS • 1.542 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 08/OUT/21 = d0

17/Jan/22
Status d+101

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.3	Craíbas/AL	24.129	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	4	SIM	SIM
1.3	Traipu/AL	27.632	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	4	SIM	SIM
1.3	Lajedo do Tabocal/BA	8.546	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.3	Dois Riachos/AL	11.054	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Olho d Água do Casado/AL	9.303	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Coaraci/BA	17.458	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Iguaracy/PE	12.209	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Jaqueira/PE	11.668	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	SIM	SIM
1.3	Cafarnaum/BA	18.356	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	4	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.3

17/Jan/22
Status d+101

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	AL	Ibateguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA	2	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.3	AL	Murici	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	2	STM 8	STM 5	NÃO	SIM
1.3	AL	Murici	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	30	STM 8	STM 5	NÃO	SIM
1.3	AL	Passo de Camaragibe	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO CAMARAGIBE	2	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.3	AL	Piranhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	8	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.3	AL	São Luís do Quitunde	TVF COMUNICACOES LTDA - ME	30	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	AL	Viçosa	TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA	2	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	AL	Viçosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	9	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	BA	Alcobaça	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	10	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	BA	Cachoeira	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	13	STM 8	STM 7	NÃO	SIM
1.3	BA	Castro Alves	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES	9	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	BA	Pintadas	TELEVISAO BAHIA S.A.	11	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.3	PE	Belém de Maria	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA	4	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.3	PE	Bom Conselho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	2	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.3	PE	Bom Conselho	ELO COMUNICACAO LTDA	28	STM 10	STM 8	SIM	SIM
1.3	PE	Cortês	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES	2	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.3	PE	Glória do Goitá	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	30	STM 8	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	16	STM 9	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	16	STM 9	STM 6	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P2 • CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.3

17/Jan/22
Status d+101

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	PE	Paudalho	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	27	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Triunfo	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A EP	7	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.3	PE	Triunfo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	8	STM 8	STM 6	NÃO	SIM
1.3	PE	Vicência	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S. A. (GLO	50	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Carira	TELEVISAO ATALAIA LTDA	21	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	SE	Carmópolis	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST	16	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.3	SE	Gararu	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	2	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	SE	Itabaianinha	TELEVISAO ATALAIA LTDA	17	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Itabaianinha	TELEVISAO FENIX LTDA	49	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Neópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS	2	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Poço Redondo	TELEVISAO ATALAIA LTDA	38	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Poço Redondo	TELEVISAO FENIX LTDA	43	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Poço Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE	4	STM 8	STM 7	NÃO	SIM
1.3	SE	Riachão do Dantas	MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS	11	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Riachão do Dantas	MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS	13	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Riachão do Dantas	TELEVISAO ATALAIA LTDA	23	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.3	SE	Simão Dias	TELEVISAO ATALAIA LTDA	39	STM 7	STM 5	NÃO	SIM
1.3	SE	Simão Dias	TELEVISAO FENIX LTDA	47	STM 7	STM 5	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P3 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.3

17/Jan/22
Status d+101

Temos 71 entidades com manifestação de interesse e sem qualificação, na Fase 1.3.

P4 • CANAIS PENDENTES (1/2)

SEM VIABILIDADE - FASE 1.3

17/Jan/22
Status d+101

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	AL	Igreja Nova	FUNDACAO BRASIL ECOAR	46	STM 8	STM 7	SIM	SIM
1.3	AL	Murici	SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	47	STM 8	STM 5	NÃO	SIM
1.3	AL	São Luís do Quitunde	TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA	49	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	AL	Teotônio Vilela	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	27	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Barra de Guabiraba	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 6	STM 5	NÃO	SIM
1.3	PE	Belém de Maria	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.3	PE	Caetés	NOSSO LAR SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA-ME	41	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.3	PE	Caetés	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.3	PE	Glória do Goitá	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 8	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	TV NEWS - CANAL BRASILEIRO DE COMUNICACAO L	21	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	REDE 21 COMUNICACOES S.A.	32	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME	41	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	TELEVISAO CIDADE MODELO LTDA	42	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	FUNDACAO DE APOIO A GERACAO, PRODUCAO, CRI	43	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Gravatá	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 15	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Ibirajuba	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Palmares	REDE 21 COMUNICACOES S.A.	32	STM 13	STM 10	SIM	SIM
1.3	PE	Palmares	SISTEMA ASSOCIADO DE COMUNICACAO S.A.	48	STM 13	STM 10	SIM	SIM
1.3	PE	Palmares	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 13	STM 10	SIM	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P4 • CANAIS PENDENTES (2/2)

SEM VIABILIDADE - FASE 1.3

17/Jan/22
Status d+101

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	16	STM 9	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Panelas	ELO COMUNICACAO LTDA	21	STM 9	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Passira	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	43	STM 9	STM 8	SIM	SIM
1.3	PE	Paudalho	FUNDACAO VICENTE CAMPELO	16	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Paudalho	SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME	34	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Paudalho	TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA	36	STM 7	STM 3	SIM	SIM
1.3	PE	Primavera	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 8	STM 7	SIM	SIM
1.3	PE	São Benedito do Sul	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	São José do Egito	TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.	19	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.3	PE	Vertente do Lério	REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA	13	STM 4	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Vertente do Lério	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 4	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Vertentes	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	PE	Vicência	FUNDACAO DE APOIO A GERACAO, PRODUCAO, CRI	15	STM 9	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Itabaianinha	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Nossa Senhora das Dores	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.3	SE	Poço Redondo	RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	9	STM 10	STM 7	SIM	SIM
1.3	SE	Itabi	CÂMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantação de Infraestrutura.

P5 • CANAIS PENDENTES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.3

17/Jan/22
Status d+101

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P6 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.3

17/Jan/22
Status d+101

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.3	BA	Curaçá	TELEVISAO BAHIA S.A.	31	STM 5	SIM	SIM
1.3	BA	Curaçá	TELEVISAO BAHIA S.A.	30	STM 5	SIM	SIM
1.3	BA	Pintadas	TELEVISAO BAHIA S.A.	32	STM 4	SIM	SIM
1.3	BA	Pintadas	TELEVISAO BAHIA S.A.	32	STM 4	SIM	SIM
1.3	PE	Custódia	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	48	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Custódia	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	46	STM 9	SIM	SIM
1.3	PE	Parnamirim	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	46	STM 7	SIM	SIM
1.3	PE	Parnamirim	EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	48	STM 7	SIM	SIM

FLUXO | FASE 1.4 | MG

470 MUNICÍPIOS • 2.016 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

17/Jan/22
Status d+67

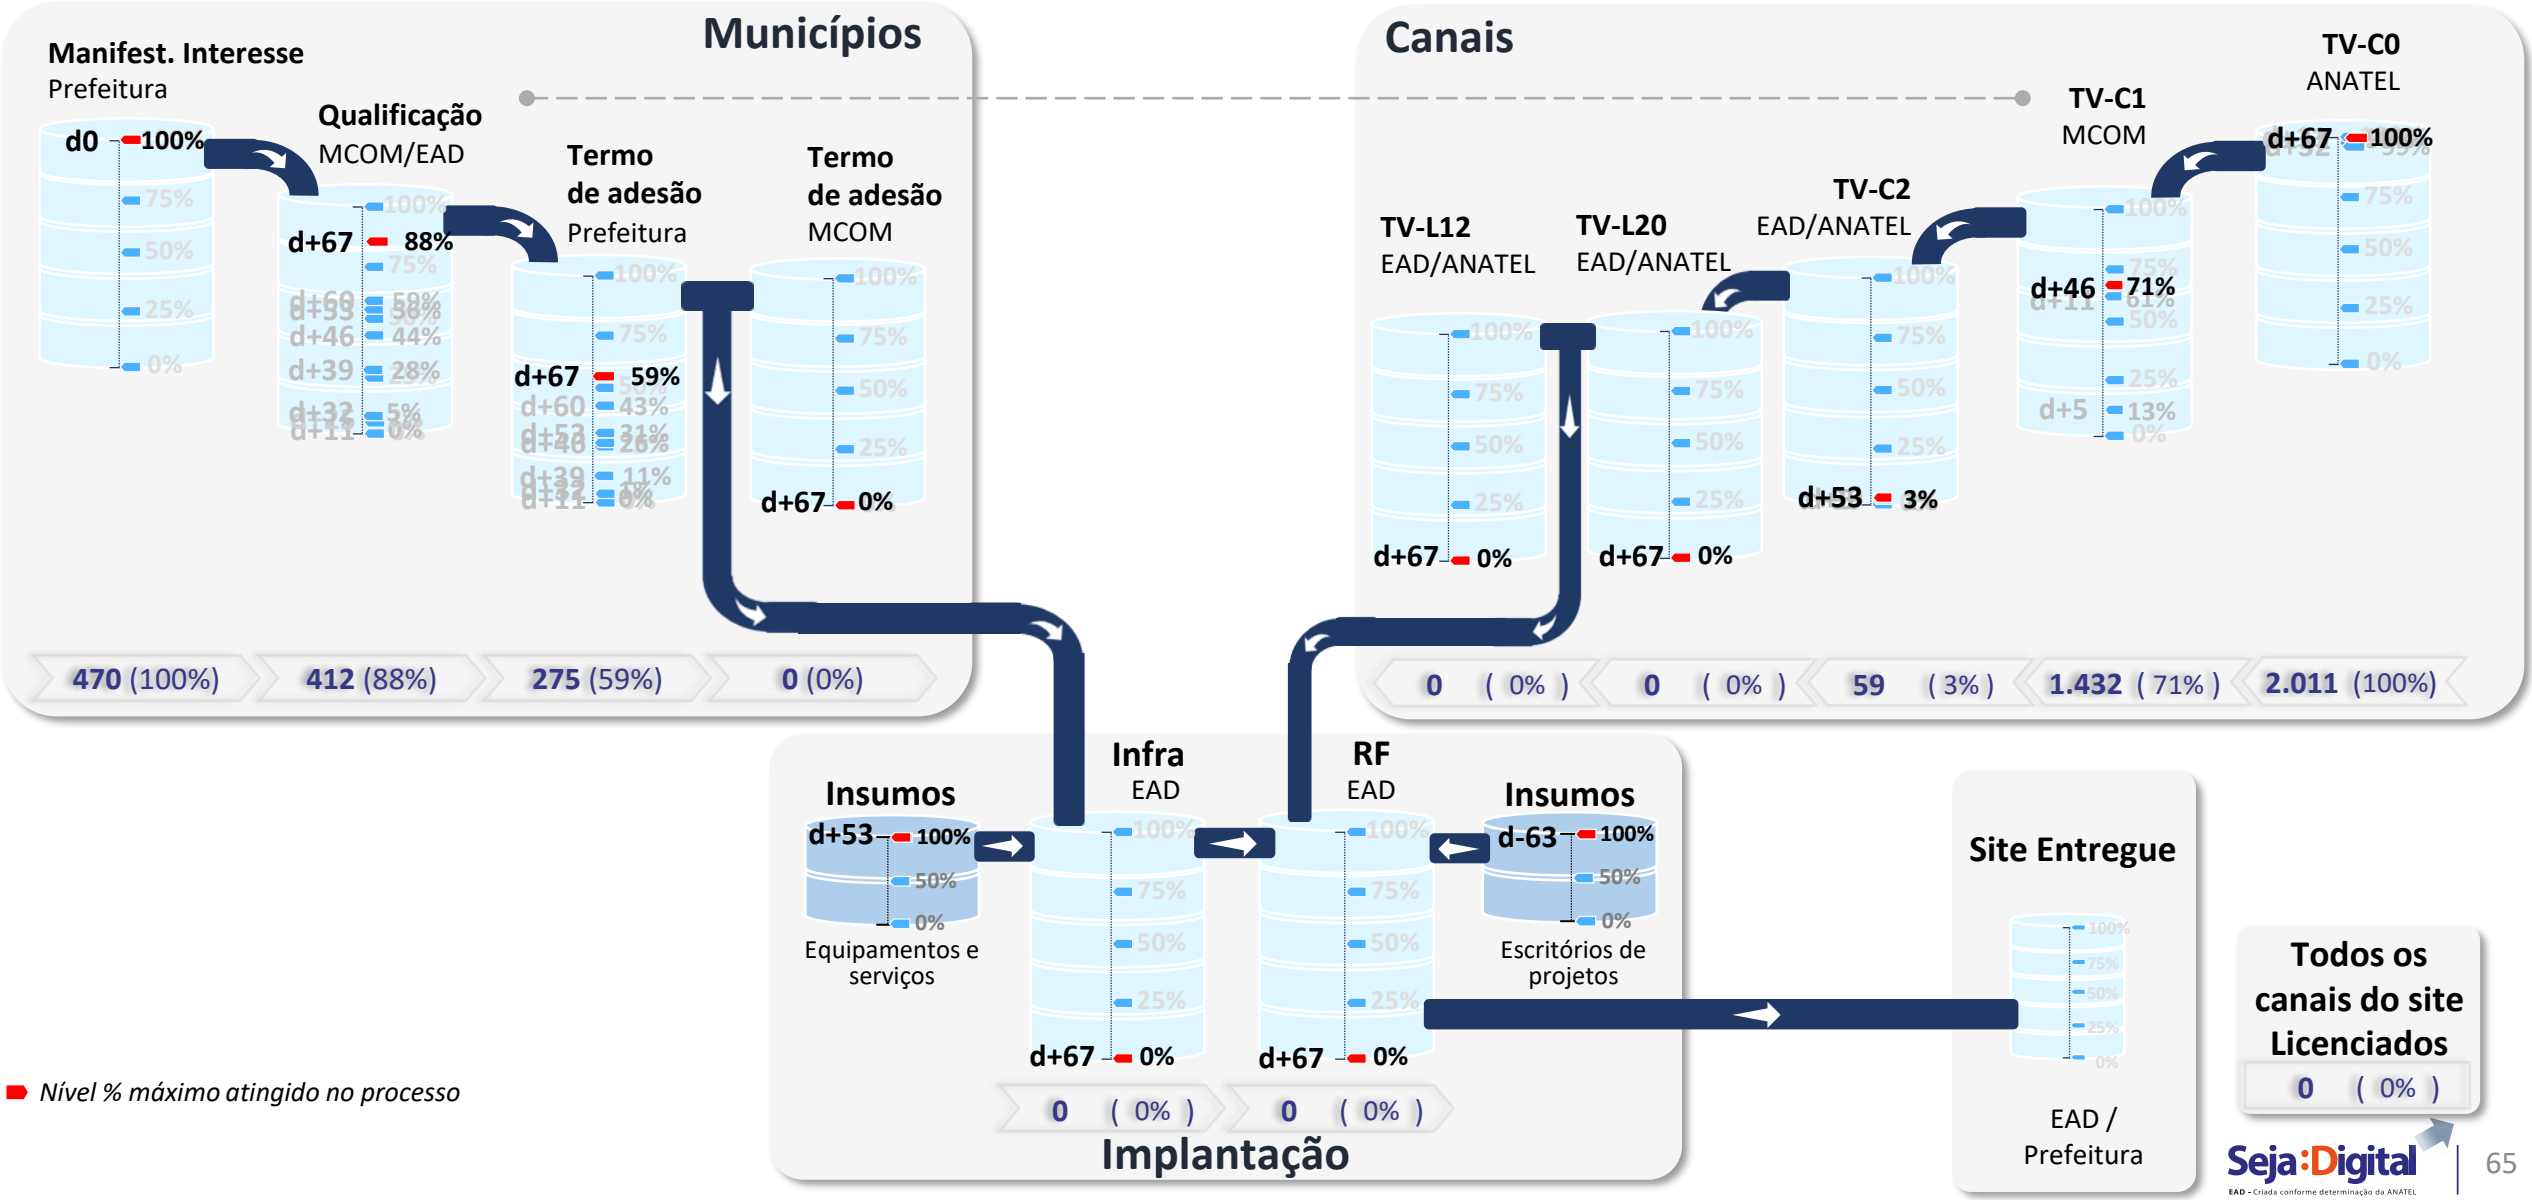

Nível % máximo atingido no processo

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.016 CANAIS • EDITAL ENCERRA EM 11/NOV/21 = d0

17/Jan/22
Status d+67

Manifestação de interesse da entidade

Entidade

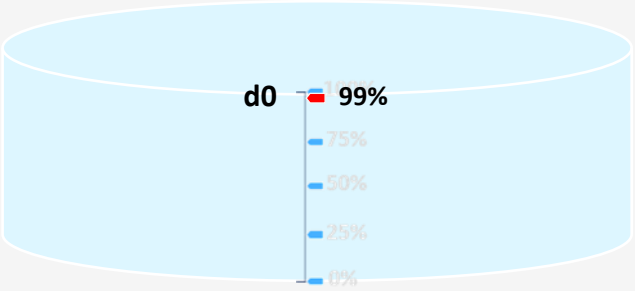

466 (99%)

VTA positiva da entidade manifestante

EAD

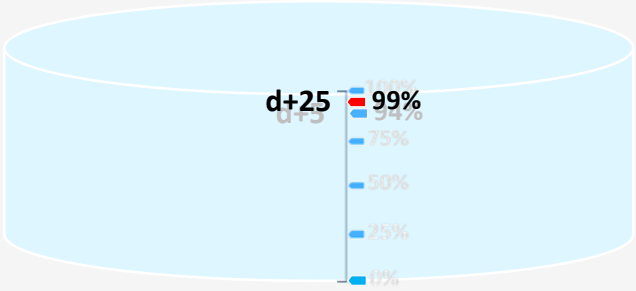

466 (99%)

Entidade manifestante qualificada

MCOM

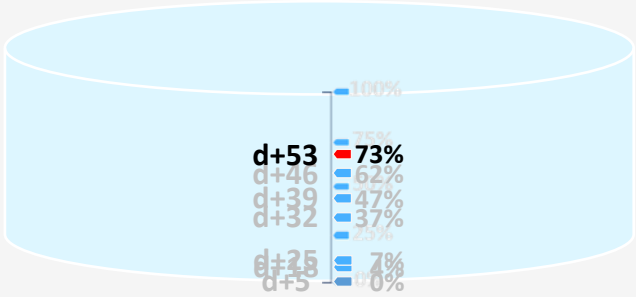

344 (73%)

Local Habilitado

Prefeitura / EAD

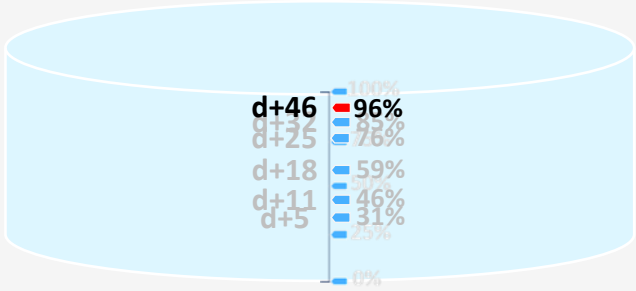

451 (96%)

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

Nível % máximo atingido no processo

P1 • MUNICÍPIOS PENDENTES

FASE 1.4 • 470 MUNICÍPIOS • 2.012 CANAIS • EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 = d0

17/Jan/22
Status d+67

Fase	Município	População	Interesse do Município	Interesse da Entidade	Entidade qualificada	Canal Digital em operação	Habilitação de local	Termo de Adesão Prefeitura	STM	Bloqueia Infra?	Bloqueia RF?
1.4	Água Boa/MG	13.600	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	Pedras de Maria da Cruz/MG	11.453	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	São Romão/MG	12.139	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	Santo Antônio do Rio Abaixo/MG	1.770	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	Águas Vermelhas/MG	13.477	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	Bandeira/MG	4.825	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	3	SIM	SIM
1.4	Bom Jesus do Amparo/MG	6.031	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	4	SIM	SIM

P2 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - FASE 1.4

17/Jan/22
Status d+67

Temos 123 entidades sem manifestação de interesse na Fase 1.4.

P3 • CANAIS PENDENTES

ENTIDADES COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAÇÃO - FASE 1.4

17/Jan/22
Status d+67

Temos 128 entidades com manifestação de interesse e sem qualificação, na Fase 1.4.

P4 • CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.4

17/Jan/22
Status d+67

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Analógico	STM Original	STM Projetado	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.4	MG	Arceburgo	FUNDACAO SECULO VINTE E UM	14	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Arceburgo	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DO SUDOES	45	STM 5	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Paraisópolis	FUNDACAO SECULO VINTE E UM	2	STM 7	STM 6	SIM	SIM
1.4	MG	Pedralva	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	São Thomé das Letras	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	NA	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Serrania	TELEVISAO SOCIEDADE LIMITADA	27	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Serrania	FUNDACAO TELEVISAO EDUCATIVA DE POCOS DE C	51	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Serrania	CAMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 7	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Cachoeira Dourada	REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA	13	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Cachoeira Dourada	RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA	30	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Campanário	MUNICIPIO DE CAMPANARIO	6	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Cordislândia	CAMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.4	MG	Itueta	MUNICIPIO DE ITUETA	9	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Moeda	CAMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Piedade de Ponte Nova	CAMARA DOS DEPUTADOS	NA	STM 3	STM 2	NÃO	SIM
1.4	MG	Pouso Alto	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	7	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.4	MG	Santo Antônio do Grama	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS G	16	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Soledade de Minas	TELEVISAO SUL DE MINAS S/A	9	STM 5	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Carlos Chagas	SECRETARIADEESTADODEPLANEJAMENTOEGESTAC	6	STM 7	STM 6	NÃO	SIM
1.4	MG	Itapeva	Televisão Sul de Minas S/A.	9	STM 4	STM 3	NÃO	SIM
1.4	MG	Santo Antônio do Itambé	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GEST	45	STM 6	STM 4	NÃO	SIM
1.4	MG	Santo Antônio do Itambé	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GEST	33	STM 6	STM 4	NÃO	SIM

P5 • CANAIS PENDENTES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.4

17/Jan/22
Status d+67

NÃO HÁ CANAL COM PENDÊNCIA

P6 • CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.4

17/Jan/22
Status d+67

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.4	MG	Campos Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	25	STM 4	SIM	SIM
1.4	MG	Campos Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	44	STM 4	SIM	SIM
1.4	MG	Extrema	PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	19	STM 5	SIM	SIM
1.4	MG	Extrema	PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	44	STM 5	SIM	SIM
1.4	MG	Extrema	PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	42	STM 5	SIM	SIM
1.4	MG	Miradouro	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	30	STM 5	SIM	SIM
1.4	MG	Miradouro	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	30	STM 5	SIM	SIM
1.4	MG	Serrania	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	36	STM 7	SIM	SIM
1.4	MG	Serrania	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	41	STM 7	SIM	SIM
1.4	MG	Carlos Chagas	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	17	STM 6	SIM	SIM
1.4	MG	Carlos Chagas	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	36	STM 6	SIM	SIM
1.4	MG	Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	19	STM 7	SIM	SIM
1.4	MG	Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	24	STM 7	SIM	SIM
1.4	MG	Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	31	STM 7	SIM	SIM

P6 • CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADE COM MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.4

17/Jan/22
Status d+67

Fase	UF	Município	Entidade Detentora da Autorização EDA	Canal Digital	STM Original	Bloqueia Infra?*	Bloqueia RF?
1.4	MG	São Gotardo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	20	STM 10	SIM	SIM
1.4	MG	São Gotardo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	31	STM 10	SIM	SIM
1.4	MG	Cedro do Abaeté	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	17	STM 6	SIM	SIM
1.4	MG	Cedro do Abaeté	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	31	STM 6	SIM	SIM
1.4	MG	Cedro do Abaeté	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	41	STM 6	SIM	SIM
1.4	MG	Córrego Danta	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	24	STM 9	SIM	SIM
1.4	MG	Córrego Danta	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	36	STM 9	SIM	SIM
1.4	MG	Córrego Danta	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	31	STM 9	SIM	SIM
1.4	MG	Córrego Danta	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	41	STM 9	SIM	SIM
1.4	MG	Morro da Garça	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	30	STM 7	SIM	SIM
1.4	MG	Morro da Garça	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	17	STM 7	SIM	SIM
1.4	MG	Morro da Garça	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	21	STM 7	SIM	SIM
1.4	MG	Morro da Garça	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	44	STM 7	SIM	SIM
1.4	MG	Tiros	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIROS	20	STM 6	SIM	SIM
1.4	MG	Tiros	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIROS	30	STM 6	SIM	SIM

FLUXO TIPO

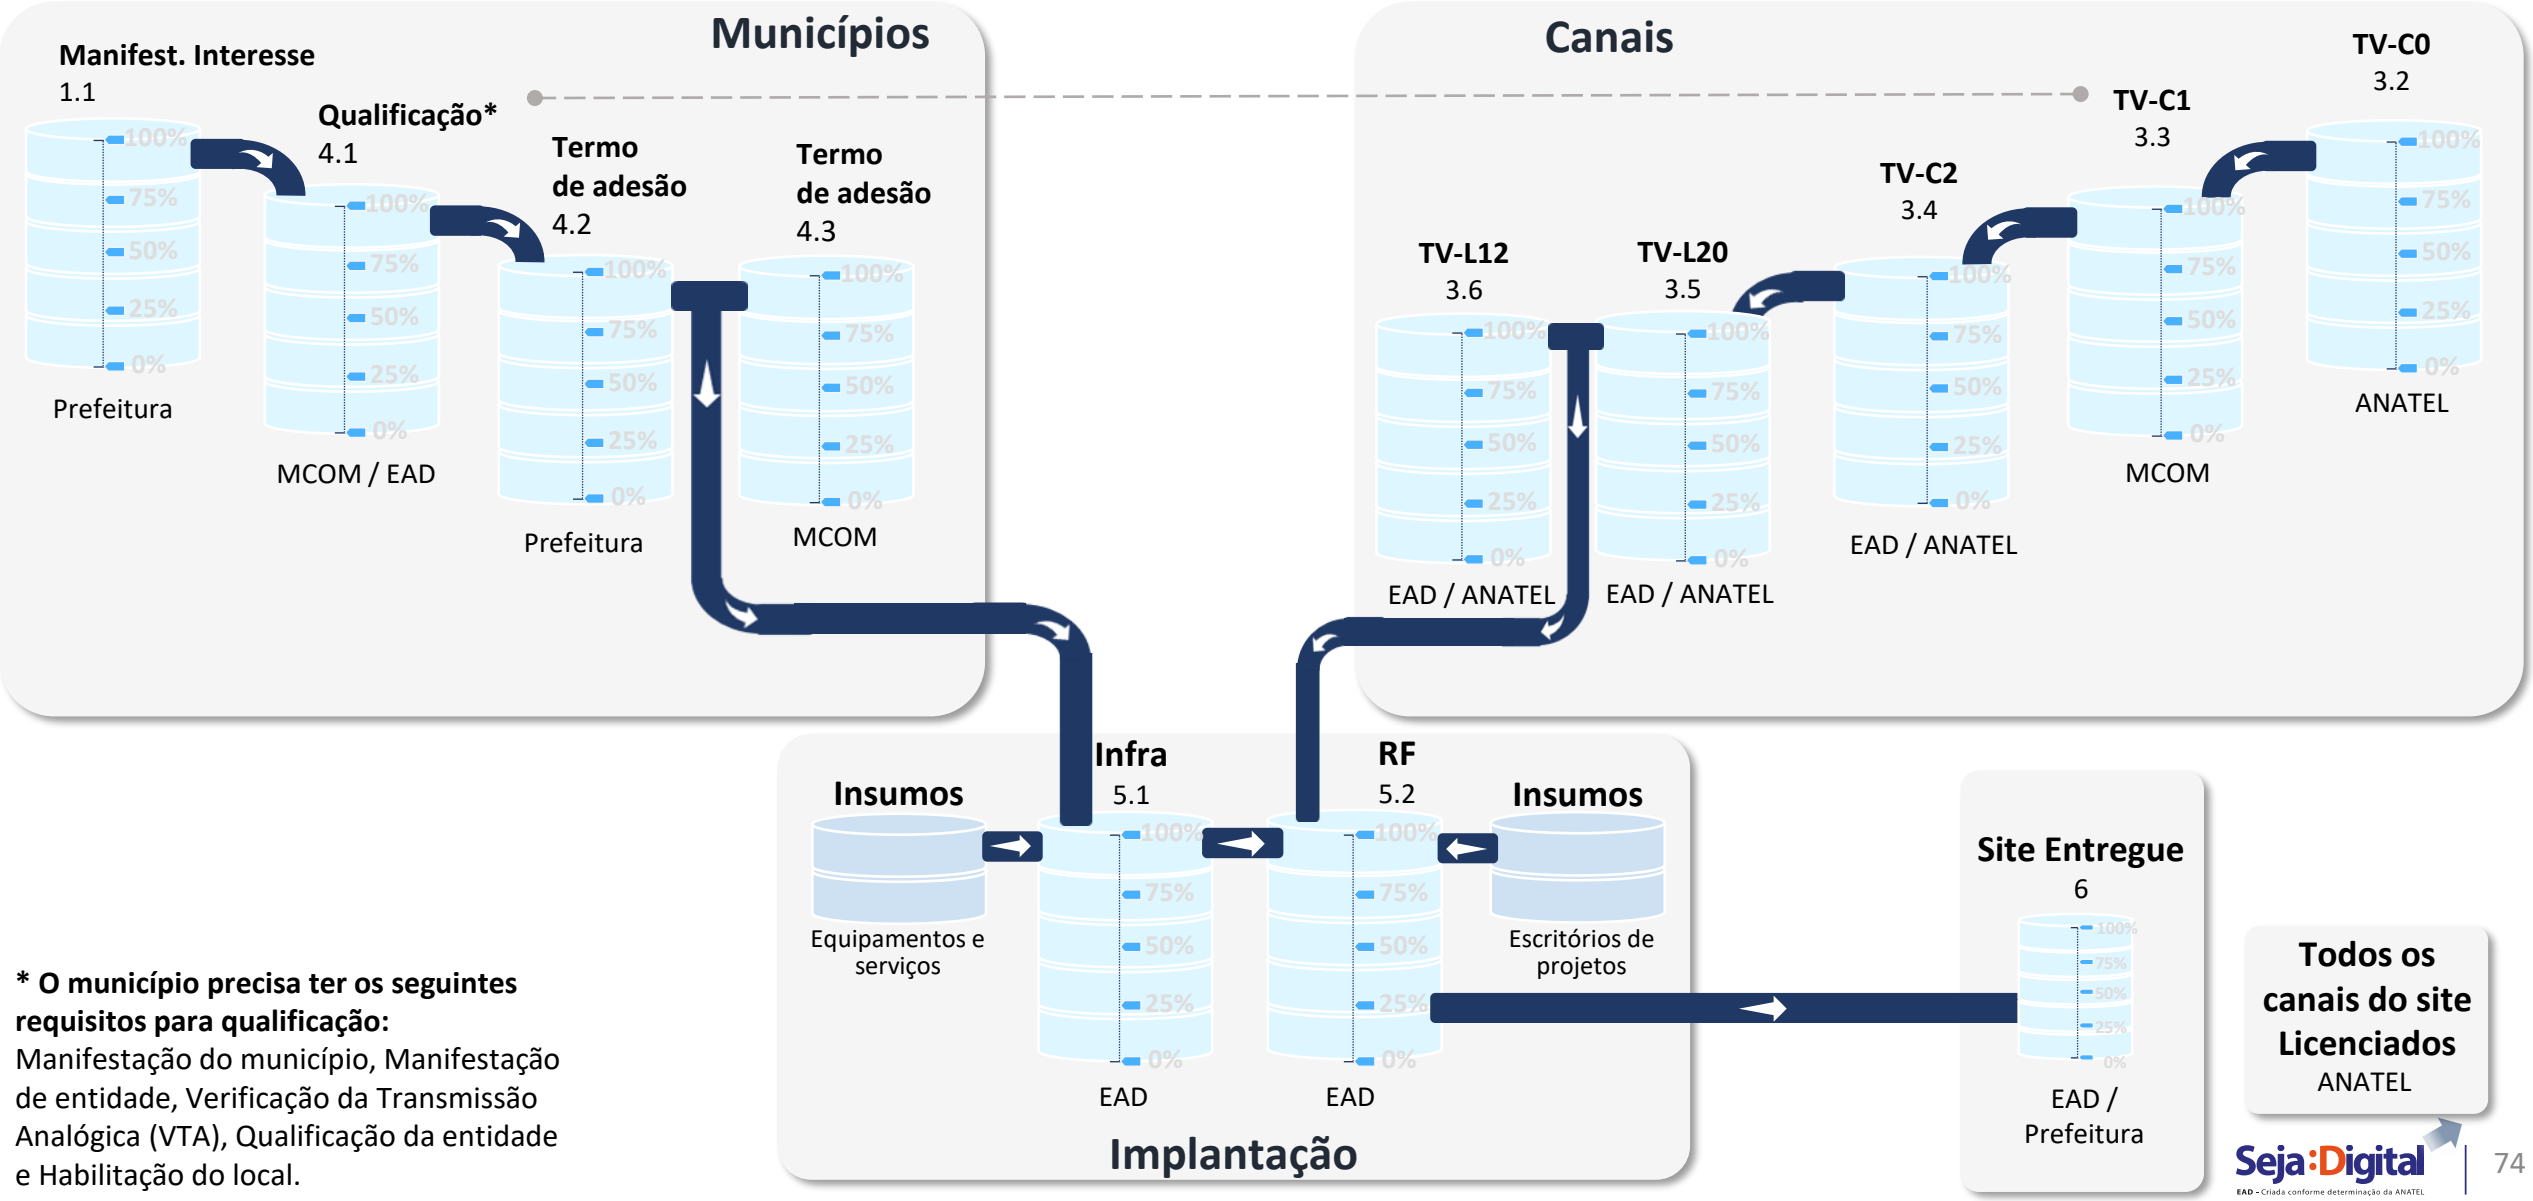

*** O município precisa ter os seguintes requisitos para qualificação:**
Manifestação do município, Manifestação de entidade, Verificação da Transmissão Analógica (VTA), Qualificação da entidade e Habilitação do local.

QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

Manifestação de interesse da entidade
2.1

Entidade

VTA positiva da entidade manifestante
2.2

EAD

Entidade manifestante qualificada
2.3

MCOM

Local Habilitado
1.2

Prefeitura / EAD

O município precisa dos requisitos acima para sua qualificação

ESTEIRA

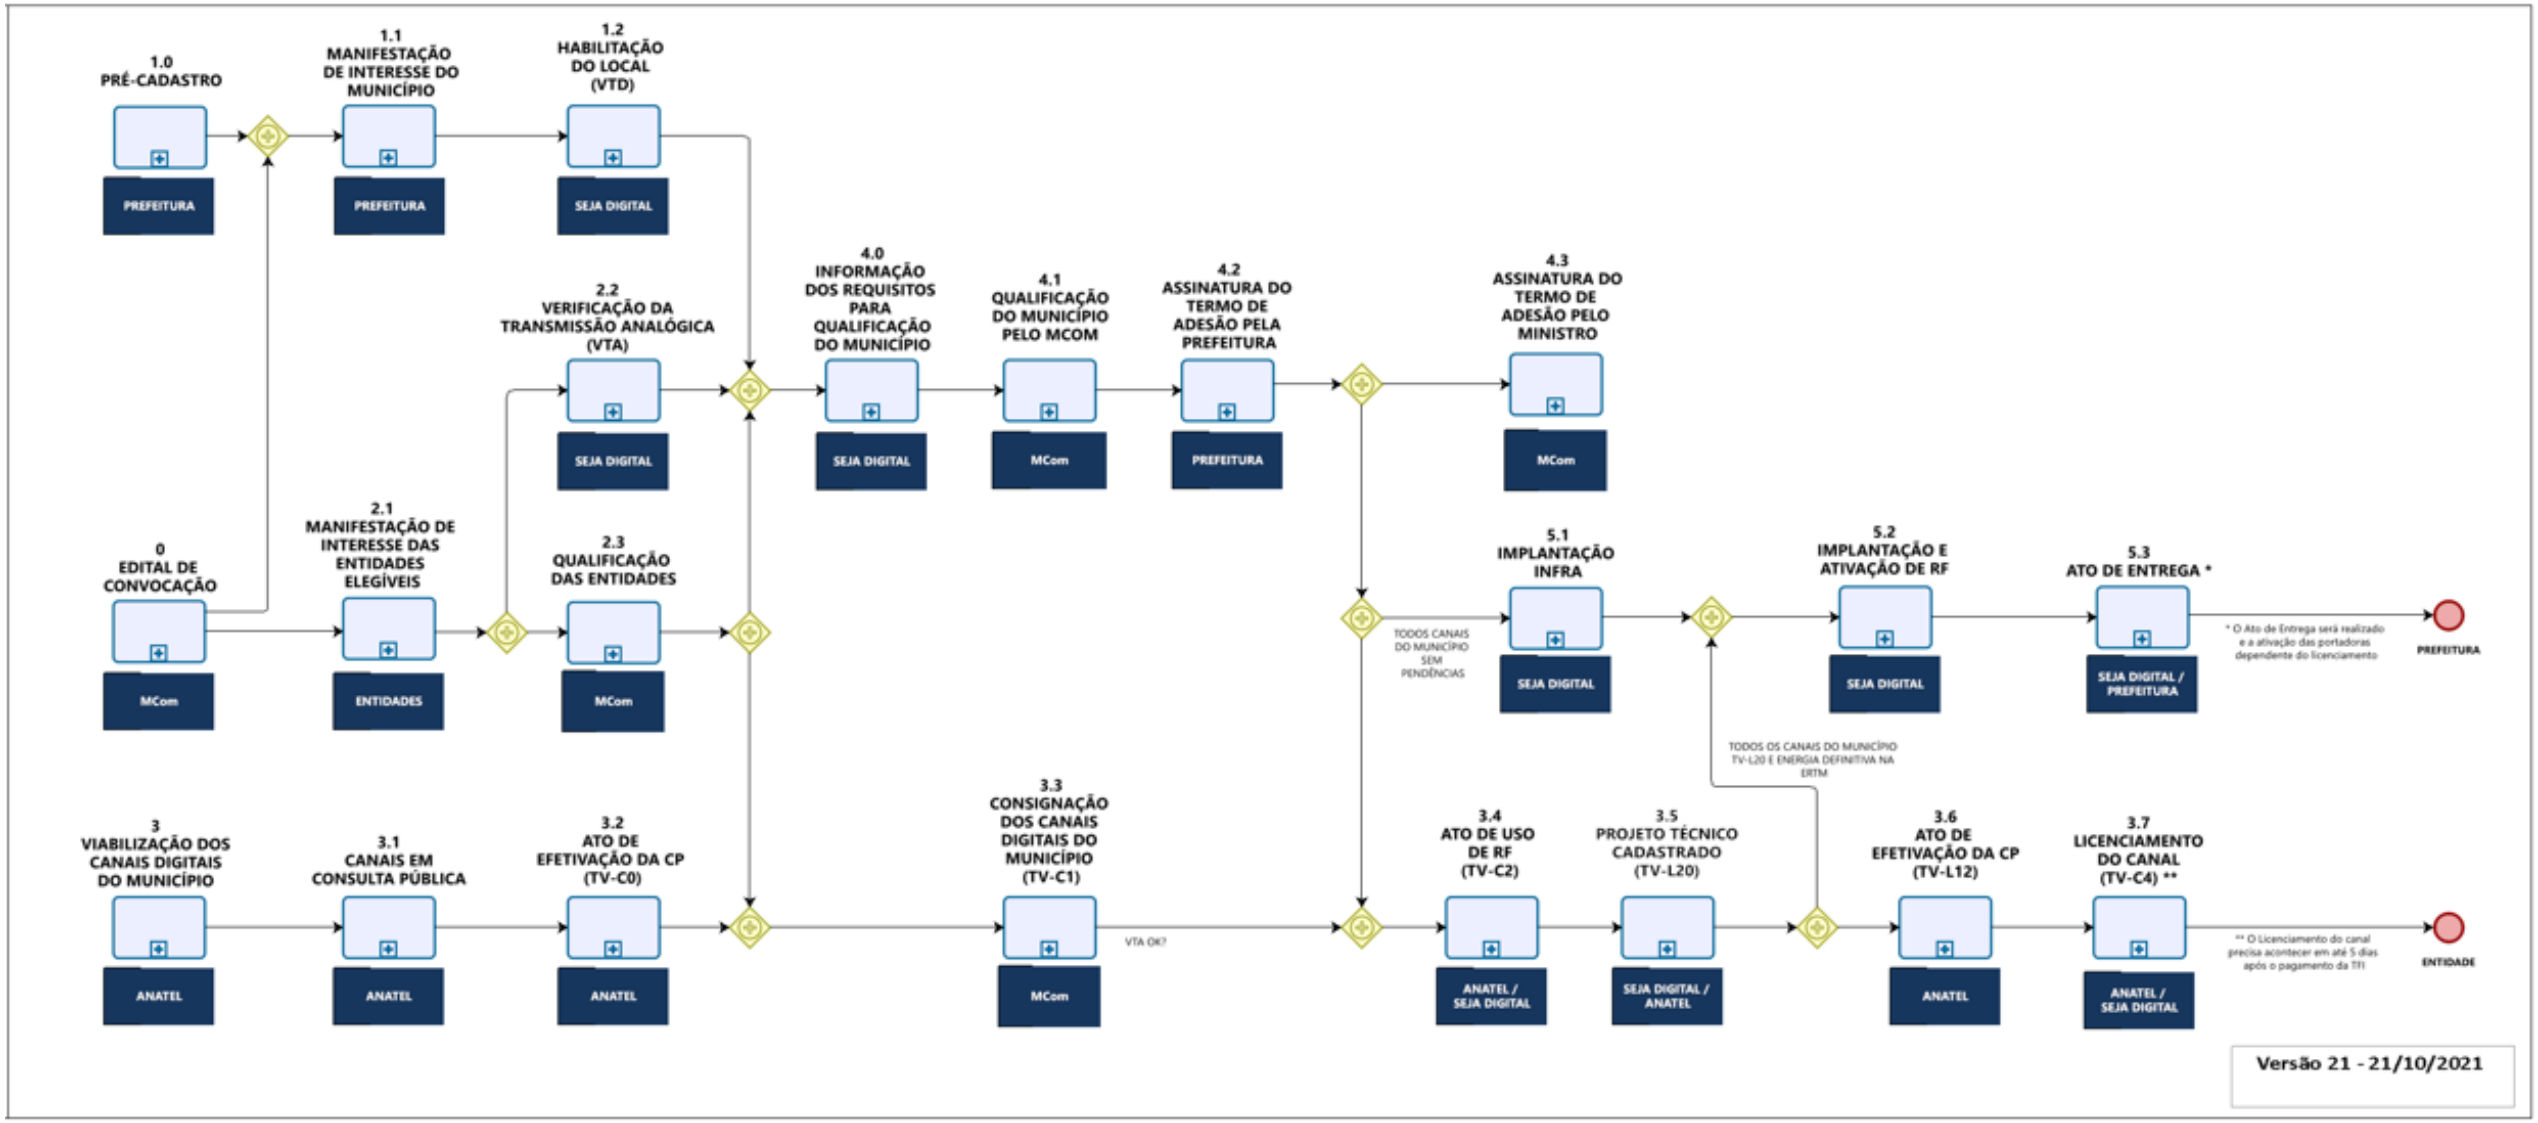
1.0
PRÉ-CADASTRO
PREFEITURA
1.1
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
PREFEITURA
1.2
HABILITAÇÃO DO LOCAL (VTD)
SEJA DIGITAL
0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
MCom
2.1
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DAS ENTIDADES ELEGÍVEIS
ENTIDADES
2.2
VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO ANALÓGICA (VTA)
SEJA DIGITAL
2.3
QUALIFICAÇÃO DAS ENTIDADES
MCom
4.0
INFORMAÇÃO DOS REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO
SEJA DIGITAL
4.1
QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO PELO MCOM
MCom
4.2
ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO PELA PREFEITURA
PREFEITURA
4.3
ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO PELO MINISTRO
MCom
TODOS CANAIS DO MUNICÍPIO SEM PENDÊNCIAS
5.1
IMPLANTAÇÃO INFRA
SEJA DIGITAL
5.2
IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DE RF
SEJA DIGITAL
5.3
ATO DE ENTREGA *
SEJA DIGITAL / PREFEITURA
* O Ato de Entrega será realizado e a ativação das portadoras dependente do licenciamento
PREFEITURA
TODOS OS CANAIS DO MUNICÍPIO TV-L20 E ENERGIA DEFINITIVA NA ERTM
3
VIABILIZAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO
ANATEL
3.1
CANAIS EM CONSULTA PÚBLICA
ANATEL
3.2
ATO DE EFETIVAÇÃO DA CP (TV-C0)
ANATEL
3.3
CONSIGNAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO (TV-C1)
MCom
VTA OK?
3.4
ATO DE USO DE RF (TV-C2)
ANATEL / SEJA DIGITAL
3.5
PROJETO TÉCNICO CADASTRADO (TV-L20)
SEJA DIGITAL / ANATEL
3.6
ATO DE EFETIVAÇÃO DA CP (TV-L12)
ANATEL
3.7
LICENCIAMENTO DO CANAL (TV-C4) **
ANATEL / SEJA DIGITAL
** O Licenciamento do canal precisa acontecer em até 5 dias após o pagamento da TFI
ENTIDADE
Versão 21 - 21/10/2021

Seja:Digital

EAD - Criada conforme determinação da ANATEL
