



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED

Data: 13 de dezembro de 2022 (terça-feira).

Horário: 10h00h às 12:00h.

Local: Reunião remota.

LISTA DE PRESENÇA E OUTROS PARTICIPANTES

MEMBROS DO GIRED PRESENTES:

Moisés Queiroz Moreira - Presidente do Gired - Anatel

Vinicius Oliveira Caram Guimarães – Secretário do GIRED – Anatel

Carlos Eduardo Neiva Melo (suplente)

Flávio Lara Resende - Titular (Titular)

Luiz Carlos Abrahão – Radiodifusão (suplente)

Cristiano Lobato Flores – Radiodifusão (suplente)

Marcus Vinicius Brunetti – Telefônica Brasil S.A. (suplente)

Margaret de Almeida Cadete Moonsammy - Algar Telecom (suplente)

Monique Pereira Ibitinga de Barros - Claro (Suplente)

REPRESENTAÇÃO EXCEPCIONAL:

João Camilo Júnior - Radiodifusão (SBT), substituindo o representante da Radiodifusão, Roberto Dias Lima.

Sebastião Sérgio de Oliveira Junior - TIM, substituindo o representante da TIM, Mario Girasole

OUTROS PARTICIPANTES:

Ana Eliza Faria e Silva - Globo

Antônio Carlos Martelletto – EAD

Carlos Saldanha – EAD

Cintia da Conceição Landim - Anatel (terceirizada)

Daniela Naufel Schettino - MCom

Fernando César Britto de Araújo - EAD

Francisco de Assis Campos Peres – SET

Gunnar Bedicks – EAD
Heloísa Helena de Macedo Almeida - Band
Henrique Gomes Pinheiro - Anatel
Karine Medeiros Dias - Anatel
Luis Renato Giffoni Rodrigues - Anatel
Martim Jales Hon - Anatel
Oséias Fonseca de Aguiar - Anatel
Paula Fontelles de Aguiar - Anatel
Paulo Vaggione – EAD
Pedro Macambira Braga - Anatel
Renato de Campos Ribeiro - EAD
Roberto Ramos Colletti - MCom
Sidney Azeredo Nince - Anatel
Thiago Aguiar Soares – MCom

ASSUNTOS:

1. ABERTURA DO GIRED.

O **Presidente do GIRED, Conselheiro Moises Queiroz Moreira**, cumprimentou a todos e deu início à 85ª Reunião Ordinária do GIRED e registrou nota de pesar pelo falecimento do servidor da Anatel, o engenheiro **Sr. Marcos Dionisio Candido Dutra**, que trabalhou ativamente e envidou os esforços necessários ao desempenho deste Grupo, ressaltando que todos estão muito saudosos e enlutados e aproveitou para agradecer o serviço por ele prestado, reconhecido amplamente por todo o setor da radiodifusão. Manifestou também nota pesar pelo falecimento do **Monsenhor Jonas Abib**, fundador da comunidade Canção Nova, um importante veículo e radiodifusão.

Destacou a participação dos representantes excepcionais da Radiodifusão e das prestadoras, conforme solicitação das mesmas, tendo sido encaminhadas as devidas procurações tempestivamente, a saber:

- **Sr. Sebastião Sérgio**, substituindo o representante **Sr. Mario Girasole**;
- **Sr. João Camilo**, substituindo o representante **Sr. Roberto Franco**;

Ato contínuo, o **Presidente do GIRED** passou para o item 1 da Pauta.

2. ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2022.

O **Presidente do GIRED** registrou que foram recebidas solicitações de ajustes pontuais a serem realizadas na minuta de ata encaminhada, de forma que tais apontamentos foram contemplados e serão incorporados na Ata da 84ª Reunião Ordinária do GIRED, estando disponível a qualquer interessado no processo de acompanhamento do projeto.

Ato contínuo, o **Presidente do GIRED** questionou aos presentes se haveria mais ajustes em relação à minuta encaminhada.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** declarou aprovada a Ata da 84ª Reunião Ordinária e passou para o item 2 da Pauta.

3. ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD).

O **Presidente do GIRED** solicitou que o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** fizesse uma breve apresentação quanto ao Informe das atividades da EAD.

O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** cumprimentou a todos e iniciou a apresentação do Informe da EAD pelo tópico da Mitigação informando que foram ativadas 27 cidades em outubro de 2022 e 18 em novembro de 2022, restando 127 cidades ainda sem ativação do 4G no 700 MHz. Sobre os registros de fontes interferentes no LTE, reportou que, no período de outubro e novembro de 2022, tiveram o total de 30 registros, sendo 1 de TV; 12 de Outros Serviços de Telecomunicações; 3 de Radiação não intencional; 2 de Radiação restrita; e 12 de Outras fontes não caracterizadas.


O **Sr. Antonio Carlos Martelletto**, no tópico Projeto TV Digital, apresentou um rápido histórico de como terminou o ano de 2021, bem como o *status* da esteira desse projeto referente ao ano de 2022, conforme os *slides* abaixo reproduzidos:



Em seguida, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** projetou outro *slide*, abaixo reproduzido, que apresenta a visão de 2023 para o *status* da esteira do Projeto TV Digital, partindo da premissa do que se tem para ser executado neste momento:



Na sequência, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** passou para a esteira dos canais relatando, inicialmente como terminou o ano de 2021 e, posteriormente, como terminou o ano de 2022, conforme os *slides* abaixo reproduzidos:

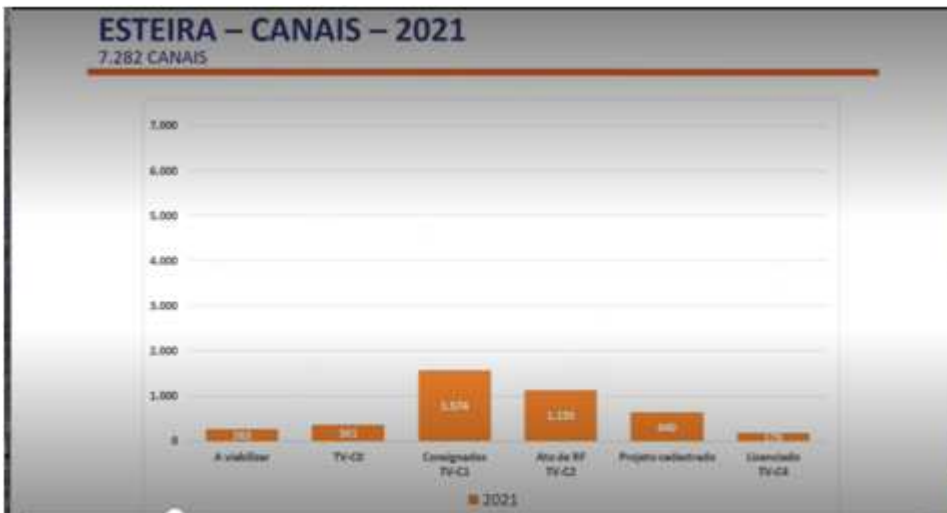

Concedida a palavra, o **Sr. Gunnar Bedicks** registrou, em nome de toda a equipe da EAD, o pesar pelo falecimento do engenheiro **Sr. Marcos Dionisio Candido Dutra**, haja vista que, ao longo do projeto Digitaliza Brasil, foi peça chave e fundamental pelo sucesso alcançado, pelo volume de canais e pelo andamento da esteira.

Dando continuidade à sua apresentação, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** projetou o *slide* abaixo reproduzido que demonstra o resumo da situação atual em relação ao plano e ao que foi realizado em termos de infraestrutura:

PLANO X REAL - INFRA
Ref.: 12/Dez/22

INFRA		Atual, até Dez/22	dez-22 (previsão)	jan-23 (previsão)	fev-23 (previsão)	mar-23 (previsão)	TOTAL	TOTAL da FASE	Pendência	Ordem de Produção
Fases 1.1/1.2	GIRED (Dez/21)	183					183			
	GIRED c/ premissas	183					183	258	24	234
	Realizado	233		1			234			
Fase 1.3	GIRED (Dez/21)	330					330			
	GIRED c/ premissas	244					244	322	31	315
	Realizado	269	10	12			291			
Fase 1.4	GIRED (Dez/21)	490					490			
	GIRED c/ premissas	463					463	470	20	456
	Realizado	450					450			
Fase 2	GIRED (Dez/21)	560					560			
	GIRED c/ premissas	320					320	544	70	285
	Realizado	85	51	66	72		274			
Fase 3	GIRED (Dez/21)	110	140				250			
	GIRED c/ premissas	96					96	244	147	97
	Realizado	2	30	65			97			
TOTAL	GIRED (Dez/21)	1.473	140				1.613			
	GIRED c/ premissas	1.306					1.306	1.638	292	1.387
	Realizado	1.015	91	144	72	0	1.346			

O Sr. Antonio Carlos Martelletto teceu os seguintes comentários sobre esse *slide*.

(i) Agrupando-se as Fases 1.1 e 1.2, destacou que 183 estações estavam planejadas e que foram realizadas 233. Segundo sua explicação, a diferença a maior entre o planejado e o realizado significa que, após o período definido surgiram estações que foram liberadas das suas pendências e foram executadas. Para essas Fases, ressaltou que ainda há mais uma planejada para janeiro de 2023, perfazendo um total de 234, sendo que o total da Fase prevê 258, estando 24 com pendências e que o registro de desqualificação será assunto a ser tratado mais a frente;

(ii) Para a Fase 1.3, informou que GIRED com premissas tem 244 infraestruturas, de um total de 330, e foram realizadas 269, sendo que a previsão é implantar 10 infraestruturas até dezembro de 2022 e 12 para janeiro, finalizando o que há para execução nesta Fase, chegando a 291 de um total da Fase de 322, estando 31 com pendências;

(iii) Para a Fase 1.4, relatou que GIRED com premissas tem 463 infraestruturas e foram realizadas 450, estando 20 com pendências;

(iv) Para a Fase 2, assinalou que há 85 realizadas e, com o planejamento até fevereiro de 2023, o total realizado será de 274, estando ainda 70 estações com pendências; e

(v) Para a Fase 3, registrou que realizaram 2, com planejamento de 30 para dezembro de 2022 e 65 em janeiro de 2023.

Ao final dos comentários acerca do *slide* acima reproduzido, o Sr. Antonio Carlos Martelletto destacou que o planejamento de implantação de infraestrutura será finalizado em fevereiro de 2023 e que há 292 municípios com pendências.

Em seguida, o Sr. Antonio Carlos Martelletto projetou o *slide* abaixo reproduzido que demonstra o resumo da situação atual em relação ao plano e ao que foi realizado em termos de RF:

PLANO X REAL - RF
Ref.: 12/Dez/22

R#		Anum. até Dez/22	dez-22 (previsão)	jan-23 (previsão)	fev-23 (previsão)	mar-23 (previsão)	TOTAL	TOTAL da FASE	Pendências	Ordem de Produção
Fases 1.1/1.2	GRID (Dez/21)	183					183			
	GRID c/ premissas	181					181	258	29	233
	Realizado	227	2				229		(3 desquadr.)	
Fase 1.3	GRID (Dez/21)	330					330			
	GRID c/ premissas	244					244	322	128	276
	Realizado	10	50	100	34		194		(2 desquadr.)	
Fase 1.4	GRID (Dez/21)	390	50				440			
	GRID c/ premissas	368	47				415	470	81	442
	Realizado	354	21	14			389		(3 desquadr.)	
Fase 2	GRID (Dez/21)	360					360			
	GRID c/ premissas	320					320	344	182	175
	Realizado	0			66	96	162		(2 desquadr.)	
Fase 3	GRID (Dez/21)	0	110	140			250			
	GRID c/ premissas	0	48	48			96	244	153	46
	Realizado	0	2	8	23	56	91		(11 desquadr.)	
TOTAL	GRID (Dez/21)	1.263	180	140			1.563			
	GRID c/ premissas	1.116	95	48			1.259	1.638	573	1.172
	Realizado	591	75	172	125	132	1.065		(26 desquadr.)	

Sobre esse *slide*, o Sr. Antonio Carlos Martelletto destacou o quadro resumo, na parte final do *slide*, para informar que o total é de 1638 municípios e que, ao final de março de 2023, chegará a 1065 estações realizadas, estando 573 com pendências, o que, em sua visão, inviabiliza o trabalho de campo a ser executado para implantar a RF.

O Sr. Antonio Carlos Martelletto prosseguiu para o próximo item da sua apresentação que se refere ao acompanhamento do *Status* dos Cercamentos cujo *slide* segue abaixo reproduzido, ressaltando que metade das estações que foram concluídas estão com cercamento e as outras estão em processo trabalhado junto às Prefeituras:



Em seguida, o Sr. Antonio Carlos Martelletto apresentou *slides* com fotos das estações com cercamentos, bem como reportou, à título de comunicação ao Grupo, o acompanhamento das adequações nas ERTMS, conforme abaixo reproduzidos:

ADEQUAÇÕES NAS ERTMS

Ref.: 09/Dez/22

Descrição	Qtd. de casos
Engenharia de Produto	339
Manutenções	154
Sinistro	13

Seja Digital

SINISTRO – ROUBO OU FURTO E CASOS FORTUITOS



STMs



Telessupervisão



Descarga atmosférica

Prosseguindo na sua apresentação, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** passou a reportar as pendências do PDB – TV DIGITAL, conforme *slide* abaixo reproduzido:

PENDÊNCIAS DO PDB - TV DIGITAL

PENDÊNCIAS DO PDB - MUNICÍPIOS

	Qtd. Municípios		Observação
	28/out/22	12/dez/22	
Lista 1 - DR4 - Termo de Adesão não assinado	49	29	Cartas MCom - Lista 1 - Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município sem manifestação de Interesse (inclusive rechamada)	3	3	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município sem manifestação qualificada (inclusive rechamada)	28	28	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município com canal(is) digitalizado(s) pelo RDF	13	13	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município com canal(is) digitalizado(s) pelo RDF e sem qualificação da entidade (inclusive rechamada)	1	1	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Municípios conurbados, estações colocalizadas	2	2	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Projeto não será implantado nesses municípios (retrato)	96	76	

PENDÊNCIAS DO PDB - CANAIS

	Qtd. Canais		
Canais analógicos sem viabilização do par digital		1	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Canais digitalizados pelo RDF		89	Informado ao GIRED - Ofício protocolado
Os canais não serão implantados nos municípios (retrato)		90	

Sobre esse *slide* destacou o seguinte:

(i) A Lista 1 – DR4 tem 202 municípios nas seguintes situações: 40 em local não habilitado, 113 sem energia elétrica e 49 sem Termo de Adesão assinado, sendo que o Ministério e a EAD fizeram uma comunicação a esses municípios. Especificamente sobre os 49 municípios sem Termos de Adesão assinados, registrou que a ação de comunicação surtiu efeitos positivos, haja vista que em 28 de outubro de 2022 havia 49 municípios nessa situação e em 12 de

dezembro de 2022, apenas 29 permanecem nessa situação, encaminhando-se nesta Reunião Ordinária do GIRED a sugestão de exclusão desses 29 municípios sem Termos de Adesão assinados;

(ii) Ao listar as pendências do PDB Municípios, reportou que, em 28 de outubro de 2022, havia 96 municípios com pendências e, em 12 de dezembro de 2022, há 76 municípios com pendências e que esse ponto será objeto de manifestação do GIRED; e

(iii) Nas pendências PDB Canais, assinalou que há 1 canal analógico sem viabilização do par digital que será objeto de manifestação do GIRED, e que há 89 canais digitalizados pelo Radiodifusor que foi informado ao GIRED por meio de Ofício protocolizado.

Ato contínuo, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** apresentou um quadro resumo das pendências do PDB – TV DIGITAL, cujos números apresentados levam em consideração o que será objeto de deliberação nesta Reunião Ordinária, registrado nos *slides* abaixo reproduzidos:

PENDÊNCIAS DO PDB - TV DIGITAL
QUADRO

	Canais analógicos		Municípios	
	Potencial	Realizado	Impactados	Excluídos
Total de elegíveis no PDB	4.006	NA	1.638	0
Total de canais analógicos à excluir do PDB por não implantação do projeto no município	294	0	76	0
Total de canais analógicos à excluir do PDB em municípios com implantação do projeto	90	0	79	NA
Total à desqualificar do PDB (retrato)	384	0	76	0

PENDÊNCIAS DO PDB - TV DIGITAL
DR4 – LISTA 2

Descrição - DR4 - Lista 2	Fase 1.2	Fase 1.3	Fase 1.4	Fase 2	Fase 3	TOTAL
Local não habilitado		4		2		6
Não disponibilização de energia elétrica		19	7	11		37
Termo de Adesão não assinado	1			6	3	10
TOTAL	1	23	7	19	3	53

O **Sr. Antonio Carlos Martelletto** apresentou um retrato dos municípios PDB que resume tudo o que foi falado até este momento da Reunião Ordinária, no qual dos 1638 municípios do PDB 2021, excluindo-se os 76 municípios desqualificados objeto da presente deliberação pelo GIRED, restariam 1562 municípios do PDB (dezembro de 2022), e retirando-se 102 sem Termo de Adesão assinado, restariam 1460, em 12 de dezembro de 2022. Prosseguiu informando que desses 1460, retirando-se os 114 por pendências da ordem de troca de local (PPTA ou validação de local) ou avulsos, restariam 1346 infraestruturas programadas para

serem realizadas até março de 2023, e retirando-se 148 por pendência de energia e 133 por fluxo regulatório, restariam 1065 com RF programada até março de 2023.

O **Sr. Antonio Carlos Martelletto** ressaltou que a diferença entre 1.346 para 1.065, a medida que se resolva a última pendência, será encaminhado para produção e instalação ou, simplesmente, para a instalação, caso já tenha sido produzido, sendo que o prazo para a instalação varia de acordo com a situação do município, podendo chegar até 120 dias.

O **Sr. Antonio Carlos Martelletto** fez um simples registro sobre o fluxo das versões dos documentos PDB, nos termos do *slide* abaixo reproduzido:

FLUXO DAS VERSÕES DOS DOCUMENTOS PDB

Reunião	23/02/2021	13/03/2021	20/04/2021	24/06/2021	24/10/2021	07/12/2021	04/01/2022	04/04/2022
GIRED	74ª R.O.	75ª R.O.	76ª R.O.	77ª R.O.	78ª R.O.	79ª R.O.	82ª R.O.	83ª R.O.
Documento elaborados para...								
DR1 Documento Público e Instalação dos Municípios	Futura Portaria Mcom							
DR2 Documento Público e Instalação dos Municípios	Futura Portaria Mcom							
DR3 Designação de Canais	Futura Portaria Mcom							
DR4 Detalhamento dos Canais Antenas e Equipamentos	Versão 1			Versão 2		Versão 3		
DR5 Extensão dos Pontos Móveis				Versão 1				Versão 2
DT1 Detalhamento dos Equipamentos	Versão 1 (DT1)	Versão 2	Versão 3	Versão 4	Versão 5			Versão 6
DT2 Detalhamento dos Equipamentos								
DT3 Detalhamento dos Equipamentos	Versão 1	Versão 2	Versão 3	Versão 4	Versão 5	Versão 6		
DT4 Detalhamento dos Equipamentos	Versão 1	Versão 2	Versão 3					
DT5 Detalhamento dos Equipamentos		Versão 1	Versão 2	Versão 3				
DT6 Detalhamento dos Equipamentos							Versão 4	


Concedida a palavra, o **Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães** solicitou retornar ao *slide* anterior para destacar que estão sendo envidados os esforços necessários tanto pelo Ministério quanto pela EAD para evitar a desqualificação de município ou canal, contudo o número de municípios excluídos do projeto é bastante elevado passando de 1638 para 1065. Nestes termos, registrou que cabe ao GIRED manter esses municípios no programa.

O **Sr. Antonio Carlos Martelletto**, em resposta, ressaltou que é importante registrar que onde está implantada a infraestrutura ou até mesmo planejada a sua implantação deverão ser utilizados de todos os meios para evitar que a infraestrutura implantada fique sem a implantação da parte da RF.

Passando para o tópico sobre a Distribuição de kits, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** informou que está sendo finalizada nesta semana a distribuição de kits das Fases 1.1/1.2 nos municípios que estavam liberados para o total de 226 municípios, restando 32 sem planejamento e tendo sido entregues 283.017 kits. Reportou que foi dado início à Fase 1.4 com a previsão de atendimento de 354 municípios.

O **Sr. Antonio Carlos Martelletto** informou que estão realizando uma pequena mudança no processo de distribuição de kits com a separação do período de agendamento com o período de entrega para evitar a sobreposição de tempo, otimizar o processo de logística e reduzir os custos com a entrega. Ressaltou ainda que para o planejamento das Fases 1.3, 2 e 3 é necessário e urgente definir o modelo do STB que será adquirido.

Em seguida, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** passou para o tópico Norte Conectado e projetou dois *slides*, abaixo reproduzidos, no qual o primeiro apresenta o cronograma base do projeto com os seus principais marcos e o segundo apresenta o *status* geral e o que está em execução neste momento:

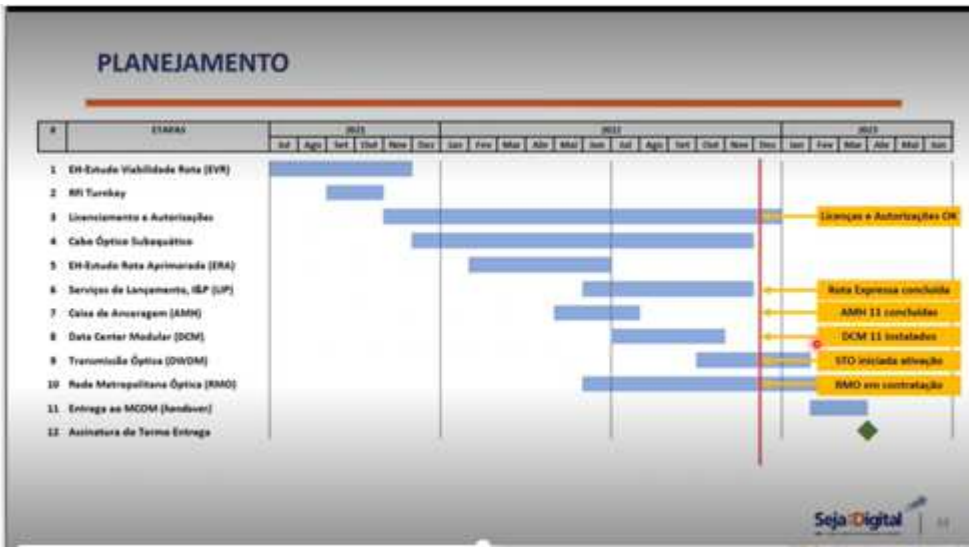

ETAPAS - STATUS

#	ETAPAS	INICIO	EM ESPERAÇÃO	IMP	CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO
1	EI-Estudo Viabilidade Rota (EVR)	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
2	RFI Turnkey	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
3	Licenciamento e Autorizações	OK	OK	OK	OK	EM ESPERAÇÃO DE LICENÇA
4	Cabo Óptico Subaquático	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
5	EI-Estudo Rota Aprimorada (ERA)	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
6	Serviços de Lançamento, I&P (I&P)	OK	OK	OK	OK	EM ESPERAÇÃO DE LICENÇA
7	Caixa de Amortagem (AMH)	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
8	Data Center Modular (DCM)	OK	OK	OK	OK	CONCLUÍDO
9	Sistema Transmissão Óptica (STO)	OK	OK	OK	OK	EM ESPERAÇÃO DE LICENÇA
10	Rede Metropolitana Óptica (RMO)	OK	OK	OK	EM ESPERAÇÃO DE LICENÇA	EM ESPERAÇÃO DE LICENÇA
11	Termo Entrega ao MCOM (handover)	OK	EM ESPERAÇÃO DE LICENÇA	EM ESPERAÇÃO DE LICENÇA	EM ESPERAÇÃO DE LICENÇA	EM ESPERAÇÃO DE LICENÇA

Sobre o tópico Norte Conectado, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** destacou o lançamento da Rota Expressa e a execução das demais rotas, sendo que a rota Alenquer-Curuá dependerá das condições do rio para definir se o lançamento ocorrerá este ano ou não e projetou o *slide* abaixo reproduzido:



Ato contínuo, projetou o *slide* abaixo reproduzido com as atividades planejadas do projeto Norte Conectado:

ATIVIDADES PLANEJADAS

- **Licenciamento Ambiental**
 - ✓ Emissão de Relatório de Execução Programas Ambientais → mar/2023
- **Rede Metropolitana Óptica**
 - ✓ Contratação de 3 RFPs (Equipamentos, Cabos e Serviços) → dez/2022
 - ✓ Previsão de execução (9 municípios) → mar/2023
 - ✓ RNP em tratativas com concessionárias (postes) → jan/2023
- **Documento Técnico Termo de Declaração e Entrega**
 - ✓ Definição critérios entrega técnica → jan/2023
 - ✓ Definição critérios entrega patrimonial → jan/2023
 - ✓ Apresentação GT-Norte e deliberação GIRED → fev/2023



Para finalizar o tópico do Norte Conectado, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** registrou que o trecho Santarém (PA) – Manaus (AM) deve ser ativado até o dia 21 de dezembro e que o pequeno atraso se deu em virtude de ter sido retida a parte eletrônica e somente ter sido liberada para ambos os Estados apenas na semana passada.

Concedida a palavra o **Sr. Carlos Saldanha** cumprimentou a todos passou a reportar sobre os Procedimentos Pré-Acordados (PPA) que passam por auditoria externa para verificar os procedimentos dos processos do ano corrente. Nesse período, está sendo executado o PPA 2 (Mitigação), sendo a única atividade pendente que ficou residual do ano anterior, da temporada 1 da EAD, bem como o PPA 3 (Projeto TV Digital) e PPA 4 (Projeto Norte Conectado), ambos contemplando o período até outubro de 2022.

Em seguida, o **Sr. Carlos Saldanha** passou a detalhar os PPA que estão sendo executados:

(i) No PPA 2 Mitigação, quanto ao tema TV no LTE, informou que houve 3 procedimentos e 96 itens avaliados, com zero exceções;

(ii) No PPA 3 Projeto TV Digital, quanto aos temas de elegibilidade, implantação de *sites* entregues aos municípios, licenciamento de canais, aquisições e distribuição de kits, informou que houve 14 procedimentos e 177.641 itens avaliados, com 3 exceções. Registrou que as exceções são temporais: no tema elegibilidade, em razão do corte ter sido em outubro de 2022, a assinatura e/ou prazo passou do Termo de Entrega para que pudesse ser considerado o Termo como entregue; e no tema licenciamento de canais, o corte em outubro de 2022 dos municípios que estavam relacionados que eram os municípios implantados, também a posterior o canal foi licenciado, concluindo que ambos os casos já estão resolvidos; e

(iii) No PPA 4 Projeto Norte Conectado, quanto aos temas licenciamento ambiental, cabo óptico subaquático e aquisições, informou que houve 16 procedimentos e 308 itens avaliados, com zero exceções.


Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** questionou aos membros do Grupo se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.

Não havendo dúvidas, o **Presidente do GIRED** passou para o item 3 da Pauta.

4. ITEM 3 DA PAUTA: INFORME O GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL NORTE CONECTADO (GT-NORTE).

O **Presidente do GIRED** solicitou que o **Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-NORTE**, fizesse um breve relato quanto ao Informe do Grupo Técnico do Projeto Adicional Norte Conectado (**GT-NORTE**).

O Sr. **Sidney Azeredo Nince** cumprimentou a todos e iniciou a apresentação do Informe do **GT-NORTE** projetando o *slide* abaixo reproduzido com o mapa que representa na cor verde a Rota Expressa Santarém (PA)-Manaus (AM), cujo lançamento foi concluído, ressaltando que a parte paraense dos equipamentos ópticos estão ativados, faltando apenas a ativação dos equipamentos ópticos no trecho do Amazonas; e na cor vermelha as quatro rotas denominadas Rotas Ramificadas:

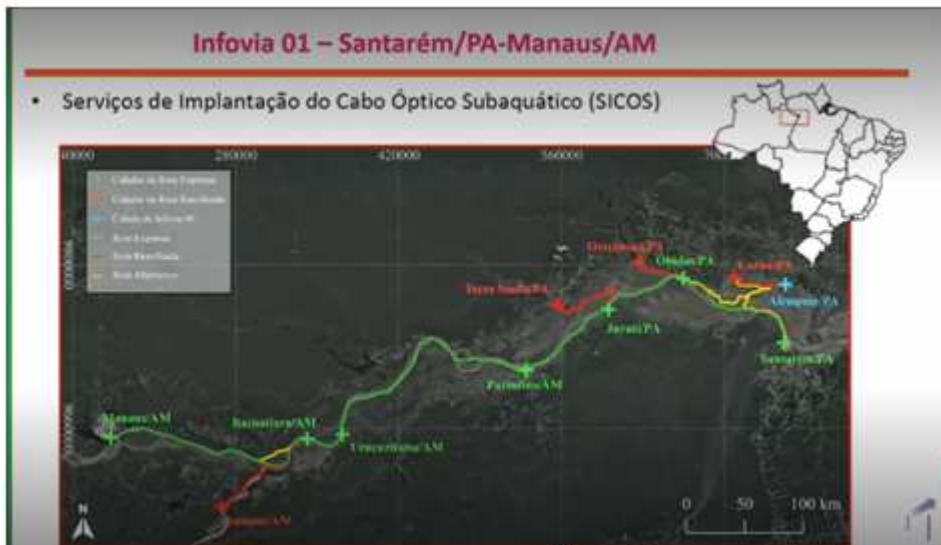

Em seguida o Sr. **Sidney Azeredo Nince** projetou o *slide* abaixo reproduzido com o planejamento do cronograma demonstrando que estão no final do terceiro semestre, que concentra o maior volume de trabalho, com várias atividades simultâneas, inclusive a mais complexa de todas, a saber: o lançamento do cabo óptico:



O Sr. **Sidney Azeredo Nince** projetou os *slides* com vistas a divulgar fotos da situação final do projeto. Inicialmente, apresentou *slide* em que relata que as fotos à esquerda detalham a instalação do contêiner e da caixa de ancoragem em Santarém (PA), bem como do último contêiner instalado em Manaus (AM), que está numa unidade da Marinha; no canto inferior direito, relatou que se trata de uma foto aérea da instalação em Urucurituba, representando os painéis solares que são a principal fonte de energia dos contêineres; e, por fim, relatou sobre a foto do contêiner em Parintins, conforme *slide* reproduzido abaixo:



Em seguida, projetou o *slide* abaixo reproduzido com fotos que mostram o navio que trouxe o cabo desde a China até o Brasil, bem como o transbordo:



Por fim, projetou o *slide* abaixo reproduzido com fotos que mostram os testes ópticos que são feitos antes do transbordo, o cesto do navio com e sem os 583 km de cabo óptico:



Passando para outro tópico da sua apresentação, o **Sr. Sidney Azeredo Nince** reportou as diversas etapas com os respectivos documentos técnicos destacando que todos os documentos já foram aprovados pelo GIREC, exceto o documento de entrega definitiva de todo o projeto para o Ministério das Comunicações,

que está em fase final de elaboração e projetou o *slide* abaixo reproduzido no qual detalha cada uma das atividades:



Concedida a palavra, a **Sra. Daniela Naufel Schettino**, informou que amanhã haverá uma reunião no Comitê Gestor, na qual será homologado o resultado e, eventualmente, até decidir se poderão entrar mais de 12 empresas como estava previsto no Termo de Referência.

O **Sr. Sidney Azeredo Nince** ressaltou que, inicialmente, estava previsto 12 empresas para permitir que cada empresa ficasse com um par de fibra, contudo apareceram mais de 12 empresas, e, por isso, reforçou o que foi mencionado pela **Sra. Daniela Naufel Schettino** sentido de que amanhã será discutido se será permitido um acréscimo no número de participantes ou não. Destacou, também, que boa parte dos interessados pelo Operador Neutro da Infovia 01 pertencem ao consórcio da Infovia 00.

O **Presidente do GIRED** questionou aos membros do GIRED se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.

Não havendo dúvidas, o **Presidente do GIRED** passou para o item 4 da Pauta.

5. ITEM 4 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL TV DIGITAL (GT-TV DIGITAL).

O **Presidente do GIRED** solicitou que o **Secretário Executivo do GIRED**, o **Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães**, **Coordenador do GT-TVD**, fizesse sua apresentação.

O **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** cumprimentou a todos, inicialmente, e informou que faria uma apresentação sobre as discussões que ocorreram no âmbito do Grupo Técnico do Projeto Adicional TV Digital (**GT-TV Digital**) que foram previamente comentadas pelo **Sr. Antônio Carlos Martelletto**, que, por sua vez, também trouxe algumas considerações.

Proseguiu registrando que entendia importante mostrar, como resultados gerais, os números já trabalhados no GIRED, do ponto de vista regulatório, tanto das Fases 1, 2 e 3, e destacou os seguintes números sobre a viabilização de canais nessas Fases:

- 4.795 canais analisados;
- 4.729 canais viabilizados (98,5%);
- 4.729 canais passaram por Consulta Pública;
- 4.719 já efetivados no Plano Básico;
- 74 canais revisados a pedido da SET e da EAD (incluindo 16 canais de Segunda Estação); e
- 66 canais inviáveis (em revisão pela SOR).

Na sequência, o **Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães** passou a reportar os números referentes ao licenciamento dos Canais nas Fases 1, 2 e 3, segundo dado datado de 12 de dezembro de 2022, informando que, até o momento, já foram:

- 6.357 canais consignados;
- 5.904 autocadastramentos liberados;
- 5.512 atos de uso de radiofrequência emitidos;
- 5.394 canais analisados para fins de licenciamento;
- 4.903 canais licenciados;
- 1.110 municípios com todos os canais licenciados;
- 591 municípios com a infraestrutura de RF já instalada;
- 575 municípios com todos os canais licenciados e com a infraestrutura de RF já instalada;
- 517 municípios já entregues à Prefeitura.

Por meio da tabela abaixo reproduzida, o **Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães** mostrou um panorama do licenciamento dos Canais nas Fases 1, 2 e 3, já apresentado pela EAD, e deu destaque apenas aos números identificados na coluna “% Municípios Entregues”:

	Municípios						Canais		
	Municípios Listados	Totalmente Licenciados	Com RF Implantado	Totalmente Licenciados e Com RF Implantado	Termo de Entrega Assinado	% de Municípios Entregues	Canais Listados	Canais Licenciados	% de Canais Licenciados
Fase 1.1	97	95	92	92	91	93,81%	348	328	94,25%
Fase 1.2	161	137	135	134	131	81,37%	605	475	78,51%
Fase 1.3	322	258	10	9	2	0,62%	1542	1324	85,86%
Fase 1.4	470	420	353	340	293	62,34%	2016	1709	84,77%
Fase 2	344	186	0	0	0	0,00%	1663	993	59,71%
Fase 3	244	0	0	0	0	0,00%	1108	74	6,68%
Total	1638	1096	590	575	517	31,56%	7282	4903	67,33%

Ato contínuo, o **Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães** informou que foram realizadas reuniões do **Sub-Grupo do GT-TVD** nos dias 31 de outubro, 17 de novembro e 1º de dezembro, bem como do **GT-TVD**, sendo a 21ª Reunião no dia 21 de novembro e a 22ª Reunião no dia 07 de dezembro. Registrou que as reuniões serviram para discutir pontos apresentados pela EAD e que podem ser avançados nessas pendências, e destacou que tiveram entendimentos na 22ª Reunião do **GT-TVD** que serão propostos nesta Reunião Ordinária, a partir da deliberação de itens para alinhamento e avanço do projeto, como por exemplo a exclusão e desqualificação de municípios e canais do projeto, visto que as Prefeituras não conseguiram se manifestar ou sanar os problemas.

Nesse contexto, o **Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães** reportou o *status* das pendências dos canais e os encaminhamentos sugeridos na 22ª Reunião do **GT-TVD**, por meio da projeção dos *slides* abaixo reproduzidos:

Status Pendências de Canais		ANATEL	
Encaminhamentos da 22ª Reunião do GT-TVD			
		Qtd. Canais	
Canais analógicos sem viabilização do par digital		1	DR4 - GIRED
Canais digitalizados pelo RDF		89	Edital - canal digitalizado
Canais com VTA negativa		6	Edital - canal analógico em operação
Canais sem qualificação de entidade		434	Edital - canal não elegível
Os canais não serão implantados nos municípios (retrato)		530	

Situação	Encaminhamento
Canais sem pareamento do digital	EAD e ANATEL continuarão a trabalhar nas viabilidades.
Canais Digitalizados pelo RDF	Informar que conforme RO 84*, foi recebido o Ofício da EAD (SEI 9533106) recebido em 07/12/2022 informando os canais foram retirados do escopo do programa PDB.
Canais com VTA Negativo	EAD identificou que alguns foram qualificados pelo MCom, solicitou para discutir na próxima reunião do GT-TVD, após analisarmos os casos com o MCom.
Canais sem qualificação	MCOM se comprometeu a analisar a lista (Edital de Rechamada)

Status Pendências de Canais		ANATEL	
Encaminhamentos da 22ª Reunião do GT-TVD			
		Qtd. Canais	
Canais analógicos sem viabilização do par digital		1	DR4 - GIRED
Canais digitalizados pelo RDF		89	Edital - canal digitalizado
Canais com VTA negativa		6	Edital - canal analógico em operação
Canais sem qualificação de entidade		434	Edital - canal não elegível
Os canais não serão implantados nos municípios (retrato)		530	

Canais Digitalizados pelos RDF	UF		Fase	
	AM	2	Fase 1.1	1
	CE	1	Fase 1.2	3
	MA	3	Fase 1.3	1
	MG	3	Fase 1.4	3
	MS	19	Fase 2	7
	MT	53	Fase 3	74
	PE	1		
	PR	1		
	RS	6		
	Total	89	Total	89

O Sr. Oseias Fonseca de Aguiar solicitou a palavra para retificar a informação dada pelo Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães com relação aos 434 canais sem qualificação de entidade, identificado no primeiro slide acima reproduzido, e informou que esses canais estariam em análise pelo MCOM dentro do Edital de Rechamada que já ocorreu e esclareceu que não teria nenhum novo Edital de Rechamada. O Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães lembrou a presença nesta Reunião Ordinária dos Srs. Roberto Ramos Colletti e Thiago Aguiar Soares para que ficassem à vontade para se manifestarem. Nesse sentido, o Sr. Thiago Aguiar Soares aproveitou a oportunidade para confirmar a menção feita pelo Sr. Oseias Fonseca de Aguiar.

Passando a reportar sobre o *status* das pendências de municípios e os encaminhamentos sugeridos na 22ª Reunião do **GT-TVD**, o Sr. **Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** projetou os seguintes *slides*, destacando apenas informações neles contidas:

Status Pendências de Municípios



Encaminhamentos da 22ª Reunião do GT-TVD

Quadro Geral

PENDÊNCIAS DO PDB - MUNICÍPIOS	Qtd. Municípios		Observação
	28/out/22	12/dez/22	
Lista 1 - DR4 - Termo de Adesão não assinado	49	29	Cartas MCom - Lista 1 - Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município sem manifestação de interesse (inclusive rechamada)	3	3	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município sem manifestação qualificada (inclusive rechamada)	29	29	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município com canal(ais) digitalizado(s) pelo RDF	13	13	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município com canal(ais) digitalizado(s) pelo RDF e sem qualificação da entidade (inclusive rechamada)	1	1	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Municípios conurbados, estações colocalizadas	2	2	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Projeto não será implantado nesses municípios (retrato)	97	77	

Status Pendências de Municípios



Encaminhamentos da 22ª Reunião do GT-TVD

PENDÊNCIAS DO PDB - MUNICÍPIOS	Qtd. Municípios		Observação
	28/out/22	12/dez/22	
Lista 1 - DR4 - Termo de Adesão não assinado	49	29	Cartas MCom - Lista 1 - Encaminhado ao GIRED para deliberação

- Conforme deliberado na RO 84*, as prefeituras foram notificadas em 10/11/2022, desta ação **66 municípios sanearam as pendências**.
- Na 22ª Reunião do GT-TVD, ficou decidido que na situação de **"Sem habilitação de local"**, a pedido dos Radiodifusores, ainda será discutido no GT-TVD.
- Na 22ª Reunião do GT-TVD, ficou decidido que na situação de **"Sem disponibilidade de Energia"**, a pedido da EAD, MCOM irá analisar as responsabilidades jurídicas dos municípios pela não disponibilização da energia, a luz do Termo de Adesão assinado, e será discutido no GT-TVD.
- **Proposta de exclusão dos 29 municípios que não assinaram os Termos de Adesão (Descumprimento do art. 12 da Portaria n° 2.524/2021. (desqualificação da elegibilidade dos municípios)**

Status Pendências de Municípios



Encaminhamentos da 22ª Reunião do GT-TVD

PENDÊNCIAS DO PDB - MUNICÍPIOS	Qtd. Municípios		Observação
	28/out/22	12/dez/22	
Lista 1 - DR4 - Termo de Adesão não assinado	49	29	Cartas MCom - Lista 1 - Encaminhado ao GIRED para deliberação

- **Proposta de exclusão dos 29 municípios que não assinaram os Termos de Adesão (Descumprimento do art. 12 da Portaria n° 2.524/2021).**
- **Desqualificação dos canais elegíveis para o PDB.**

UF		Fase	
ES	1	Fase 1.1	0
MG	1	Fase 1.2	0
MT	12	Fase 1.3	1
PA	2	Fase 1.4	1
PE	1	Fase 2	2
RO	8	Fase 3	25
RR	2		
RS	1		
TO	1		
Total	29	Total	29

Status Pendências de Municípios
Encaminhamentos da 22ª Reunião do GT-TVD

ANATEL

PENDÊNCIAS DO PDB - MUNICÍPIOS	Qtd. Municípios		Observação
	28/out/22	12/dez/22	
Município sem manifestação de interesse (inclusive rechamada)	3	3	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município com canal(ais) digitalizado(s) pelo RDF	13	13	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município com canal(ais) digitalizado(s) pelo RDF e sem qualificação da entidade (inclusive rechamada)	1	1	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Municípios conurbados, estações colocalizadas	2	2	Encaminhado ao GIRED para deliberação

- Proposta de exclusão dos 3 municípios que as prefeituras não manifestaram interesse no programa (Descumprimento do art. 11 da Portaria n° 2.524/2021).
- Desqualificação dos canais elegíveis para o PDB.

UF		Fase	
AM	2	Fase 1.1	0
PB	1	Fase 1.2	1
		Fase 1.3	0
		Fase 1.4	0
Total	3	Fase 2	0
		Fase 3	2
		Total	3

Status Pendências de Municípios
Encaminhamentos da 22ª Reunião do GT-TVD

ANATEL

PENDÊNCIAS DO PDB - MUNICÍPIOS	Qtd. Municípios		Observação
	28/out/22	12/dez/22	
Município sem manifestação de interesse (inclusive rechamada)	3	3	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município com canal(ais) digitalizado(s) pelo RDF	13	13	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município com canal(ais) digitalizado(s) pelo RDF e sem qualificação da entidade (inclusive rechamada)	1	1	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Municípios conurbados, estações colocalizadas	2	2	Encaminhado ao GIRED para deliberação

- Proposta de exclusão dos 14 municípios onde os canais foram digitalizados pelos próprios radiodifusores.
- Desqualificação dos canais elegíveis para o PDB.

UF		Fase	
MT	12	Fase 1.1	0
MS	2	Fase 1.2	0
		Fase 1.3	0
		Fase 1.4	0
Total	14	Fase 2	0
		Fase 3	14
		Total	14

Status Pendências de Municípios
Encaminhamentos da 22ª Reunião do GT-TVD

ANATEL

PENDÊNCIAS DO PDB - MUNICÍPIOS	Qtd. Municípios		Observação
	28/out/22	12/dez/22	
Município sem manifestação de interesse (inclusive rechamada)	3	3	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município com canal(ais) digitalizado(s) pelo RDF	13	13	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Município com canal(ais) digitalizado(s) pelo RDF e sem qualificação da entidade (inclusive rechamada)	1	1	Encaminhado ao GIRED para deliberação
Municípios conurbados, estações colocalizadas	2	2	Encaminhado ao GIRED para deliberação

- Proposta de exclusão dos 2 municípios conurbados (uma estação atendendo dois municípios).
- Heliódora e Natércia/MG, Conceição dos Ouros e Cachoeira de Minas/MG
- Desqualificação dos canais elegíveis para o PDB.

UF		Fase	
MG	2	Fase 1.1	0
		Fase 1.2	0
Total	2	Fase 1.3	0
		Fase 1.4	0
		Fase 2	0
		Fase 3	2
		Total	2

Status Pendências de Municípios
Encaminhamentos da 22ª Reunião do GT-TVD

ANATEL

PENDÊNCIAS DO PDB - MUNICÍPIOS	Qtd. Municípios		Observação
	28/out/22	12/dez/22	
Município sem manifestação qualificada (inclusive rechamada)	29	29	Encaminhado ao GIRED para deliberação

- Ainda não serão objeto de deliberação, pois ficou acertado que EAD e MCOM verificarão caso a caso e os motivos de desqualificação das manifestações das entidades, conforme o andamento das análises do Edital da Rechamada.

Com relação ao prazo final das análises do Edital de Rechamada, o Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães concedeu a palavra aos Srs. Roberto Ramos Colletti e Thiago Aguiar Soares para manifestação. O Sr. Roberto Ramos Colletti informou que as análises já estariam sendo finalizadas e que a meta seria ter uma posição até o final do ano, considerando que a existência de poucas pendências e que, talvez, algumas

possam perdurar um pouco mais, por conta do atendimento de exigências de algumas entidades, ressaltando, contudo, que, em sua maioria, já estariam concluindo e, em breve, encaminharão e discutirão o resultado dessas análises no **GT-TVD**.

Em seguida, o **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** projetou *slide* que mostra um quadro resumo das pendências por ele reportadas, após o trabalho do **Subgrupo do GT-TVD** e do **GT-TVD**:

Status Pendências de Municípios
Encaminhamentos da 22ª Reunião do GT-TVD

Resumo de todos os canais a serem excluídos.

UF	
AM	2
ES	1
MG	3
MT	24
MS	2
PA	2
PB	1
PE	1
RO	8
RR	2
RS	1
TO	1
Total	48

Fase	
Fase 1.1	0
Fase 1.2	1
Fase 1.3	1
Fase 1.4	3
Fase 2	2
Fase 3	41
Total	48

Consequências da exclusão dos municípios:

- MCOM analisará a possibilidades de tornar sem efeito as consignações de canais já realizadas.
- A EBC e Astral avaliarão o interesse na manutenção da consignação realizada e a instalação com recursos próprios.

O **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** informou que, também, ao longo da última reunião ordinária para a reunião a ser realizada nesta data, foi apresentada pela EAD uma lista com 53 novos municípios com pendências, ressaltando que havia uma lista de 202 municípios com pendências ao longo do tempo, onde a EAD e o Ministério fazem contato com os municípios. Nesse cenário, projetou o *slide* a seguir transcrito que mostra essa nova situação:

Pendências de Municípios
2ª Lista de municípios

Foi informado na 22ª Reunião do GT-TVD que **novos municípios** se enquadraram nas pendências do DR04.

53 novos municípios com pendências.

Proposta de novamente encaminhar ao MCOM e a EAD a lista de municípios nestas condições para que sejam oficiados as prefeituras, conforme determinado para a 1ª Listas de municípios com pendências do DR04.

LISTA DE MUNICÍPIOS ENQUADRADOS NO DR4 - DR04
ref. 10/04/22

Descrição - DR4 - Lista 2	Fase 1.2	Fase 1.3	Fase 1.4	Fase 2	Fase 3	TOTAL
Local não habilitado		4		2		6
Não disponibilização de energia elétrica		19	7	11		37
Termo de Adesão não assinado	1			6	3	10
TOTAL	1	23	7	19	3	53

Prosseguindo com sua apresentação, o **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** reportou as questões referentes à lista de canais da 2ª Estação e o trabalho realizado, conforme *slide* a seguir:

Lista de canais da 2ª Estação
Trabalho realizado

- Para a **Lista de canais em municípios emancipados** devem ser analisados pelo MCOM para reconhecimento e eventual inclusão no Anexo I da Portaria 2.524/2021. (11 municípios)
- Para a **Lista de canais da 2ª Estação** deve a EAD verificar a transmissão analógica e o MCOM verificar junto a assinatura de termo aditivo ao Termo de Adesão para a 2ª Estação. (16 casos de 2ª estação)
- Radiodifusores formalizaram as listas no dia 08/12 ao MCOM e informou a Anatel.
- Nesta formalização foi notificado o caso de **Guamiranga/PR** para inclusão no Anexo I da Portaria 2.524/2021.
- GIRED aguarda o encaminhamento do MCOM, para tomar as devidas providências.

Concluída a apresentação, o **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** sugeriu a deliberação de alguns itens apresentados, em decorrência das discussões e entendimentos firmados nas reuniões do **Subgrupo** e do **GT-TVD**, a seguir destacados:

- a) Exclusão (desqualificação) de 29 municípios que não assinaram os Termos de Adesão, ficando esses canais correspondentes desqualificados do projeto;
- b) Exclusão (desqualificação) de 3 municípios que não manifestaram interesse no programa;
- c) Exclusão (desqualificação) de 14 municípios aonde o próprio Radiodifusor realizou a digitalização; e
- d) Exclusão de 2 municípios que se encontravam em áreas conurbadas, onde uma única infraestrutura atenderia o município.

O **Presidente do GIRED**, conforme sugerido pelo **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães, Coordenador do GT-TVD**, e com vistas a avançar nos pontos pendentes, questionou aos presentes se todos estariam de acordo com as deliberações propostas.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** passou para os itens de deliberação.

Inicialmente, o **Presidente do GIRED** destacou que, conforme as deliberações da 84ª Reunião Ordinária do GIRED, a **Secretaria do GIRED** solicitou ao MCOM e à EAD a notificação de 202 Prefeituras identificadas com pendências no projeto para manifestações em até 30 (trinta) dias, e afirmou que este esforço resultou em regularização de 70 destas Prefeituras, restando 132 Prefeituras que ainda se encontram com pendências junto ao programa e, para as situações “sem habilitação de local” e “sem disponibilidade de energia elétrica”, informou que aguardarão a conclusão das análises pertinentes, para, ao final, serem dados os devidos encaminhamentos.

Feitas essas considerações preliminares, o **Presidente do GIRED** passou para os itens de deliberação:

- a) Para a situação em que não houve a “Assinatura dos Termos de Adesão” ao Programa Digitaliza Brasil, que totalizam 29 casos, conforme apresentado e à luz do art. 12 da Portaria nº 2.524/2021, ficou constatado o desinteresse das respectivas Prefeituras em assinar os Termos de Adesão, e, portanto, propôs a exclusão do rol dos municípios elegíveis ao programa e, conseqüentemente, a desqualificação dos canais correspondentes desses municípios do programa;
- b) Para os 3 casos de municípios onde não houve a “manifestação de interesse das Prefeituras” ao Programa Digitaliza Brasil, conforme reportado e à luz do art. 11 da Portaria nº 2.524/2021, confirmado o desinteresse das respectivas Prefeituras, logo, propôs a exclusão desses municípios elegíveis ao programa e, conseqüentemente, a desqualificação dos canais correspondentes destes municípios do programa;
- c) Para os 14 casos identificados de municípios onde os próprios Radiodifusores optaram por executar a digitalização dos canais, propôs a exclusão desses do rol de municípios elegíveis ao programa e, conseqüentemente, a desqualificação dos canais correspondentes destes municípios do programa; e
- d) Para os 2 casos no Estado de Minas Gerais, envolvendo 4 municípios, onde a solução técnica mais adequada foi a utilização de uma mesma infraestrutura para a cobertura de municípios conurbados, propôs a exclusão de 2 destes municípios do rol dos municípios elegíveis ao programa e, conseqüentemente, a desqualificação dos canais correspondentes destes municípios do programa.

O **Presidente do GIRED** propôs, diante do exposto, a exclusão do rol dos municípios elegíveis ao programa destes 48 municípios, conforme relatado nos itens acima, e a conseqüente desqualificação dos canais correspondentes desses municípios do programa. Reiterou e destacou também que, em nenhum destes municípios, a EAD realizou atividades de infraestrutura, ou seja, gastos que gerem desperdício ao projeto. Nesse contexto, o **Presidente do GIRED** passou a relatar a lista dos municípios:

Frei Miguelinho	PE
Senhora do Porto	MG
Conceição da Barra	ES
Sinimbu	RS

Alto Garças	MT
Araguaiana	MT
Barra do Bugres	MT
Campo Novo do Parecis	MT
Feliz Natal	MT
General Carneiro	MT
Luciára	MT
Paranatinga	MT
Porto Alegre do Norte	MT
Tapurah	MT
Vera	MT
Vila Bela da Santíssima Trindade	MT
Curionópolis	PA
Faro	PA
Alvorada D Oeste	RO
Colorado do Oeste	RO
Costa Marques	RO
Itapuã do Oeste	RO
Monte Negro	RO
São Miguel do Guaporé	RO
Teixeirópolis	RO
Vale do Paraíso	RO
Alto Alegre	RR
Caroebe	RR
Arapoema	TO
Sertãozinho	PB
Amaturá	AM
Pauini	AM
Anaurilândia	MS
Aral Moreira	MS
Arenápolis	MT
Comodoro	MT
Jauru	MT
Porto Esperidião	MT
Ribeirão Cascalheira	MT
Santa Terezinha	MT
Tabaporã	MT

Itaúba	MT
Novo São Joaquim	MT
Ribeirãozinho	MT
Rio Branco	MT
Tesouro	MT
Conceição dos Ouros	MG
Heliadora	MG

Após o relato da lista de município, o **Presidente do GIRED** colocou os itens em deliberação.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a exclusão do rol dos municípios elegíveis ao programa dos 48 municípios, conforme relatado acima, e a consequente desqualificação dos canais destes municípios do programa, conforme modificações aqui propostas e aceitas por todos.

O **Presidente do GIRED**, diante da deliberação em tela, entendeu que caberia destacar que os canais ora outorgados devem continuar o processo de digitalização, neste momento custeado pelo próprio Radiodifusor, sob o risco do não atendimento do prazo de desligamento do sinal analógico, 31 de dezembro de 2023, excetuando-se a **ASTRAL** e a **EBC** que podem não ter interesse na instalação de novos canais nestes municípios, razão pela qual consignou a importância da manifestação da **ASTRAL** e da **EBC** junto ao Ministério das Comunicações, acerca do interesse na continuidade da outorga destes canais.

O **Presidente do GIRED** determinou, assim, que a **Secretaria do GIRED**: (i) notifique o Ministério das Comunicações e EAD, encaminhando a lista dos 48 municípios excluídos do rol do Projeto Adicional TVD e, consequentemente, proceda a desqualificação dos canais correspondentes, para que esses tomem as devidas providências no âmbito do Projeto Digitaliza Brasil, bem como avaliem com a **ASTRAL** e a **EBC** o interesse na continuidade nas outorgas já realizadas para esta lista de municípios.

O **Presidente do GIRED** registrou que, entre a última Reunião do GIRED e a última do **GT-TVD**, foi constada uma nova lista de 53 municípios que se encontram com mesmas pendências e exigências das que foram tratadas na 84ª Reunião Ordinária do GIRED, de forma equânime. Sendo assim, determinou que a **Secretaria do GIRED** notifique o MCOM e a EAD para atuar junto a estas Prefeituras para a correção das pendências em até 30 (trinta) dias, sob risco de o município ficar excluído do programa, bem como determinou que a EAD não proceda com ações ou atividades, caso as regularizações não ocorram.

Por fim, o **Presidente do GIRED** determinou que a **Secretaria do GIRED** também notifique o MCOM, encaminhando cópia do Ofício da EAD (SEI nº 9533106) que informou a retirada do escopo do Projeto TVD dos 89 municípios que foram digitalizados pelos próprios Radiodifusores.

Ato contínuo, o **Presidente do GIRED** passou para o item 5 da Pauta.

6. ITEM 5 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.

O **Presidente do GIRED** questionou aos membros do GIRED presentes se possuíam algum assunto que quisessem tratar na presente reunião.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** passou para o item 6 da Pauta.

7. ITEM 6 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2022.

O **Presidente do GIRED** propôs que a próxima Reunião Ordinária do GIRED seja realizada no dia 14 de fevereiro de 2023 (terça-feira) às 10:00h, de forma remota, e questionou aos membros do GIRED se estariam todos de acordo com essa data.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** definiu a data da 86ª Reunião Ordinária do GIRED para o dia 14 de fevereiro de 2023 (terça-feira) às 10:00h, de forma remota.

O **Presidente do GIRED** esclareceu que, caso seja necessário, conforme proposta de apresentação do plano de ação emergencial, poderá ser proposta a realização de uma Reunião Extraordinária.

Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o **Presidente do GIRED** agradeceu a participação de todos, desejou boas festas e declarou encerrada a 85ª Reunião Ordinária do Grupo.



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira de Lara Resende, Usuário Externo**, em 10/03/2023, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Neiva Melo, Usuário Externo**, em 13/03/2023, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Monique Pereira Ibitinga de Barros, Diretora de Planejamento Regulatório**, em 13/03/2023, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 13/03/2023, às 19:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Oliveira Caram Guimarães, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação**, em 05/04/2023, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do Grupo**, em 12/04/2023, às 19:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **9758462** e o código CRC **C2981139**.
