



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED

Data: 28 de abril de 2023 (sexta-feira).

Horário: 15h30 às 17h30.

Local: Reunião remota.

LISTA DE PRESENÇA MEMBROS DO GIRED:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	PRESENTE NA REUNIÃO?
Presidente do GIRED - Anatel	---	Moisés Queiroz Moreira	Sim
Secretário Executivo do GIRED - Anatel	---	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	Sim
Ministério das Comunicações	Titular	Titular da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica	Sim
	Suplente	Titular do Departamento de Radiodifusão Pública, Comunitária e Estatal	Sim
Representante dos Radiodifusores	Titular	João Camilo Junior	Sim
	Suplente	Wagner de Sousa Bastos	Não
	Titular	Flávio Lara Resende	Não
	Suplente	Luiz Carlos Abrahão	Sim
	Titular	Raymundo Costa Pinto Barros	Não
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	Sim
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	Sim
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	Sim
Proponentes Vencedoras	Titular - Telefônica	José Gonçalves Neto	Não
	Suplente - Telefônica	Marcus Vinícius Brunetti	Sim
	Titular - Claro	Oscar Petersen	Não
	Suplente - Claro	Monique Pereira Ibitinga de Barros	Sim
	Titular - Algar Telecom	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	Sim
	Suplente - Algar Telecom	Neiva Miranda Coelho	Não
	Titular - Tim	Mario Girasole	Não
	Suplente - Tim	Marcelo Concolato Mejias	Sim

OUTROS PARTICIPANTES:

Nome	Entidade
Alex Pires de Azevedo	Anatel
Antônio Martelleto	EAD
Carlos Saldanha	EAD
Cíntia da Conceição Landim	Anatel (Terceirizada)
Fernando César Araújo	EAD
Francisco Peres	SET
Gunnar Bedicks	EAD
Henrique Gomes Pinheiro	Anatel
Karine Medeiros Dias	Anatel
Lívia Cecília Barbosa	Tim
Luis Renato Giffoni Rodrigues	Anatel
Marina Cruz Vieira Villela Soares	Anatel
Martin Jales Hon	Anatel
Oséias Fonseca de Aguiar	Anatel
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Paulo Vaggione	EAD
Renato de Campos Ribeiro	EAD
Sebastião Sérgio de Oliveira Junior	Tim
Sidney Azeredo Nince	Anatel
Thiago Aguiar Soares	Ministério das Comunicações

ASSUNTOS:

1. SAUDAÇÃO INICIAL.

O **Presidente do GIRED, Conselheiro Moises Queiroz Moreira**, cumprimentou a todos e deu início à 87ª Reunião Ordinária do GIRED e destacou a participação dos representantes excepcionais da Radiodifusão e das prestadoras, conforme solicitação das mesmas e passou para o item 1 da Pauta.

2. ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2023.

O **Presidente do GIRED** questionou aos presentes se haveria ajustes em relação à versão encaminhada do documento.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** declarou aprovada a Ata da 86ª Reunião Ordinária e passou para o item 2 da Pauta.

3. ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD).


O **Presidente do GIRED** passou a palavra ao **Sr. Antônio Martelletto** para que fizesse uma breve apresentação quanto ao Informe das atividades da EAD.

O **Sr. Antônio Martelletto** cumprimentou a todos e passou a projetar uma apresentação sobre o Informe da EAD.


Sobre o tópico **Ativação do LTE**, informou, em março de 2023, foi ativada uma cidade, restando 107 cidades a ativar com o LTE no 700 MHz. Reportou que, durante esse período, foram registradas 17 interferências de TV, sendo 12 de Radiação não intencional; 2 de Radiação restrita; e 3 de Outras fontes não caracterizadas.

No **Projeto TV Digital**, o **Sr. Antônio Martelletto** destacou o seguinte:

- (i) Na esteira dos municípios projetou o *slide* abaixo reproduzido, destacando os 1.650 municípios nos Chamados, as 1.352 infraestruturas completas e 925 completas com a parte de RF ativada:

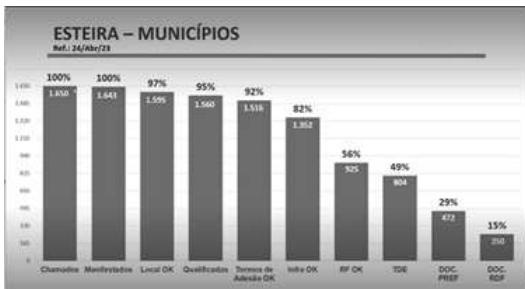

- (ii) Na esteira de canais, projetou o *slide* abaixo reproduzido, com dados atualizados até 24 de abril, sem tecer maiores comentários:

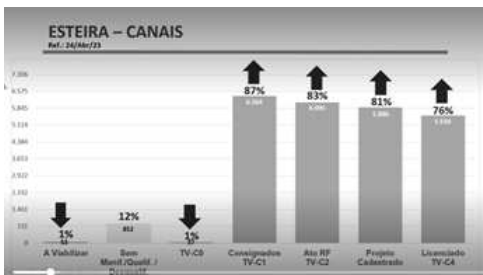


- (iii) No tocante ao acompanhamento do Plano x Real da parte de infraestrutura, destacou a última linha da tabela abaixo reproduzida para informar que 1.352 municípios estão com infraestrutura implantada, estando prevista para o mês de junho a implantação de 44 infraestruturas, chegando até 1.455 na esteira, segundo o planejamento já estabelecido:

Município	Data de Implantação	Status	Quantidade	Porcentagem	Data de Ativação	Status	Quantidade	Porcentagem
...								
Total			1.352	81%	Junho	1.455	88%	...

- (iv) No que concerne à implantação de RF, destacou que há 925 RF implantadas e 1.347 na esteira até o mês de julho. Pontuou que este número poderá ser alterado em vista das deliberações previstas na presente Reunião Ordinária.
- (v) No *status* dos cercamentos, relatou que esse número não tem sofrido alterações consideráveis, com aproximadamente 50% dos cercamentos concluídos e o restante em trabalho junto às Prefeituras e projetou os *slides* abaixo reproduzidos:



- (vi) No tocante às adequações nas ERTMS, reportou os números atualizados e ressaltou que a EAD pretende trazer para a próxima Reunião Ordinária do GIRED informações sobre o acompanhamento e o auxílio prestado às Prefeituras para a manutenção. Como exemplo, trouxe o *slide* abaixo reproduzido com fotos que registram a ocorrência dos sinistros, tais como o arrombamento do abrigo e o roubo das baterias do *nobreak*:

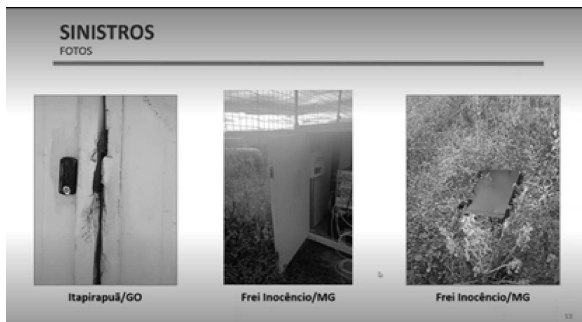

- (vii) No Quadro PDB – TV DIGITAL, apresentou o *slide* abaixo reproduzido que demonstra a situação em que se encontra o programa, com o destaque para os seguintes números:
 - 925 estações completas;
 - 422 estações no *pipeline*, com a previsão de entrada no *pipeline* de mais 38 em virtude da resolução de pendências;
 - 569 municípios que entrarão no *pipeline* com as decisões que estão sendo encaminhadas sobre energia, fluxo regulatório e de retorno ao programa; e
 - 156 municípios em situação de “possível exclusão”, o que resulta em 9% dos municípios que não estão em esteira de produção.

QUADRO PDB - TV DIGITAL
STATUS Ref.: 24/Abr/23

Fase	ERTM Concluído	Pipeline (92)					Possível Exclusão					Total Geral
		Pipeline	Novo Pipeline (60)	Energia aprovada	Fluxo regulatório	Retorno PDB	Qualificação	Municípios	Exclusão GIRED - DecIS	Exclusão emiteida	Retorno PDB	
Fase 1.1	93	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	97
Fase 1.2	130	3	0	1	0	0	3	7	1	7	0	143
Fase 1.3	243	117	0	13	12	0	0	0	0	0	0	365
Fase 1.3 Individualizados	2	8	2	0	0	0	2	4	1	0	0	17
Fase 1.4	436	1	9	6	6	0	1	5	3	3	0	470
Fase 2	30	212	0	14	19	0	0	0	0	0	0	275
Fase 2 Individualizados	0	33	8	0	9	0	2	12	1	8	1	69
Fase 3	62	48	19	0	14	15	11	17	17	32	9	244
Fase 4	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	12
	925	422	38	34	60	25	22	54	23	47	30	1.650
Total Geral	94%				569				156			
					91%				9%			100%

- (viii) Nos demais assuntos do PDB, assinalou os projetos avulsos:

- 16 municípios com segunda estação, ressaltando que este ponto do projeto ainda está em fase de planejamento, com a definição de local e etc.;
- Instalação de filtros 5G nas estações até a Fase 2, sendo que na Fase 3 os filtros já foram instalados. Ressaltou, ainda, que a EAD pretende trazer para a próxima Reunião Ordinária do GIRED informações sobre o cronograma para essa instalação; e
- Instalação de 62 canais avulsos (relacionados às qualificações após as instalações de ERTMS).

(ix) Sobre a distribuição de kits, reportou o status das atividades que estão sendo realizadas desde o ano passado, demonstrando os lotes que foram executados em 2022 e 2023, bem como os lotes (10, 11 e 12) que ainda estão sendo trabalhados, no corrente ano, em diferentes etapas do processo. Registrou que tem planejamento até o Lote 13, segundo os conversores disponíveis. Seguem abaixo os slides comentados:



(x) Em seguida, passou a apresentar o slide abaixo reproduzido com um quadro resumo da distribuição de kits:

FASE	Municípios					Beneficiários					Ativos realizados			
	Total	Finalizado	%	Planej.	%	Total	Finalizado	%	Planej.	%	Planej.	%		
Fase 1.1/1.2	258	226	84%	12	5%	1.038.194	906.931	87%	68.231	6%	63.052	5%	316.701	30%
Fase 1.3	470	407	87%	29	6%	919.200	804.795	88%	58.929	6%	55.476	6%	196.676	24%
Fase 1.4	322			110	34%	1.925.101			668.034	35%	1.257.067	65%		
Fase 2	344					514.610					514.610	100%		
Fase 3	264					795.999					795.999	100%		
Total Geral	1.638	633	39%	151	9%	5.193.104	1.711.706	33%	795.174	15%	2.686.224	52%	513.377	30%
Exclusões	48					111.317					111.317	100%		

(xi) Acerca desse quadro resumo, enfatizou que foram finalizados 633 municípios (39%) e 151 municípios planejados (9%), restando 854 municípios a serem planejados, haja vista que dependem da aquisição de conversores. Comentou que estão na metade do caminho na distribuição de kits. Em seguida, sob a ótica dos beneficiários, ressaltou que em 1638, há 5.193.104 de beneficiários, tendo sido finalizada a cobertura de 1.711.706 (33%) e 795.174 (15%) planejados, representando aproximadamente metade dos beneficiários a serem contemplados, restando 2.686.224 a serem planejados (52%).

(xii) Ato contínuo, passou a discorrer sobre a estratégia para a aquisição de novos kits, destacando que devem ser trabalhados os cenários, haja vista não ser possível determinar a real demanda. Desse modo, reportou que a EAD está trabalhando com 3 cenários: conservador, moderado e agressivo. Ressaltou que a EAD deve trabalhar com muito cuidado para evitar o estoque de conversores ao final do projeto ou até mesmo a falta de conversores, que poderá implicar na extensão do prazo do programa.

(xiii) Ainda sobre este ponto, asseverou que estão trabalhando com a contratação de até 450 mil conversores, sem o compromisso de aquisição integral, no qual o fornecedor deveria dispor desse equipamento em estoque para a quantidade eventualmente necessária para completar a necessidade. Registrou que já colocarão em ordem de produção inicial 350 mil. No slide abaixo reproduzido, comentou que o cenário mais agressivo é o que está circulado em vermelho, chegando até 500 mil conversores, caso não haja redução de cidades. Em contraponto, no cenário mais conservador seriam necessários 277 mil conversores (linha verde):

ESTRATÉGIA PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS KITS

- Contrato 450 mil
- Sem compromisso de aquisição integral
- 3% lote estoque do fornecedor
- Ordem de produção inicial 350 mil (300 mil garantido e 50 mil do fornecedor)
- Frete aéreo

Cronograma	Qtd. Base	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23
Finalizado	1.712					
Entrega Programada	945					
Entrega à Programar	2.537					
Total Beneficiários	5.194					

Consumo	%	Forecasting (Cenários)	Disponível	Necessidade 100% Cidades	Redução Cidade (Aquisição)
Conservador	18%	640	363	277	213
Moderado	22%	750	363	387	312
Agressivo	25%	860	363	497	410

(i) Ainda sobre esse *slide*, ressaltou que a ordem de produção inicial é de 350 mil, garantindo a compra de 300 mil e 50 mil seria mantido em estoque pelo fornecedor e concluiu que a EAD tem preferência pelo cenário moderado, em virtude da experiência passada vivenciada. Ao final, registrou que os conversores serão trazidos com frete aéreo, haja vista que o frete marítimo importará em períodos de entrega muito longos, implicando em “empurrar o processo para frente” (sic).

O Sr. **Antônio Martelletto**, dando continuidade à sua apresentação, passou a reportar sobre as atividades da EAD no **Projeto Norte Conectado**, informando que, no momento, está faltando implementar apenas a Rede Metropolitana Óptica.

Sobre as etapas para implementação da Rede Metropolitana Óptica, o Sr. **Antônio Martelletto** informou que foi solicitada a licença ambiental ao IBAMA. Além disso, o material foi entregue nos dois Estados e, no momento, estão aguardando a autorização das empresas Amazonas Energia e Equatorial do Pará para que possam ser construídas as redes externas. Ressaltou, ainda, que enquanto não há autorização para instalação, estão sendo instalados os Pontos de Atendimento, cujo percentual de conclusão já está em 86%. Por fim, reportou que existem dois documentos técnicos que foram trazidos para deliberação nesta Reunião Ordinária do GIRED.

O **Presidente do GIRED** fez uma intervenção para informar ao Sr. **Antônio Martelletto** que foi feito contato com a Aneel para solicitar auxílio na obtenção desta autorização.

O Sr. **Antônio Martelletto** continuou sua explanação destacando que a previsão de entrega das 9 cidades está estimada em 6 semanas escalonadas, assim que sejam obtidas as autorizações para as construções.

No tocante ao *backbone*, o Sr. **Antônio Martelletto** mencionou que tem conversado com a RNP sobre a previsão de entrada do operador neutro em agosto, razão pela qual informou que a EAD estaria se preparando para manter a rede até o início de agosto com vistas a garantia de manutenção da rede neste período.

O Sr. **Antônio Martelletto** reportou, ainda, uma nova ocorrência, em 3 de abril, que isolou Manaus e, assim, estão envidando todos os esforços para que até a próxima semana esteja restabelecida a conexão. O *slide* abaixo reproduzido foi projetado para ilustrar a localização da ocorrência que está a 30 km de Manaus:



O Sr. **Wilson Diniz Wellisch** pediu a palavra para questionar o Sr. **Antônio Martelletto** se a ocorrência já havia sido reparada, o qual, em resposta, confirmou que ainda estava pendente de reparação.

O **Presidente do GIRED** perguntou ao Sr. **Antônio Martelletto** sobre a expectativa de prazo para a reparação que, em resposta, informou que será reparada até a semana que vem.

Ato contínuo, o **Presidente do GIRED** indagou o Sr. **Wilson Diniz Wellisch** sobre a possibilidade de acelerar o processo de entrega ao Ministério que, por sua vez, informou que a expectativa é de que a burocracia do processo de entrega seja finalizada até a semana que vem.

Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** questionou aos membros do Grupo se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.

Concedida a palavra, o Sr. **Wilson Diniz Wellisch** informou que, ontem, o Ministro assinou a Portaria que altera a Portaria consolidada, especificamente no livro que trata de parte do Programa Digitaliza Brasil, para permitir a distribuição do conversor no modelo Zapper, cuja publicação no Diário Oficial da União encontra-se pendente em razão da sua assinatura ter acontecido depois das 19h00.

Não havendo mais manifestações, o **Presidente do GIRED** passou para o item 3 da Pauta.


4. ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL NORTE CONECTADO (GT-NORTE) E DELIBERAÇÃO RELATIVA A DOCUMENTOS DE DIRETRIZES TÉCNICO-REGULATÓRIAS.

O **Presidente do GIRED** solicitou que o Sr. **Sidney de Azeredo Nince**, **Coordenador do GT-NORTE**, que fizesse um breve relato quanto ao Informe do Grupo Técnico do Projeto Adicional Norte Conectado (GT-NORTE).



O Sr. **Sidney de Azeredo Nince** cumprimentou, inicialmente, o **Presidente do GIRED** e todos os presentes e, em seguida, projetou o *slide* abaixo reproduzido, destacando que os detalhes na cor verde representam a rota expressa entre Manaus e Santarém e os detalhes na cor vermelha representam as quatro rotas ramificadas ao longo do trajeto:




Em seguida, o Sr. Sidney de Azeredo Nince apresentou o cronograma constante do slide abaixo reproduzido que descreve as atividades concluídas e aquelas ainda em fase de execução, tecendo apenas um comentário acerca da última licença a ser obtida, que é a licença de operação, que somente será emitida após a implantação do cabo óptico subaquático:

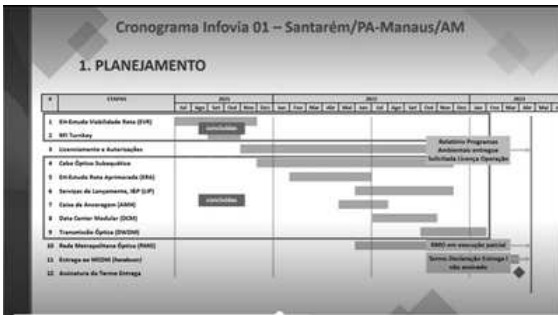

O Sr. Sidney de Azeredo Nince prossegue com a projeção dos seguintes slides que indicam a topologia de rede das rotas expressa e ramificadas e o fluxograma das etapas e dos documentos técnicos aprovados e em fase de elaboração e aprovação pelo GIRED, respectivamente:

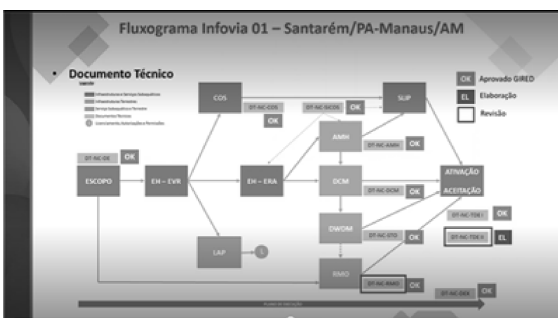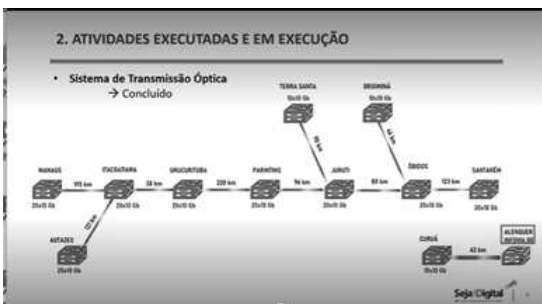

Sobre este último slide, o Sr. Sidney de Azeredo Nince detalhou os documentos técnicos que estão para aprovação do GIRED. Ato contínuo, o Sr. Sidney de Azeredo Nince reportou o status das atividades constantes dos slides abaixo reproduzidos, sem tecer comentários:

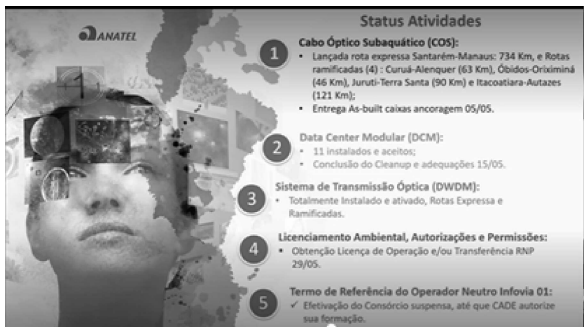

O Sr. Sidney de Azeredo Nince prossegue no Informe do GT-REDE mostrando um quadro com os pontos a serem atendidos para as organizações militares ressaltando que estão sendo atendidos 9 municípios, com a previsão de 10 escolas em cada município. Ressaltou, contudo, que já estão sendo atendidas 132 escolas, além dos novos pontos dos órgãos de defesa.



O Sr. Sidney de Azeredo Nince apresentou o slide abaixo reproduzido com o detalhamento do plano de implementação da Rede Metropolitana Óptica ao longo de 6 a 7 semanas distribuído por cada município, ressaltando que a sua elaboração levou em conta a expectativa de liberação da autorização pelas concessionárias por volta do dia 5 de maio:

Infovia 01 – Santarém/PA-Manaus/AM

Rede Metropolitana Óptica - Plano

Município	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7
Belém							
Castanhal							
Colares							
Conceição do Araguaia							
Curituba							
Itaituba							
Marabá							
Marituba							
Monte Alegre							
Óbidos							
Parauapebas							
Paricá							
Parintins							
Rede							
Santarém							
Terra Santa							
Tucuruí							
Uruará							
Automação Concessionária em 05/05	08/05 a 14/05	15/05 a 21/05	22/05 a 28/05	29/05 a 04/06	05/06 a 11/06	12/06 a 18/06	19/06 a 25/06

Por fim, o Sr. Sidney de Azeredo Nince reproduziu nos seguintes slides os documentos técnicos submetidos para avaliação e deliberação do Grupo na presente Reunião Ordinária:

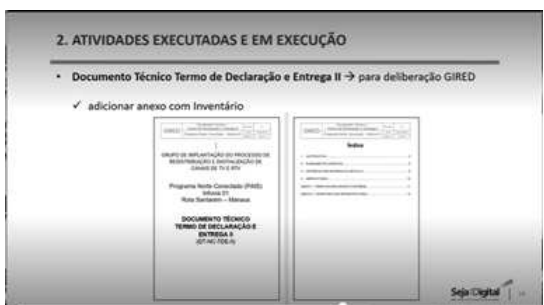

Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** questionou aos membros do GIRED se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado ou sugestões de melhoria de redação quanto ao **DOCUMENTO TÉCNICO DE REDE METROPOLITANA** e ao **DOCUMENTO TÉCNICO DE TERMO DE ENTREGA DAS REDES METROPOLITANAS**.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** declarou que ficam aprovados os documentos de diretrizes técnico-regulatórias para condução do projeto Norte Conectado, nos termos das minutas apresentadas nesta Reunião, as quais foram devidamente circuladas entre os membros do GIRED com a antecedência necessária.

Ato contínuo, o **Presidente do GIRED** passou para o item 4 da Pauta.

5. **ITEM 4 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL TV DIGITAL (GT-TV DIGITAL) E APROVAÇÃO DE EXCLUSÃO DE MUNICÍPIOS E CANAIS, DE REINCLUSÃO DE MUNICÍPIOS E CANAIS E DE COMPRA DE KIT.**

O **Presidente do GIRED** concedeu a palavra ao **Secretário Executivo do GIRED**, o **Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães, Coordenador do GT-TVD**.

O **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** agradeceu o **Presidente do GIRED** e informou que faria um relato, sem apresentação a ser projetada.

O **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** iniciou o seu relato destacando o trabalho intenso realizado no **GT-TVD** e nos subgrupos, com reuniões com representantes do GIRED, de segunda a quinta-feira para tratar de qualificação dos canais e de pendências de infraestruturas. Destacou as reuniões realizadas nos dias 9, 16, 23 e 30 nas quais foram tratadas as pendências de qualificação de canais, com a identificação de que existem canais que ainda estão em fase de avaliação pelo Ministério.

Além disso, o **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** reportou a realização da 25ª reunião do **GT-TVD** no dia 31 de março, na qual foram analisadas diretrizes para a instalação de municípios com energia provisória, bem como para municípios com canais ainda pendentes.

O **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** asseverou que, após os debates havidos no grupo sobre os canais, foi constatada a necessidade de propor aos membros do GIRED alguns itens para deliberação sobre o **GT-TVD**.

Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** questionou aos membros do GIRED se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** devolveu a palavra ao **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães, Coordenador do GT-TVD**.

O **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** agradeceu o **Presidente do GIRED** e, considerando o debate ocorrido entre os membros do **GT-TVD**, sugeriu, quanto à deliberação das alíneas “a” e “b” do Item 4 da Pauta, a não exclusão de municípios e canais no presente momento.

O **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** reportou, em relação às alíneas “c” e “d”, que foram identificadas que as exclusões de canais por motivo de licenciamento pelo próprio radiodifusor, realizadas na 84ª e 85ª Reuniões Ordinárias, não estavam previstas nos normativos que regem o projeto e, nestes termos, propôs a retratação da decisão que excluiu estes canais e, portanto, sugeriu a volta destes municípios para a esteira da EAD.

O **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** prosseguiu sua explanação manifestando que, quanto aos municípios que foram excluídos nas citadas reuniões, por determinação dos membros do GIRED, há a oportunidade de maximizar o resultado da política pública em execução, propondo que fosse oportunizado um prazo adicional para manifestação das Prefeituras e dos radiodifusores que ainda não estejam aderentes ao projeto, mantendo-se os contornos originais das premissas do projeto.

Por fim, o **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães**, no tocante à alínea “e” do item 4 da Pauta, informou que em 24 de abril de 2023 foi editada a Portaria MCOM nº 9.221 alterando os requisitos técnicos dos conversores a serem distribuídos à população carente no âmbito do Programa Digitaliza Brasil, o que possibilitará a compra de conversores tipo Zapper pela EAD. Nesse sentido, sugeriu aos membros do GIRED a aprovação da compra e, conseqüentemente, da distribuição de conversores tipo Zapper pela EAD.

Ao final de sua intervenção, o **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** agradeceu o empenho de todos os envolvidos no projeto e concedeu a palavra ao Secretário de Comunicação Social e Eletrônica, do Ministério das Comunicações, **Sr. Wilson Diniz Wellisch**.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** agradeceu ao **Presidente do GIRED** e ao **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães** e reiterou que há a possibilidade de distribuição dos conversores no modelo Zapper, garantindo a celeridade e a tranquilidade para que a EAD proceda à distribuição. Reportou que o grupo trabalhou internamente com a radiodifusão para maximizar a inclusão dos canais e municípios no programa, culminando no chamamento de forma derradeira dos municípios não qualificados, após os dois últimos processos de qualificação.

Nesse sentido, o **Sr. Wilson Diniz Wellisch** informou que, na próxima semana, será publicado o edital de chamamento para que seja apresentada a documentação, no prazo de 10 dias. Acrescentou, ainda, que o Ministério envidará os esforços necessários para que se tenha a assinatura de todos os termos de adesão das Prefeituras e habilitação dos canais até o final do dia 30 de maio, bem como para a análise dos casos dos municípios que tem a estação instalada e que tenham, contudo, canais que foram desqualificados, seja realizada até o final de junho. Com essas medidas, o **Sr. Wilson Diniz Wellisch** assinalou que poderá ser feito um encerramento digno e correto desse programa tão importante para a população brasileira.

Ao final das manifestações, o **Presidente do GIRED** propôs a deliberação das propostas apresentadas pelo **Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães, Coordenador do GT-TVD**, ratificadas pelo Secretário de Comunicação Social e Eletrônica, **Sr. Wilson Diniz Wellisch**.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a proposta de não exclusão de canais e municípios, bem como a reinclusão de canais e municípios que foram excluídos na 85ª Reunião Ordinária do GIRED, devendo ser observados os seguintes prazos:

- Para assinatura dos Termos de Adesão pelas Prefeituras e para habilitação de canais em municípios que não tenham outros canais já habilitados: 30 de maio de 2023, não sendo permitida a habilitação de novos municípios, a partir desta data;
- Prazo para habilitação de canais em municípios com outros canais já habilitados dentro do programa: 30 de junho de 2023, não sendo permitida a habilitação de novos canais, após esta data.

O **Presidente do GIRED** ressaltou que, para o caso de novas inclusões no projeto, devem ser obedecidos os prazos definidos nesta Reunião Ordinária.

Na seqüência, o **Presidente do GIRED** declarou que, com as alterações dos prazos mencionados, fica determinado que a EAD deverá apresentar ao GIRED, até o dia 30 de setembro de 2023, o relatório final de execução de atividades, relatório contábil e parecer formulado por auditoria independente no intuito de que os documentos sejam apreciados pelo grupo executivo e submetidos ao Conselho Diretor com vistas à aprovação do encerramento das atividades da EAD e do GIRED.

Por fim, o **Presidente do GIRED** declarou que, em virtude da expedição da Portaria MCOM nº 9221, de 24 de abril de 2023, fica aprovada a compra e distribuição dos conversores tipo Zapper e salientou que essa compra deve se dar de forma racional e econômica de modo que, ao final do programa, não reste uma quantidade expressiva de kits.

Antes de passar para o item 5 da Pauta, o **Presidente do GIRED** fez um apelo aos técnicos da Anatel, do Ministério e da EAD para que seja feito o esforço necessário no sentido de dar seqüência ao fluxo do processo dentro dos prazos assinalados nesta Reunião Ordinária.

Concedida a palavra, o **Sr. Cristiano Flores, representante da Radiodifusão**, agradeceu as equipes técnicas da Anatel, na pessoa do Presidente da Anatel, do Ministério das Comunicações, na pessoa do Ministro Juscelino Filho e do Secretário de Comunicação Social e Eletrônica, Sr. Wilson Diniz Wellisch, e registrou que o número de municípios alcançados é bastante expressivo e será acrescido de mais municípios, em virtude das deliberações tomadas pelo Grupo nesta Reunião Ordinária. Nesse sentido, em nome da ABERT, o **Sr. Cristiano Flores** agradeceu a todos e relatou que os radiodifusores estarão empenhados na execução das atividades finais junto às emissoras e às Prefeituras para a finalização do projeto de forma exitosa na data indicada de setembro de 2023.

O **Presidente do GIRED** solicitou que tanto a ABERT quanto a ABRATEL se esforcem para interagir com os municípios e os radiodifusores no sentido de acelerar os procedimentos, haja vista que os custos das estações serão maiores do que as que já foram feitas.

Concedida a palavra, o **Sr. Oscar Pettersen** sugeriu a todos que seja feito pela EAD um livro que possa contar a história deste *case* de sucesso mundial de parceria público privada, bastante inovadora no setor de telecomunicações.

O **Presidente do GIRED** endossou as palavras do **Sr. Oscar Pettersen** e registrou que, recentemente, esteve em um evento sobre parceria público privada, no Panamá, e citou o trabalho da EAD como exemplo.

Concedida a palavra, o **Sr. Wilson Diniz Wellisch** também endossou as palavras do **Sr. Oscar Pettersen** e registrou que este processo tão exitoso e inovador merece ser documentado. Além disso, complementou as palavras do **Sr. Cristiano Flores** para informar que o Ministro tem conversado pessoalmente com parlamentares e prefeitos para que sejam resolvidas as últimas pendências, e que foi feito um contato com a Confederação Nacional de Municípios para solicitar a colaboração no processo de comunicação junto aos municípios para resolução das pendências.

Concedida a palavra, o **Sr. Antonio Martelletto** registrou que está à frente da EAD há oito anos e que o projeto foi um sucesso graças ao trabalho conjunto e incessante de todos os envolvidos na busca por atingir os objetivos do projeto.

Ao final, o **Presidente do GIRED** salientou que o esforço final do Grupo é muito importante para alcançar o melhor percentual possível de novos municípios e, de outra parte, o resgate dos municípios retardatários é uma chance única para que eles ingressem no processo, pois, como já dito nesta Reunião Ordinária, os custos desta reinclusão serão maiores.

Ato contínuo, o **Presidente do GIRED** passou para o item 5 da Pauta.

6. ITEM 5 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.

O **Presidente do GIRED** questionou aos membros do GIRED presentes se possuíam algum assunto que quisessem tratar na presente Reunião.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** passou para o item 6 da Pauta.

7. ITEM 7 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MAIO DE 2023.

O **Presidente do GIRED** propôs que a próxima Reunião Ordinária do GIRED seja realizada no dia 30 de maio de 2023 (terça-feira) às 10:00h, de forma remota, e questionou aos membros do GIRED se estariam todos de acordo com essa data.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** definiu a data da 88ª Reunião Ordinária do GIRED para o dia 30 de maio de 2023 (terça-feira) às 10:00h, de forma remota.

O **Presidente do GIRED** agradeceu a presença de todos os membros e concluídos os assuntos constantes da Pauta, declarou encerrada a 87ª Reunião Ordinária do Grupo.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Oliveira Caram Guimarães, Secretário do Grupo**, em 06/06/2023, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Moisés Queiroz Moreira, Conselheiro**, em 12/06/2023, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Concolato Mejias, Usuário Externo**, em 26/06/2023, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 30/06/2023, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Carlos Abrahao, Usuário Externo**, em 13/07/2023, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Monique Pereira Ibitinga de Barros, Diretora de Planejamento Regulatório**, em 14/07/2023, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10278864** e o código CRC **252B2B24**.
