

REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GIRED

Data: 31 de Janeiro de 2025 (sexta-feira).

Horário: 09:58h às 11:18h.

Local: Plataforma Teams.

LISTA DE PRESENÇA MEMBROS DO GIRED:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	PRESENTE NA REUNIÃO?
Presidente do GIRED - Anatel	---	Carlos Manuel Baigorri	NÃO
Secretário Executivo do GIRED - Anatel	---	Vinicius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Ministério das Comunicações	Titular	Secretario de Comunicação Social Eletrônica	NÃO
	Suplente	Secretário de Telecomunicações	SIM
Representante dos Radiodifusores	Titular	João Camilo Junior	NÃO
	Suplente	Maíra Carneiro Bittencourt Maia	SIM
	Titular	Flávio Lara Resende	SIM
	Suplente	Luiz Carlos Abrahão	SIM
	Titular	Raymundo Costa Pinto Barros	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	SIM
	Titular	Wender Almeida de Souza	SIM
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	NÃO
Proponentes Vencedoras	Titular - Telefônica	José Gonçalves Neto	NÃO
	Suplente - Telefônica	Marcus Vinicius Brunetti	SIM
	Titular - Claro	Antônio Oscar Petersen	NÃO
	Suplente - Claro	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular - Algar Telecom	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente - Algar Telecom	Érica Rocha de Paula Lima	NÃO
	Titular - Tim	Mario Girasole	NÃO
	Suplente - Tim	Marcelo Concolato Mejias	NÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

Nome	Entidade
Antônio Carlos Martelleto	EAD
Marcos Vinicius Vieira Lima	Anatel (Colaborador)
Túlio Miranda Barros	Anatel
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel
Rodrigo Cruz Gebrim	Anatel
Renato de Campos Ribeiro	EAD
Marcos Vinicius Ramos Cruz	Anatel
Paulo Vaggione	Sejadigital
Rogério Adriano Fernandes	Anatel
Antonio Celso Guimarães Teixeira	Mcom
Raul Lara Campos	Claro
Cristian Charles Marlow	Anatel
Kim Moraes Mota	Anatel
Ana Elisa	Globo
Fernando Cesar Araujo	Sejagital
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel
MELISSA CARVALHO COELHO	Claro
Sebastiao Sergio De Oliveira Junior	TIM
Karine Medeiros Dias	Anatel
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Marcelo Carvalho da Silva	Telefonica

ASSUNTOS:

1. SAUDAÇÃO INICIAL

O **Secretário do GIRED, Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães**, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e registrou que devido a excepcional ausência do **Presidente da Anatel, Sr. Carlos Manuel Baigorri, Presidente do GIRED**, e, conforme previsão contida no art. 16, inciso I, do Regimento Interno, na qualidade de **Secretário do GIRED**, substituiria o **Presidente do GIRED** nesta Reunião Extraordinária.

Ato contínuo, o **Secretário do GIRED** registrou a participação do **Sr. Sebastião** como Representante Excepcional do **Sr. Mário Girasole**, da empresa TIM. Também registrou a participação dos demais, a pedido dos representantes oficiais dos membros do GIRED.

Após, o **Secretário do GIRED** passou para o item 1 da Pauta.

## 2. ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

O **Secretário do GIRED** informou que não foram recebidas solicitações ou manifestações sobre a minuta de Ata previamente circulada. Desta forma, questionou aos membros do GIRED se existiria algum ajuste em relação à versão encaminhada do documento.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** declarou que fica aprovada a Ata da 97ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2024.


Concluída a deliberação, o **Secretário do GIRED** passou para o item 2 da Pauta.

## 3. ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD)

O **Secretário do GIRED** solicitou que o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** fizesse uma apresentação dos trabalhos.

O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades da EAD, projetando o *slide* abaixo reproduzido que mostra uma visão geral dos projetos da terceira temporada da **Seja Digital**, ressaltando que se concentraria no projeto que se encontra mais avançado e em execução referente ao Atendimento às Localidades com SMP:

### Ciclo de Vida do Projeto

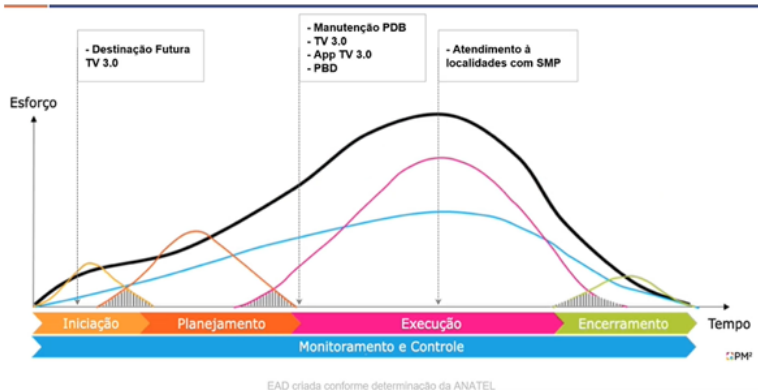

Na sequência, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** exibiu o *slide* abaixo que apresenta a *status* do Leilão 01, realizando a leitura das informações nele contidas:

### Leilão 01 – Status

- 50 localidades concluídas
- 25 localidades concluídas e com documentação entregue e verificada pela EAD
- A instalação das localidades concluídas foram dentro do polígono definido



No que se refere ao atesto do cumprimento do objeto, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** exibiu o seguinte *slide*:

### Leilão 01 – Atesto do cumprimento do objeto

Conforme Edital 01, a verificação do cumprimento do objeto do Termo de Compromisso com a EAD se deu conforme descrito no item 11.1, Anexo I - itens 5.5 e 6.2.9 e Anexo IV – cláusulas 4ª e 8ª, com o envio de documentos, atestando a implantação da cobertura na localidade.

De acordo com item 11.1.1 do Edital 01, os documentos foram enviados pelo email [leilao@sejadigital.com.br](mailto:leilao@sejadigital.com.br), com o seguinte conteúdo:

- Licença de Funcionamento de Estação que atenda a Localidade.
  - Laudo de vistoria assinado por responsável técnico independente com registro fotográfico, atestando a efetiva operação da estação, de acordo com os dados da licença da ANATEL.
  - Termo de Compromisso com ANATEL Edital 01 assinado (que contenha a localidade).
- EAD criada conforme determinação da ANATEL.

Ainda sobre o atesto, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** apresentou a lista das 25 localidades, cujos documentos foram entregues e verificados pela EAD:

## Leilão 01 – Atesto do cumprimento do objeto

Documentos entregues e verificados pela EAD para as 25 localidades abaixo:

Item Edital	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)	Compromissária	6-Atribuição de todos os elementos (RAM, Core, Acesso) e testes usuário nível	Data Limite para Entrega Documento (Entrega+30)	Entrega Documento Licença + Lanche (Anatel)	Entrega Documento Termo ANATEL (Anatel)	Validação EAD
2	BA	Ponto de Mairi	Mairi	Brisanet	08/01/2025	07/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
7	MA	Novo Bacabal	Açailândia	Brisanet	07/01/2025	06/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	20/01/2025
8	MA	Novo Mundo	Amarante do Maranhão	Brisanet	07/01/2025	06/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025
9	MA	Pindarezinho	Amarante do Maranhão	Brisanet	07/01/2025	06/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025
10	MA	Groirão	Amarante do Maranhão	Brisanet	08/01/2025	07/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025
11	MA	Brejinho	Bacabal	Brisanet	07/01/2025	06/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025
13	MA	Aldeia	Balsas	Brisanet	19/12/2024	18/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	20/01/2025
14	MA	Engenho d'Água	Caxias	Brisanet	22/12/2024	21/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	20/01/2025
21	MA	Gato	Passagem Franca	Brisanet	22/12/2024	22/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	20/01/2025
18	MA	Jiquiri	Esperantópolis	Brisanet	06/01/2025	05/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
19	MA	Ludovico	Lago do Junco	Brisanet	21/12/2024	20/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	20/01/2025
22	MA	Bacabinha	Passagem Franca	Brisanet	19/12/2024	18/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	28/01/2025
24	MA	Pau d'Arco	Pedreiras	Brisanet	21/12/2024	20/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	20/01/2025
28	MA	Barro Vermelho	Poço de Pedras	Brisanet	08/01/2025	07/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
29	MA	Lucindo	Poço de Pedras	Brisanet	19/01/2025	08/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
37	MA	Prata de Aracá	Guimarães	Brisanet	06/01/2025	05/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
41	MA	São Domingos	Brejo de Areia (Árvila Santa Luzia)	Brisanet	08/01/2025	07/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025
45	MG	Pomba	Ouro Fino	TIM	30/12/2024	29/01/2025	31/12/2024	15/01/2025	20/01/2025
49	PB	Barreiras	Caruarú	Brisanet	07/01/2025	06/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
51	PE	Lagoa de São José	Bom Conselho	Brisanet	07/01/2025	06/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025
56	CE	Volta	Paracuru	Brisanet	30/12/2024	29/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	20/01/2025
57	CE	Setor Gerencial	Parajubá	Brisanet	19/12/2024	17/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	20/01/2025
58	CE	Cana Brava	Trairi	Brisanet	12/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	20/01/2025
59	CE	Emboaca	Trairi	Brisanet	12/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	20/01/2025

EAD criada conforme determinação da ANATEL

## Leilão 01 – Atesto do cumprimento do objeto


Apresentação de documentação ao GT-SMP, para encaminhamento junto ao GIRED.

Item Edital	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)	Compromissária	6-Atribuição de todos os elementos (RAM, Core, Acesso) e testes usuário nível	ANATEL-Licença para Funcionamento de Estação-Numero Estação	ANATEL-Licença para Funcionamento de Estação-Nome Estação	ANATEL-Licença para Funcionamento de Estação-Data Emissão
2	BA	Ponto de Mairi	Mairi	Brisanet	08/01/2025	1016381708	MRY002	02/01/2025
7	MA	Novo Bacabal	Açailândia	Brisanet	07/01/2025	1016366261	ACD0012	18/12/2024
8	MA	Novo Mundo	Amarante do Maranhão	Brisanet	07/01/2025	1016366385	ATH0003	18/12/2024
9	MA	Pindarezinho	Amarante do Maranhão	Brisanet	07/01/2025	1016367284	ATH0005	19/12/2024
10	MA	Groirão	Amarante do Maranhão	Brisanet	08/01/2025	1016346465	ATH0004	12/12/2024
11	MA	Brejinho	Bacabal	Brisanet	07/01/2025	1016366270	BEL0009	18/12/2024
13	MA	Aldeia	Balsas	Brisanet	19/12/2024	1016346473	BLA0016	12/12/2024
14	MA	Engenho d'Água	Caxias	Brisanet	22/12/2024	1016366296	CXS0013	18/12/2024
17	MA	Aquiles Lisboa	Cururuçu	Brisanet	08/01/2025	1016366288	CUR0005	18/12/2024
18	MA	Jiquiri	Esperantópolis	Brisanet	06/01/2025	1016381856	ESS0002	02/01/2025
19	MA	Ludovico	Lago do Junco	Brisanet	21/12/2024	1016381678	LGJ0002	02/01/2025
21	MA	Gato	Passagem Franca	Brisanet	22/12/2024	1016381666	PFC0003	02/01/2025
22	MA	Bacabinha	Passagem Franca	Brisanet	19/12/2024	1016389415	PFC0002	07/01/2025
24	MA	Pau d'Arco	Pedreiras	Brisanet	21/12/2024	1016367306	PDZ0004	19/12/2024
28	MA	Barro Vermelho	Poço de Pedras	Brisanet	08/01/2025	1016381899	PAC0003	02/01/2025
29	MA	Lucindo	Poço de Pedras	Brisanet	17/01/2025	1016381880	PAC0002	02/01/2025
37	MA	Prata de Aracá	Guimarães	Brisanet	06/01/2025	1016381864	GMH0002	02/01/2025
41	MA	São Domingos	Brejo de Areia (Árvila Santa Luzia)	Brisanet	08/01/2025	1016381848	BIAA0002	19/12/2024
45	MG	Pomba	Ouro Fino	TIM	30/12/2024	1016281061	MOUUF_0660	19/12/2024
49	PB	Barreiras	Caruarú	Brisanet	07/01/2025	1016381244	CRAU0002	02/01/2025
51	PE	Lagoa de São José	Bom Conselho	Brisanet	07/01/2025	1016366434	BCE0006	19/12/2024
56	CE	Volta	Paracuru	Brisanet	30/12/2024	1016367349	PAK0009	19/12/2024
57	CE	Setor Gerencial	Parajubá	Brisanet	19/12/2024	1016367357	PWR0006	19/12/2024
58	CE	Cana Brava	Trairi	Brisanet	12/12/2024	1016346457	TRY0013	12/12/2024
59	CE	Emboaca	Trairi	Brisanet	12/12/2024	1016367381	TRY0014	19/12/2024

EAD criada conforme determinação da ANATEL

O Sr. Antônio Carlos Martelletto exibiu o *slide* a seguir para mostrar a próxima etapa do Leilão 01, caso o GIRED delibere sobre a validação do atesto feito pela EAD nesta Reunião Extraordinária:

### Leilão 01 – Próxima etapa

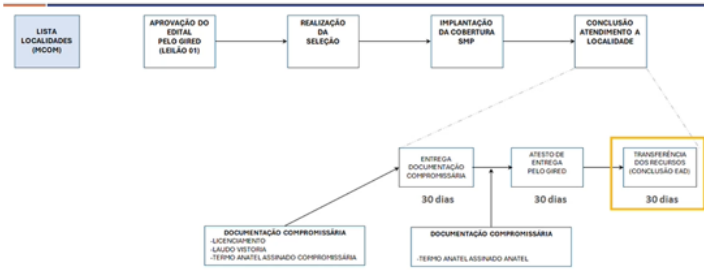


Caso validado pelo GIRED, as compromissárias referentes as localidades apresentadas estariam autorizadas a emitir as respectivas Notas de Débito, e entregar a EAD.

A transferência de recursos só poderá ser executada após aprovação da respectiva ata de reunião, conforme Cláusula 8ª, parágrafo único, do Anexo IV do Edital 01.

Passando a reportar as informações sobre o Leilão 02, o Sr. Antônio Carlos Martelletto projetou o *slide* abaixo transcrito que mostra o seu fluxo macro, destacando a previsão de aprovação do edital nesta Reunião Extraordinária e, que, assim que houver a sua publicação, terão a mesma sequência de atividades, seguindo basicamente o fluxo inicialmente proposto para o projeto:

### Leilão 02 – Fluxo macro

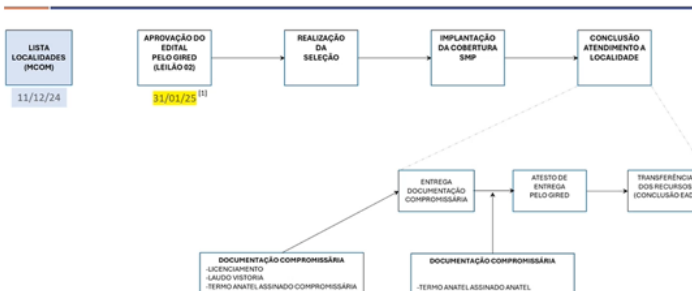

[1] Data prevista para aprovação do Edital

Por fim, ainda sobre o Leilão 02, o Sr. Antônio Carlos Martelletto deu destaque à deliberação a ser tomada nesta Reunião Extraordinária, a saber:

- Prevista na pauta 19ª RE do GIRED (31/Jan/25), a deliberação do Documento de Diretrizes para seleção de prestadoras e atendimento a localidades com SMP e do respectivo Edital referente à Fase 2 do Projeto Adicional de Atendimento de Localidades com SMP

EAD criada conforme determinação da ANATEL

Concluída a apresentação, o **Secretário do GIRED** questionou aos membros do GIRED se haveria comentários em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** passou para o item 3 da Pauta.

4. **ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL DE ATENDIMENTO DE LOCALIDADES DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (GT-SMP).**

O **Secretário do GIRED** solicitou ao **Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** que fizesse um relato das atividades do grupo e, antes de conceder a ele a palavra, destacou que o trabalho tem sido muito bem executado por todos no âmbito do grupo e dos subgrupos, ressaltando que tiveram um êxito no *compliance* bem adequado do leilão reverso 01, atingindo o objetivo proposto da política pública no Ministério e no Grupo.

Passada a palavra, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e agradeceu ao **Secretário do GIRED** e a todo o Grupo que permitiram a ele chegar até esse momento para fazer as propostas que passará a apresentar nesta Reunião Extraordinária.

Nesse contexto, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** passou a relatar o acompanhamento que o **GT-SMP** vem realizando em relação às etapas do Leilão 01, ressaltando que as empresas são obrigadas, por força do Edital, a apresentar, a cada 30 (trinta) dias, um Relatório de Acompanhamento das entregas referentes às instalações das ERBs e, nesse contexto, exibiu o *slide* abaixo:



Sobre o tema em apreço, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** salientou que, se for necessário, teriam até o prazo final, que é de 180 dias, a entrega do último Relatório de Acompanhamento com previsão para o dia 09 de abril de 2025, ressaltando que a expectativa é de que as entregas sejam feitas antes disso, visto que faltariam apenas 9 localidades para serem entregues, conforme já colocado.

Na sequência, ainda sobre o acompanhamento do Leilão 01, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** registrou as seguintes informações a respeito dos Termos de Compromisso celebrados entre a Anatel e as proponentes vencedoras:



Além disso, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** destacou, conforme colocado pela EAF, as informações contidas no *slide* a seguir reproduzido:

## Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 01



LOCALIDADES COM ERBS  
INSTALADAS: 50 / 85%



LOCALIDADES COM ATESTE  
DA IMPLANTAÇÃO: 25 / 42,5%

No que se refere a esse tema, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** informou que as 50 localidades com ERBs instaladas representam 85% do projeto da Fase 1, sendo que 25 localidades já tiveram o ateste da EAD, com o recebimento da documentação e a comprovação de que foram cumpridos todos os requisitos do Edital para essas localidades e aguardando a quitação por parte da EAD.

Nesse sentido, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** ressaltou que, conforme manifestação do **Sr. Antônio Carlos Martelletto**, faz-se necessário que essas 25 localidades implantadas passem por avaliação do GIREd, informando, portanto, que o GT avaliou a apresentação da EAD e deu como cumprida essa etapa, razão pela qual apresentou a seguinte proposta ao Grupo:

### Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 01

Proposta de  
Deliberação

Considerando que a EAD procedeu com a verificação do cumprimento do objeto do Termo de Compromisso com a EAD em conformidade com o estabelecido no Edital 01/2024, e apresentou o ateste da implantação da cobertura na localidade, sugere-se a validação final pelo GIREd do cumprimento do objeto do Termo de Compromisso com a EAD das 25 localidades apresentadas, conforme exigido pelo no item 11.2 e Cláusula 8ª do Anexo IV do Edital 01/2024

Passando a reportar o *status* do Leilão 02, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** registrou que ele se encontra em discussão há algum tempo, com a realização de várias reuniões no âmbito do GT para debater o seu texto e destacou as seguintes informações:

### Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 02

Edital  
Leilão  
02

Nos moldes do Leilão 01

Detalhes ajustados com as lições aprendidas do Edital anterior

Maior prazo para todas as etapas do Edital

Necessária Atualização do Documento de Diretrizes para seleção de prestadoras e atendimento a localidades com SMP

Sobre os prazos das etapas do edital do Leilão 02, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** ressaltou que terão maior prazo desde a etapa para tirar dúvidas, para a avaliação e para a manifestação de interesse, afirmando que apenas uma ou outra etapa ficou com o mesmo prazo, mas que as mais importantes, a pedido da empresa, terão um prazo maior.

Feitas essas considerações, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** apresentou a proposta de deliberação feita pelo GT ao GIREd:

### Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 02

Proposta de  
Deliberação

Após inúmeras reuniões com os integrantes do Grupo GT-SMP, que aprofundou na discussão do texto do Edital 02/2025, bem como dos seus anexos e dos prazos para implantação, sugere-se a realização do Leilão 02, nos moldes da Leilão 01, sugerindo-se a aprovação da revisão do Documento de Diretrizes para seleção de prestadoras e atendimento a localidades com SMP, Documento Regulatório - DR1, pelo GIREd, com a adição como Anexo II do Edital 02/2025 e seus respectivos anexos.

Em seguida, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** informou que também teriam, no âmbito do acompanhamento realizado pelo **GT-SMP**, a Portaria MCOM nº 15.680, de 20 de dezembro de 2024, exibindo, nesse contexto, o *slide* a seguir transcrito:



## GT-SMP: Ampliação do escopo do Projeto

PORTARIA  
MCOM Nº  
15.680, DE  
20 DE  
DEZEMBRO  
DE 2024

Art. 1º Alterar o inciso IV, do art. 1º da Portaria MCTIC nº 6.370, de 19 de novembro de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º

..... IV- Projetos de implantação de Estações Rádio Base- ERB que permitam a oferta do Serviço Móvel Pessoal - SMP por meio de padrão tecnológico igual ou superior ao Long Term Evolution- LTE Advanced release 10 do 3GPP, em localidades ainda desatendidas ou trechos de rodovias não cobertos, com prioridade para rodovias federais, conforme definidas pela Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, desde que não sejam redundantes em relação a compromissos já assumidos;

.....", (NR)

Quanto a esse ponto, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** destacou que a Portaria MCOM nº 15.680, de 20 de dezembro de 2024, expande e amplia o escopo do Projeto Adicional de Atendimento a Localidades com SMP, razão pela qual passou a apresentar a seguinte proposta de deliberação ao GIRED:

### Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 02

Proposta de Deliberação

Considerando a edição da Portaria nº 15.680, de 20 de dezembro de 2024, que alterou o inciso IV do artigo 1º da Portaria nº 6.370, de 19 de novembro de 2019, onde o Ministério das Comunicações ampliou a possibilidade de utilização dos recursos financeiros para os projetos de implantação de ERBs em localidades ainda desatendidas ou trechos de rodovias não cobertos, sugere-se que seja submetido ao Conselho Diretor da Anatel, proposta de adequação do projeto aprovado pela Acórdão nº 203, de 15 de agosto de 2024, publicado no Diário Oficial da União de 16 de agosto de 2024, SEI nº 12436025, considerando a ampliação do escopo, bem como salientando que após a publicação do novo decreto verificou-se a inserção da possibilidade de atendimento a rodovias, possibilidade que não havia sido informada na última reunião do GIRED, onde o assunto já havia sido apresentado.

O **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** corrigiu a informação constante do slide *acima*, em virtude da menção ao termo "Decreto", quando, na verdade, quis se referir ao termo "Portaria". Ainda sobre o assunto, destacou que, na última Reunião do GIRED, já havia sido aprovada uma ampliação do escopo do projeto, porém, não estava contemplando a possibilidade de rodovias, sendo essa a razão da proposta de deliberação pelo GIRED nesta Reunião no sentido de ampliar o escopo, considerando, inclusive, as rodovias.

Concluída a apresentação, o **Secretário do GIRED** questionou aos membros do GIRED se haveria comentários em relação ao que foi apresentado.

Concedida a palavra, o **Sr. Hermano Barros Tercius** afirmou que gostaria apenas de corroborar com a manifestação do **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** e complementar, ressaltando que, com a alteração da Portaria, a ideia foi a de retirar a restrição de localidades já previstas em compromissos, justamente para possibilitar ter no projeto a antecipação de compromissos. Esclareceu que são compromissos já previstos, mas que farão uma antecipação, sendo um novo tipo de compromisso, na verdade, e que não restringe as localidades já previstas. E com relação à inclusão de rodovias, esclareceu que a ideia foi poder conferir mais opções para que o GIRED pudesse também atuar nessa área considerada tão importante para o País, isto é, a cobertura de rodovias. Finalizou afirmando que fizeram a atualização da Portaria com o *input* dado pelo GIRED ao Ministério, com esse intuito de poder ampliar e conseguir atender também mais política pública.

Não havendo manifestações adicionais, o **Secretário do GIRED** passou para o item 4 da Pauta.

#### 5. ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A VALIDAÇÃO FINAL DO GIRED QUANTO AO CUMPRIMENTO DO OBJETO DE TERMOS DE COMPROMISSO REFERENTES A LOCALIDADES DO LEILÃO 01.

O **Secretário do GIRED** registrou que, conforme apresentado pelo **Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar**, constatou-se que a EAD procedeu com a verificação do cumprimento do objeto dos Termos de Compromisso com ela firmados em relação a 25 localidades apresentadas nesta Reunião, com o respectivo atesto da documentação encaminhada pelas compromissárias, em conformidade com o item 11.1 do Edital do Leilão 01. Adicionalmente, salientou que, consoante previsão contida no item 11.2.1 do referido Edital, constatou-se que as compromissárias também celebraram o Termo com a Anatel.

Desta forma, o **Secretário do GIRED**, considerando o exposto e ainda o teor do item 11.2.1 do Edital do Leilão 01, questionou aos membros do GIRED se concordavam com a proposta de validação final do atesto feito pela EAD com relação ao cumprimento do objeto dos Termos de Compromisso dessas 25 localidades do Leilão 01, nos termos apresentados nesta Reunião.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** declarou que fica aprovada a validação final do atesto feito pela EAD com relação ao cumprimento do objeto dos Termos de Compromisso de 25 localidades do Leilão 01, nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou à **Secretaria do GIRED** a elaboração de Portaria, nos termos da deliberação tomada na presente Reunião.

Concluída a deliberação, o **Secretário do GIRED** passou para o item 5 da Pauta.

#### 6. ITEM 5 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A REVISÃO DO DOCUMENTO DE DIRETRIZES PARA SELEÇÃO DE PRESTADORAS E ATENDIMENTO A LOCALIDADES COM SMP E DO RESPECTIVO EDITAL REFERENTE À FASE 2 DO PROJETO ADICIONAL DE ATENDIMENTO DE LOCALIDADES COM SMP.

O **Secretário do GIRED** questionou aos membros do GIRED se concordavam com a proposta de revisão do Documento de Diretrizes para seleção de prestadoras e atendimento a localidades com SMP e do Edital referente à Fase 2 do Projeto Adicional, conforme apresentado pelo **Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar**, devendo a versão final do anexo referente à lista de localidades ser publicada juntamente com o Edital da Fase 2.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** declarou que fica aprovada a revisão do Documento de Diretrizes para Seleção de Prestadoras e Atendimento a Localidades com SMP e o respectivo Edital referente à Fase 2 do Projeto Adicional, nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou à **Secretaria do GIRED** a elaboração da Portaria, nos termos da deliberação tomada na presente Reunião.

Concluída a deliberação, o **Secretário do GIRED** passou para o item 6 da Pauta.

#### 7. ITEM 6 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE O ENVIO DE PROPOSTA PARA AMPLIAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO ADICIONAL DE ATENDIMENTO DE LOCALIDADES COM SMP PARA APRECIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DA ANATEL.

O **Secretário do GIRED** registrou que, conforme apresentado pelo **Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar**, e também reiterado pelo **Sr. Hermano Barros Tercius**, verificou-se que, com a edição da Portaria nº 15.680, de 20 de dezembro de 2024, houve a alteração do inciso IV do art. 1º da Portaria nº 6.370, de 19 de novembro de 2019, no qual o Ministério das Comunicações ampliou a possibilidade de utilização dos recursos financeiros para os projetos de implantação de ERBs em localidades ainda desatendidas, em trechos de rodovias não cobertos e possibilitando também a antecipação de possíveis metas de leilões anteriores.

Desta forma, o **Secretário do GIRED**, considerando o exposto, questionou aos membros do GIRED se concordavam com o envio da proposta de ampliação do escopo do Projeto Adicional de Atendimento de Localidades com SMP, para apreciação do Conselho Diretor da Anatel, nos termos apresentados nesta Reunião.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** declarou que fica aprovado o envio da proposta de ampliação do escopo do Projeto Adicional de Atendimento de Localidades com Serviço Móvel Pessoal, para apreciação do Conselho Diretor da Anatel, nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou à **Secretaria do GIRED** a adoção das providências necessárias para o encaminhamento de Matéria para Apreciação do Conselho Diretor da referida proposta.

Concluída a deliberação, o **Secretário do GIRED** passou para o item 7 da Pauta.

#### 8. **ITEM 7 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.**

O **Secretário do GIRED** questionou aos membros do GIRED se possuíam algum outro assunto a ser tratado nesta Reunião.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** afirmou que gostaria de lembrar que a EAD completará 10 anos de existência, com um trabalho intenso e que assim continuaria até o fim dos projetos.

O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** agradeceu a lembrança e afirmou que o mais importante é o trabalho em grupo e que, a seu ver, trata-se de um trabalho bem colaborativo, ressaltando que o sucesso do projeto estaria muito ligado a sua governança, onde todas as partes interessadas estão na mesa buscando encontrar a solução para os problemas que acontecem todo dia.

O **Sr. Hermano Barros Tercius** também parabenizou pelos 10 anos de existência da EAD, com muito trabalho e bons resultados.

Por fim, o **Secretário do GIRED** reiterou a data da 98ª Reunião Ordinária do GIRED, que será realizada no dia 18 de fevereiro de 2025, terça-feira, às 10 horas, de forma remota.

Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o **Secretário do GIRED** agradeceu a presença de todos os membros e declarou encerrada a 19ª Reunião Extraordinária do Grupo.



Documento assinado eletronicamente por **Maira Carneiro Bittencourt Maia**, **Usuário Externo**, em 27/02/2025, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy**, **Usuário Externo**, em 27/02/2025, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Wender Almeida de Souza**, **Usuário Externo**, em 27/02/2025, às 22:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Hermano Barros Tercius**, **Usuário Externo**, em 17/03/2025, às 21:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13261178** e o código CRC **2444C8B7**.
