

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE
IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE ACONSELHAMENTO (PDAs) NOS CRAS E
DEMAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA**

RELATÓRIO FINAL

17 DE JULHO A 31 DE OUTUBRO/2017



Sumário

1.	APRESENTAÇÃO	4
2.	RESUMO EXECUTIVO	4
3.	EQUIPE DE TRABALHO	5
4.	ÁREA DE LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS	8
4.1	Núcleo 01	9
4.2	Núcleo 02	11
5.	PÚBLICO ALVO	12
6.	CRONOGRAMA	14
7.	DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO	18
8.	ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – EAP	18
9.	DICIONÁRIO DA EAP	19
9.1	SELEÇÃO DE PESSOAL	19
9.1.1	Mobilização de Pessoal	19
9.1.2	Treinamento	21
9.2	DEFINIÇÃO DE LOCAL DOS PDAs	26
9.2.1	Instalação e Infraestrutura dos PDAs	26
9.2.2	Alinhamento com Gestores e Equipes	28
9.3	ACONSELHAMENTOS	29
9.3.1	Agendamento	29
9.3.2	Ações de Resposta	29
9.4	DEFINIÇÃO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO	30
9.4.1	Realização das Ações	30
9.4.2	Realização de Mutirões de Antenistas	39
9.4.3	Ação Porta a Porta (Antenistas e Veiculação de Carro de Som)	43
9.4.4	Veiculação de Carro de Som	45
9.4.5	Locação de Van	55
9.4.6	Fornecimento de Coffee Break	55
9.4.7	Fornecimento de Kit Lanche	55
9.5	GESTÃO E MONITORAMENTO	56
9.5.1	Emissão de Relatórios	57
10.	FLUXO DO PROCESSO DE AGENDAMENTO	57
11.	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	58
11.1	AGENDAMENTOS POR MUNICÍPIO	58

Lista de Figuras

Figura 1 - PDAs Serra	9
Figura 2 - PDAs Vitória.....	10
Figura 3 - PDAs Viana.....	10
Figura 4 - PDAs Vila Velha.....	11
Figura 5 - PDAs Guarapari.....	11
Figura 6 - PDAs Cariacica	12
Figura 7 - Camisa de Uniforme Mobilizador Social.....	20
Figura 8 - Crachá Mobilizador Social	20
Figura 9 - Treinamento 1ª Equipe.....	22
Figura 10 - Treinamento 2ª Equipe.....	23
Figura 11 – Treinamento “Sombra” – 1ª e 2ª Equipes	23
Figura 12 - Treinamento "Sombra" - 3ª Equipe	24
Figura 13 - Treinamento "Sombra" – Novos Mobilizadores Sociais	25
Figura 14 - Balcão em MDF e alumínio envelopado com a arte do Programa	27
Figura 15 - Galaxy Tab E 7.0" Wi-Fi.....	27
Figura 16 - Folder, cardápio e cartaz disponibilizados pela Seja Digital	28
Figura 17 - Fotos Diversas Mutirões e Ações de Agendamento	38
Figura 18 - Mutirão - Central Carapina/Serra	40
Figura 19 - Mutirão Planalto Serrano/Serra	40
Figura 20 - Mutirão Santa Rita/Vila Velha	40
Figura 21 - Mutirão Santa Mônica – Guarapari	41
Figura 22 - Mutirão Barramares/Vila Velha.....	41
Figura 23 - Fluxograma	57

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Agendamentos por Município	58
Gráfico 2 - Agendamentos por Município - Percentual.....	58
Gráfico 3 - Agendamento por PDA - Cariacica	59
Gráfico 4 - Agendamentos por PDA - Guarapari.....	60
Gráfico 5 - Agendamentos por PDA - Serra	61
Gráfico 6 - Agendamentos por PDA – Vitória	62
Gráfico 7 - Agendamentos por PDA – Viana.....	63
Gráfico 8 - Agendamentos por PDA – Vila Velha.....	64

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento resume as atividades realizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Integrado para Ações Sociais - IDEIAS no período de 17 de julho a 31 de outubro de 2017, referente à execução de serviços de “**Gestão e Operacionalização das ações de Implementação dos Pontos de Aconselhamento (PDAs) nos CRAS e demais equipamentos públicos**”, nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória - Espírito Santo. Serviços formalizados por meio do contrato DEJUR nº1034 e seus aditivos.

2. RESUMO EXECUTIVO

EIXO - ENTREGAS	META	INDICADOR	PERIODICIDADE	REALIZADO
SELEÇÃO DE EQUIPE	Selecionar toda a equipe que desenvolverá o projeto até o dia 14/07	Previsto/Realizado ≤ 85%: Crítico Previsto/Realizado de 86% a 94%: Regular Previsto/Realizado ≥ 95% a 100%: Aceitável	MÊS DE JULHO E AGOSTO	100%
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE	Realizar uma capacitação de no mínimo 08h para cada membro da equipe previamente aos atendimentos nos PDAs		MÊS DE JULHO E AGOSTO	100%
REALIZAR APRESENTAÇÃO PARA A DIREÇÃO DOS CRAS / EQUIPAMENTO PÚBLICO ONDE SERÁ IMPLANTADO O PDA¹	Realizar 06 reuniões de apresentação do PDA		MÊS DE JULHO E AGOSTO	16,66% ²
AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO	Realizar 06 mutirões de instalação do kit conversor digital durante o projeto		MÊS DE AGOSTO À OUTUBRO	100% ³
	Realizar 06 ações de sensibilização e divulgação, sendo 02 por mês		100% ⁴	

¹ Estas reuniões foram realizadas pela equipe da Seja Digital, com o suporte do Instituto Ideias, incluindo fornecimento de Coffee Breaks, quando solicitado.


² Foram solicitados 03 (três) coffee breaks, sendo o primeiro para reunião realizada no CRAS Santa Mônica/Guarapari em 14/07/2017 com 200 (duzentas) pessoas, o segundo para reunião realizada na Igreja Assembléia de Deus de Terra Vermelha/VV em 10/08/2017 com 100 (cem) pessoas e o terceiro para reunião realizada na Secretaria de Educação de Viana em 20/09/2017, com 50 (cinquenta) pessoas. Não houve novas solicitações.

³ Foram realizados 06 (seis) mutirões de instalação do kit conversor digital nos bairros Central Carapina/Serra, Planalto Serrano/Serra, Santa Rita/Vila Velha, Santa Mônica/Guarapari, Barramares/Vila Velha e Carapina Grande/Serra nos dias 02/09, 09/09, 16/09, 30/09, 07/10 e 14/10/2017, respectivamente. Nesses mutirões foram disponibilizados 219 (duzentos e dezenove) kits lanche para a equipe e mais 18 kit lanches para a equipe da Seja Digital.

⁴ Foram realizadas 62 (sessenta e duas) ações de sensibilização/agendamento nos municípios de Serra, Vitória, Cariacica, Guarapari, Vila Velha e Fundão nos meses de agosto, setembro e outubro.

3. EQUIPE DE TRABALHO

Para execução dos serviços propostos foi estruturada a equipe abaixo:

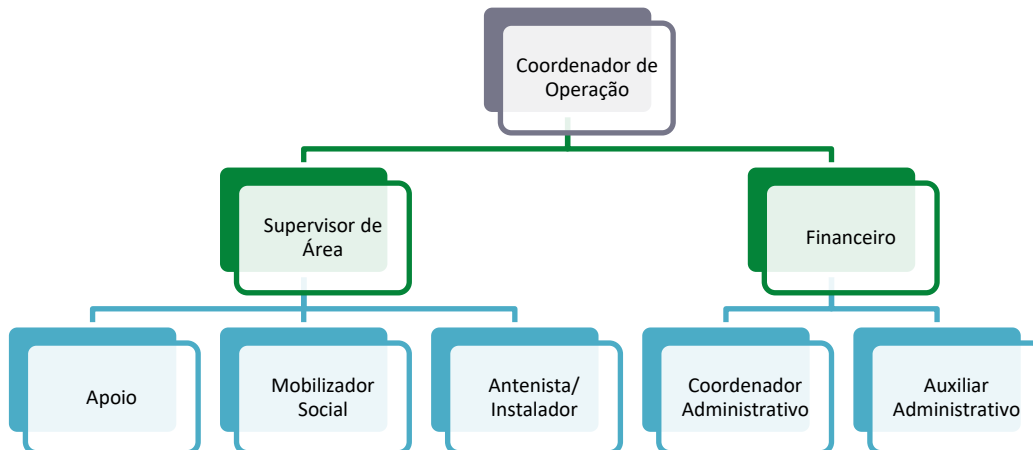

Ação	Cargo	Atividades	Quantidade no Pico
Coordenação geral dos PDAs	Coordenador de operações	Responsável pela coordenação geral do projeto e articulação junto a Seja Digital. Desenvolvimento das estratégias de implementação dos PDAs junto as CRAS e demais equipamentos públicos. Envio de relatórios mensais a Seja Digital. Coordenação da equipe multidisciplinar.	01
Supervisão de equipes	Supervisor de área	Supervisionar as atividades das equipes de promotores e verificar a eficiência dos atendimentos. Realizar os relatórios de acompanhamento semanais.	02
Prestação de contas	Financeiro	Responsável pela prestação de contas da instituição e gestão financeira dos recursos	01
Equipe de apoio	Apoio	Oferecer suporte e apoio para as atividades de sensibilização e divulgação.	02
Promotores dos PDAs	Mobilizador Social	Atendimento e agendamento dos beneficiários para recebimento dos Kits. Orientação quanto aos processos de mudança do sinal analógico para digital. Divulgação do trabalho e distribuição do material informativo. Mobilização dentro das comunidades.	60
Instalação de antenas	Antenista/Instalador	Responsável por realizar as instalar as antenas durante as ações de mutirão	30
Administrativo	Coordenador administrativo	Responsável pela logística dos materiais, programação de distribuição e instalação dos PDAs, funcionamento dos tablets e internet móvel, organização de sala de treinamento, coffee break e kit lanches.	01
Recursos Humanos	Auxiliar administrativo	Responsável pela seleção, mobilização, contratação de pessoal, folha de pagamento, controle de ponto e frequência, vale transporte, vale-refeição, demais atividades relacionadas aos recursos humanos envolvidos	01
TOTAL			98

EQUIPE	NOME
Coordenador de Operação	Luana Romero Moulin Teixeira
Supervisor de Área	Ana Célia Pereira Lopes Janaína Rodrigues Ferreira
Financeiro	Vitor Romero Moulin Teixeira
Apoio	Caio Chaves da Rocha Maxwel da Vitória Caliman
Mobilizador Social⁵	Mobilizadores Sociais Vitória: Alexandre Dantas Alice dos Santos Souza Carlos Eduardo Pompeu Barbosa Cintia de Souza da Silva Débora Piske de Souza* Diego Tiago Costa Elvis Muller Campos Segades Gabriella Coutinho Vieira Inglidy de Jesus Silva Izabela Santana Vitória Luciano Silva Manske Marly Rodrigues Gabriel* Matheus Conrado Caversan Paula Cristina Simões Pimentel Priscila Lopes Ribeiro Ramos
	Mobilizadores Sociais Vila Velha: Ana Paula Drumond* Ana Paula Santos Sansão Arianny Mansk Soares Chardson Rodrigues da Silva Claudio Tafarel da Silva Santos Giselly Queiroz Medeiros Hemilly Cristina Batista Geraldino Ivana Reis Nascimento Jocassia Matos da Silva Karoline da Penha Vieira* Lucas dos Santos Castro Mariana Martinelli Laino* Simon Felipe Suzart Chacon Yan Carlos Coelho
	Mobilizadores Sociais Serra: Allan Willam Araújo de Moraes AnaMaria Rosalia da Cruz Cleber Vieira Lima Daiani Souza Alves Daianny Bernardo Santana Emanuelle Silva Pinheiro Miranda Estevão Meneghel de Andrade Hugo Ferreira Contas Jéssika Pauli Avila Mesquita

⁵ Durante a execução do projeto houve uma rotatividade de membros dessa equipe, onde passaram 71 pessoas que ocuparam os 60 cargos dessa função.

	<p>José Hilton dos Santos Leandro Gonçalves Daltino Patrícia Silva* Rone Silva Santana Sandro da Silva Marinho Thielly Feliciano da Silva Willian Carneiro de Amorim*</p>
	<p>Mobilizadores Sociais Cariacica: Bianca Afonso Viana Lopes de Oliveira Bianca Carvalho Vertuani Felipe Schade da Silva Flávio Mendes da Vitória Geane Miranda Pereira Jorge Felipe Silva de Castro Luciana Ramos Steiner Luzimara Monteiro Michelle Amorim Lyra dos Santos da Silva Mídiã de Oliveira Silva Mylena da Silva Thiengo* Nádia Maria Panteleão* Rafaela Loyola Barboza Renata de Souza Oliveira Saskia Santiago Ribeiro*</p>
	<p>Mobilizadores Sociais Viana: Dulcinéia Faitanin Selva Eglécia Elen Honório Betini Clem Emilly Christian Telles Cosini Gleice Honória Betini Marina Uhl Prederigo Richarde Lages Costa</p>
	<p>Mobilizadores Sociais Guarapari: Chistian Loyola Garcia Fernanda Alves Machado Marie Elizabeth Barbosa dos Reis Silva Roney dos Santos Ferreira de Andrade Tamires Ramos Mendonça</p>
Antenista/Instalador	<p>1º Mutirão – 22 antenistas 2º Mutirão – 14 antenistas 3º Mutirão – 16 antenistas 4º Mutirão – 12 antenistas 5º Mutirão – 15 antenistas 6º Mutirão – 12 antenistas</p>
Coordenador Administrativo	Gabriela Barbosa
Auxiliar Administrativo	Marcela Sacramento Barbosa

Observação: *Estes Mobilizadores Sociais estiveram à disposição da Seja Digital para atuação nas ações de campo.

4. ÁREA DE LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS

A região do cluster de Vitória é composta por 07 municípios que englobam a região metropolitana, sendo estes: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Fundão, Guarapari e Viana. Os municípios que terão direito aos kits gratuitos fornecidos pela Seja Digital foram previamente triados pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS dentre beneficiários dos mais diversos projetos sociais conforme quantitativos a seguir:

Município	nº de PDAs
Serra	13
Vila Velha	13
Cariacica	11
Vitoria	12
Guarapari	04
Viana	05
Fundão	-
TOTAL	58

Desta forma é possível afirmar que os municípios de Serra e Vila Velha concentram 49% do público-alvo deste projeto.


Dos Pontos de Aconselhamento (PDAs) previamente indicados, foram implantados 58 (cinquenta e oito) nos CRAS e demais equipamentos públicos. Dois PDAs restantes seriam implantados no Faça Fácil de Cariacica, porém, não foram instalados por decisão do contratante e os Mobilizadores Sociais que atuariam nestes pontos foram disponibilizados para realizar ações de campo. Ressalta-se que estes PDAs já se encontravam montados e adesivados.

O projeto foi encerrado com 50 (cinquenta) PDAs em funcionamento, tendo em vista que por solicitação da Seja Digital os agentes foram realocados para executar ações de campo, totalizando assim uma equipe de 10 mobilizadores. Os PDAs extintos⁶ foram retirados dos locais onde estavam montados.

Cabe destacar, que a princípio seria implantado um PDA no município de Fundão, porém o atendimento em Fundão foi realizado em 03 (três) ações pontuais de agendamento realizadas nos dias 12, 19 e 26 de agosto de 2017, nas localidades do Centro, Timbuí e Praia Grande, respectivamente.

⁶ Os PDAs extintos estão identificados nos mapas com marcadores vermelhos.

Para melhor distribuição das atividades e acompanhamento das equipes em campo, foram criados 02 (dois) núcleos de supervisão, sendo divididos da seguinte forma:

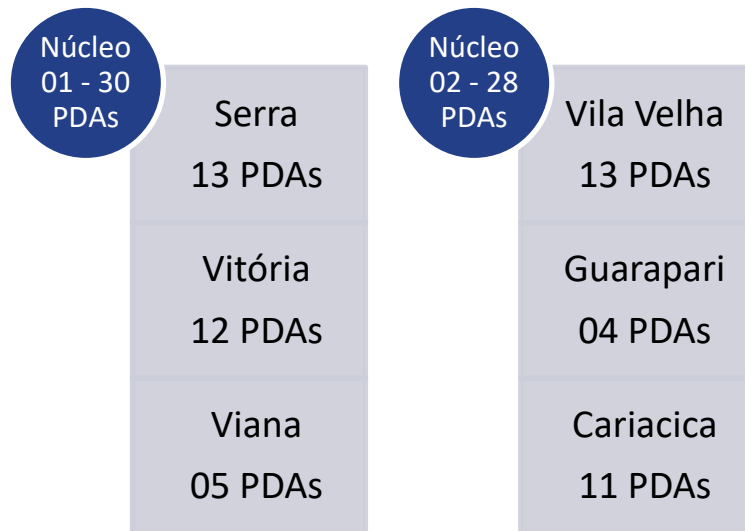

4.1 Núcleo 01

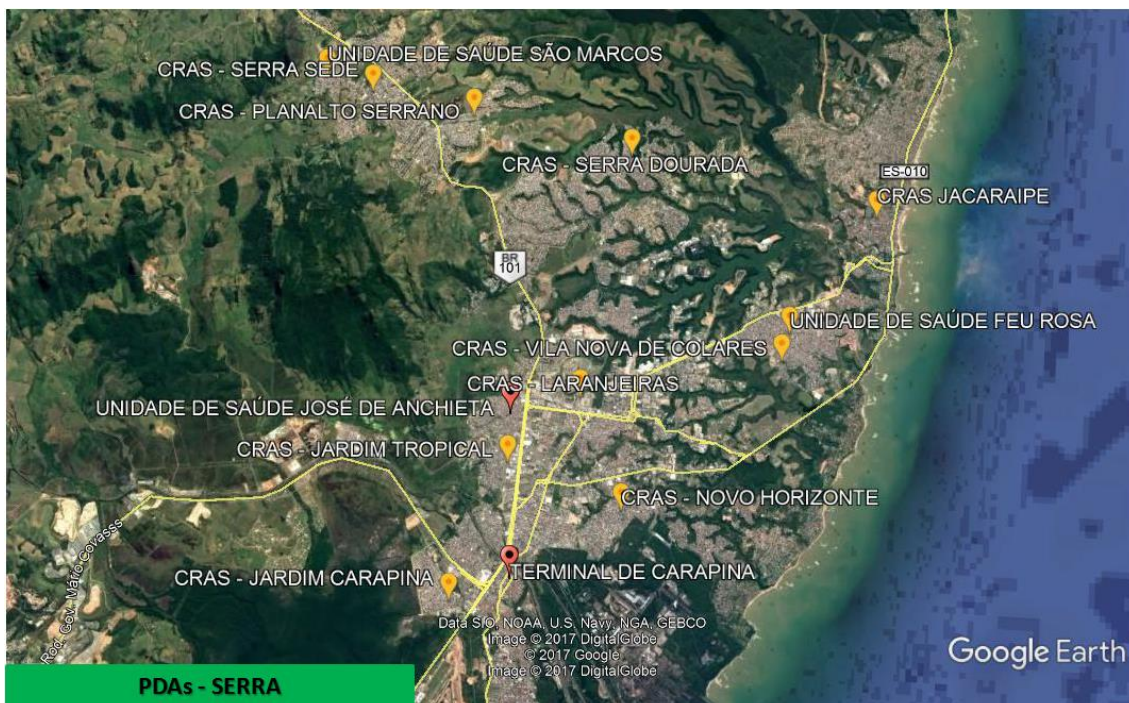


Figura 1 - PDAs Serra

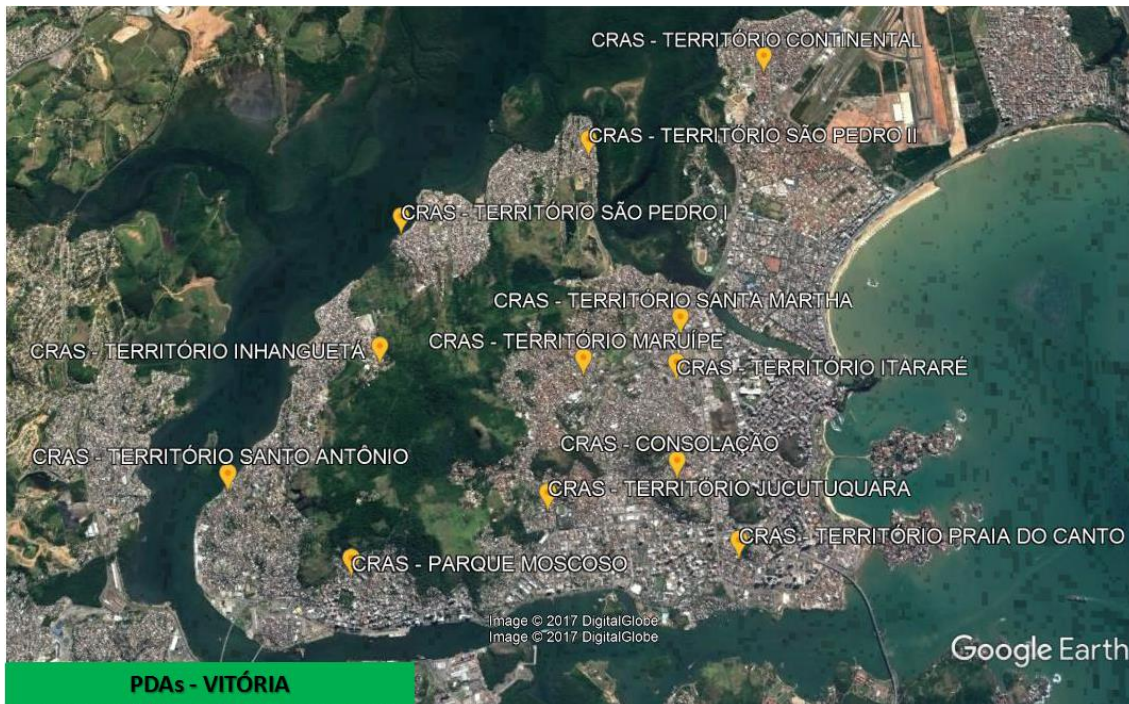


Figura 2 - PDAs Vitória



Figura 3 - PDAs Viana

4.2 Núcleo 02



Figura 4 - PDAs Vila Velha



Figura 5 - PDAs Guarapari

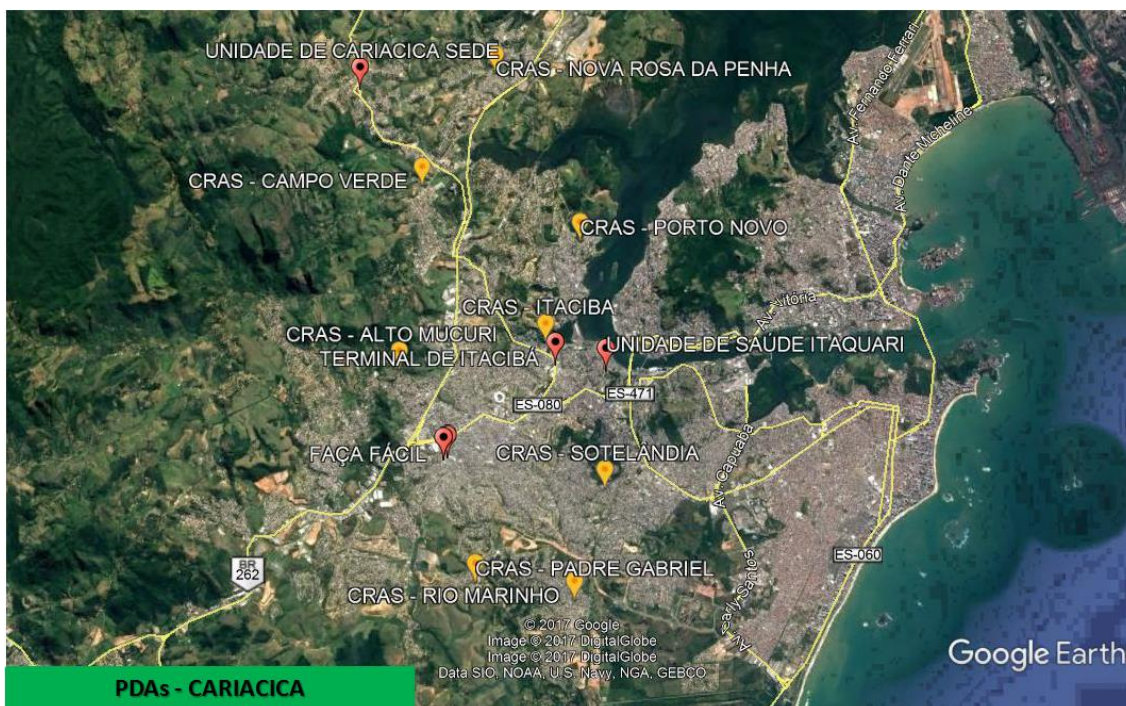


Figura 6 - PDAs Cariacica

5. PÚBLICO ALVO

O público alvo do Programa de Distribuição de Kits com antena e conversor foi previamente triado pelo Ministério do Desenvolvimento Social por meio do NIS (Número de Identificação Social) sendo um total aproximado de **164 mil beneficiários**, distribuídos conforme quadro abaixo:

Município	Beneficiários	% de Beneficiários
Serra	45.827	28%
Vila Velha	35.057	21%
Cariacica	34.436	21%
Vitoria	25.989	16%
Guarapari	12.053	7%
Viana	8.125	5%
Fundão	1.975	1%
TOTAL	163.462	100%

Ao longo do processo esta base foi ampliada para um total aproximado de **172 mil beneficiários** de programas sociais do Governo Federal. Os kits em questão foram distribuídos

de forma gratuita pela Seja Digital. O agendamento para retirada dos kits foi realizado pelos Mobilizadores Sociais contratados e supervisionados pelo Instituto Ideias, conforme estabelecido em contrato. Ressalta-se que não foi de responsabilidade do Instituto Ideias a gestão dos Pontos de Retirada (PDRs) dos kits com antena e conversor digital.

6. CRONOGRAMA

As ações do período, exceto as de campo, já descritas anteriormente, foram realizadas conforme cronogramas abaixo:

Eventos	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	
	03/07/2017	04/07/2017	05/07/2017	06/07/2017	07/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	13/07/2017	14/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	01/08/2017	02/08/2017	03/08/2017	04/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	
Reunião de alinhamento Coordenação/Supervisão	■							■																	■					
Definição de estratégias		■						■	■																					
Divulgação da vaga de Mobilizador Social nas Redes Sociais e outros			■																											
Triagem e seleção de Currículos - 1ª Etapa			■	■	■								■	■																
Visita aos locais de instalação dos PDAs					■	■																								
Agendamento da Dinâmica					■										■															
Dinâmica de grupo para 1ª e 2ª equipes (Serra, Guarapari, Vitória, Cariacica, Viana e Vila Velha)						■										■														
Entrevistas individuais com selecionados para 1ª equipe (Serra, Guarapari, Vitória e Cariacica)							■										■													
Seleção de aprovados								■										■												
Exames Admissionais/Contratação									■	■									■											
Instalação dos PDAs										■	■									■										■
Treinamento (MMurad)											■										■									
Início das atividades nos PDAs											■	■																		
Reposição de material em campo												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acompanhamento da supervisão em campo												■			■							■				■	■	■	■	■
Treinamento - Sombra (Equipes de Vila Velha nos PDAs de Vitória)																										■				

Cronograma 1 - 03/07/2017 a 10/08/2017

Eventos	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	
	11/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	28/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	01/09/2017	04/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	07/09/2017	08/09/2017	
Instalação dos PDAs de Serra	█																					
Treinamento "Sombra" - 3ª Equipe (Equipes de Viana e PDAs adicionais de Serra e Cariacica)	█																					
Reposição de material em campo	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Acompanhamento da supervisão	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Início das atividades nos novos PDAs		█																				
Reunião de alinhamento Coordenação/Supervisão			█																			
Reunião de alinhamento com Mobilizadora Marly			█																			
Reunião com Supervisoras e Seja Digital							█															
Reunião IDEIAS e Mobilizadores de Vila Velha e Serra								█														
Acompanhamento Filmagem PDAs Jacaraípe/Serra e Continental/Vitória													█									
Contratação Antenistas															█							
Reunião Seja Digital e Ideias																	█					
Seleção de Novos Agentes																		█				
Exames Admissionais/Contratação/Treinamento																			█			

Cronograma 2 - 11/08/2017 a 08/09/2017

Eventos	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	
	11/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	02/10/2017	03/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	09/10/2017	10/10/2017	
Seleção para substituição de Agentes		■	■															■	■				
Exames Admissionais/Contratação/Treinamento			■																■				
Treinamento "Sombra" - Novos Agentes				■															■				
Reposição de material em campo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acompanhamento da supervisão	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Retirada dos PDAs - Pontos Extintos	■	■																					
Reunião de alinhamento Coordenação/Supervisão																			■				
Contratação Antenistas				■	■									■	■				■	■			
Contratação de kit lanche					■										■					■			
Contratação de van										■					■				■				
Contratação de carro de som																■	■	■	■				
Reunião Seja Digital e Ideias																							■

Cronograma 3 - 11/09/2017 a 10/10/2017

Eventos	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Segunda	Terça	
	11/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	14/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	
Seleção para substituição de Agentes																	
Treinamento "Sombra" - Novos Agentes																	
Reposição de material em campo																	
Acompanhamento da supervisão																	
Reunião de alinhamento Coordenação/Supervisão																	
Contratação Antenistas																	
Contratação de kit lanche																	
Acompanhamento Filmagem - Mutirão de Agendamento e Mutirão de Antenistas - Carapina Grande/Serra																	
Contratação de carro de som																	
Reunião Seja Digital e Ideias																	
Acompanhamento Filmagem PDAs Itacibá/Cariacica e Areinha/Viana.																	


Cronograma 4 - 11/10/2017 a 31/10/2017

7. DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

O escopo previsto no presente projeto se resumiu em:

- ✓ Realizar a logística e instalação de 60 (sessenta) PDAs com infraestrutura necessária de tablet e acesso a internet móvel;
- ✓ Alocar 01 (um) mobilizador social por PDA, preferencialmente mão-de-obra local, realizando a sua capacitação prévia aos atendimentos;
- ✓ Realizar 06 (seis) mutirões com 30 (trinta) antenistas/instaladores cada;
- ✓ Realizar 06 (seis) ações de sensibilização e divulgação dos agendamentos junto ao público-alvo, sendo que estas ações ocorrerão junto com os mutirões de antenistas;
- ✓ Realizar 06 (seis) reuniões de apresentação para a Direção e equipe dos CRAS/equipamentos onde foram implantados os PDAs;⁷
- ✓ Realizar reuniões de acompanhamento junto ao contratante;
- ✓ Apresentar relatórios semanais de acompanhamento ao contratante;⁸
- ✓ Apresentar 01 (um) Relatório por mês ao contratante;
- ✓ Realizar a Supervisão dos PDAs implantados;
- ✓ Emitir 01 (um) relatório final contemplando todas as ações realizadas no projeto.

8. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – EAP

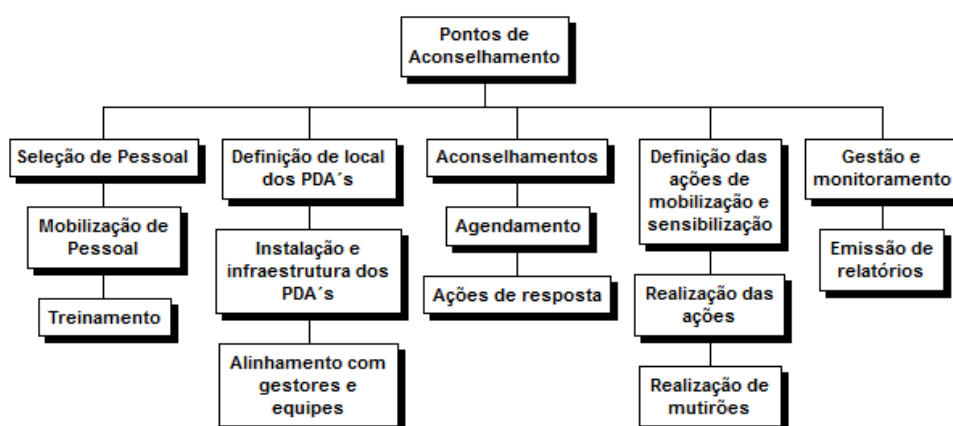

⁷ Estas reuniões foram realizadas pela Seja Digital, com o suporte do Instituto Ideias, incluindo fornecimento de Coffee Breaks, quando solicitado.

⁸ Os Relatórios Semanais de Atendimentos foram gerados pelo sistema Seja Digital e repassados para o Instituto Ideias para acompanhamento da produtividade dos Mobilizadores Sociais.

9. DICIONÁRIO DA EAP

9.1 SELEÇÃO DE PESSOAL

9.1.1 Mobilização de Pessoal

A mobilização de pessoal ocorreu através de divulgação da oportunidade de trabalho em diversos meios como: mídias sociais (facebook e whatsapp), cartazes afixados em pontos estratégicos nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, banco de currículos interno e indicações de outros profissionais.

A seleção ocorreu através de processo seletivo estruturado pela equipe interna de recursos humanos e supervisoras do projeto. O processo buscou observar o perfil técnico e comportamental dos candidatos. Os candidatos selecionados foram aqueles que atenderam perfeitamente aos critérios técnicos e comportamentais da vaga específica.

O processo seletivo da primeira equipe foi realizado em três etapas:

- ✓ 1ª etapa – Triagem de currículos por município;
- ✓ 2ª etapa – Dinâmica de grupo;
- ✓ 3ª etapa – Entrevista individual.

Após a seleção final, os candidatos aprovados foram encaminhados ao departamento pessoal, onde foram devidamente registrados como funcionários e tendo todos os direitos e benefícios assegurados conforme legislação atual, sendo a carga horária de 44 horas semanais, podendo trabalhar aos sábados com flexibilidade de horários.

Dentre os atributos necessários ao cargo foram exigidos:



No momento da admissão, os Mobilizadores Sociais receberam 01 Guia do Mobilizador, 03 (três) camisas de uniforme e 01 (um) crachá confeccionado com a arte do Programa disponibilizada pela Seja Digital, conforme imagem a seguir.



Figura 7 - Camisa de Uniforme Mobilizador Social



Figura 8 - Crachá Mobilizador Social

Tendo em vista que alguns mobilizadores sociais, por motivo de ordem pessoal, deixaram de fazer parte do projeto antes do seu encerramento, houve necessidade de contratação de 11 (onze) novos agentes.

Para seleção dos novos mobilizadores foram realizadas novas triagens de currículos e entrevistas individuais/exames admissionais nos dias 04/09, 05/09, 12/09, 13/09, 03/10 e 04/10. O detalhamento segue no quadro abaixo:

Nome do Mobilizador	Cidade de atuação	Unidade de atendimento	Observação
Luciano Silva Manske	Vitória	CRAS Parque Moscoso	Admissão em 06/09/2017
Patrícia Silva	Serra	Ações de campo	Admissão em 06/09/2017
Richarde Lages Costa	Viana	CRAS Parque Alvorada	Admissão em 06/09/2017
Sandro da Silva Marinho	Serra	Unidade de Saúde Feu Rosa	Admissão em 06/09/2017
Chardson Rodrigues da Silva	Vila Velha	Unidade de Saúde Araças	Admissão em 13/09/2017
Leandro Gonçalves Daltino	Serra	CRAS Novo Horizonte	Admissão em 04/10/2017
Renata de Souza Oliveira	Cariacica	CRAS Alto Mucuri	Contratação em 17/10/2017
Mylena da Silva Thiengo	Cariacica	Ações de campo	Contratação em 17/10/2017
Geane Miranda Pereira	Cariacica	CRAS Sotelândia	Contratação em 17/10/2017
Elvis Muller Campos Segades	Vitória	CRAS Jucutuquara	Contratação em 17/10/2017
Marie Elizabeth Barbosa dos Reis Silva	Guarapari	Central do Cadúnico (Rua da Marinha)	Contratação em 19/10/2017

9.1.2 Treinamento

O treinamento da primeira equipe composta pelos Mobilizadores Sociais de Vitória, Serra e Cariacica foi realizado no dia 14 de julho de 2017, no auditório 06 da instituição FGV/MMurad no município de Vitória/ES, sendo que no período matutino foram passadas todas as orientações relativas ao Programa de Distribuição de Kits, inclusive com simulação de agendamentos após recebimento de login e senha, contando com a participação de um representante da Seja Digital/SP, Sr. Antônio Biondi e as representantes da Seja Digital/ES Sra. Maísa Porto Nacari, Gerente Regional e Sra. Amanda Queiroz Nascimento, Consultora de Mobilização Social.

No período vespertino os mobilizadores receberam informações institucionais acerca das práticas comportamentais para atuação em campo. Para o evento foram disponibilizados 02 (dois) coffee breaks sendo um no período da manhã e um no período da tarde. O principal

objetivo deste treinamento, cuja carga horária foi de 08 (oito) horas, era nivelar as informações e capacitar as equipes para as atuações junto às comunidades.



Figura 9 - Treinamento 1ª Equipe

Temas	Profissionais Envolvidos	Carga Horária	Data
O Programa	Coordenador de Operações, Supervisores de Área, Mobilizadores Sociais, Apoios e Auxiliar Administrativo	04 horas	14/07 e 27/07
Sistema de Agendamento			
Institucional	Mobilizadores Sociais	04 horas	
Boas Práticas em Campo			

Para a segunda equipe, composta pelos Mobilizadores Sociais de Vila Velha, Viana e PDAs adicionais de Serra e Cariacica o treinamento foi realizado no dia 27 de julho de 2017, no mesmo formato que o da primeira equipe, porém, os mobilizadores de Vila Velha tiveram um treinamento adicional, atuando em campo no município de Vitória e Cariacica, como “sombra” no dia 28 de julho de 2017. A inovação do treinamento como sombra gerou uma maior curva de aprendizado para os novos membros da equipe, sendo considerado extremamente produtivo.



Figura 10 - Treinamento 2ª Equipe



Figura 11 – Treinamento “Sombra” – 1ª e 2ª Equipes

Os mobilizadores de Viana e PDAs adicionais de Serra e Cariacica atuaram em campo como “sombra” no dia 11 de agosto de 2017, para posterior início das atividades de campo.



Figura 12 - Treinamento "Sombra" - 3ª Equipe

Os agentes contratados em 05 de setembro foram capacitados pelas supervisoras no período matutino e realizaram o treinamento “sombra” em campo no dia 06 de setembro.

Nome do Mobilizador	Observação
Luciano Silva Manske	Sombra no PDA CRAS Serra Dourada/Serra
Patrícia Silva	Sombra no PDA CRAS Laranjeiras/Serra
Richarde Lages Costa	Sombra no PDA CRAS Praia do Canto/Vitória
Sandro da Silva Marinho	Sombra no PDA CRAS Praia do Canto/Vitória

Os agentes contratados em 13/09 e 04/10 foram capacitados pelas supervisoras no período matutino e realizaram o treinamento “sombra” em campo nos dias 14/09 e 04/10 (vespertino), respectivamente.

Nome do Mobilizador	Observação
Chardson Rodrigues da Silva	Sombra no PDA CRAS Região 1 - Centro/Vila Velha
Leandro Gonçalves Daltino	Sombra no PDA CRAS Praia do Canto/Vitória



Figura 13 - Treinamento "Sombra" – Novos Mobilizadores Sociais

Os agentes contratados em 17/10 e 19/10 foram capacitados pelas supervisoras no período matutino e realizaram o treinamento “sombra” em campo nos mesmos dias no período vespertino, respectivamente.

Nome do Mobilizador	Observação
Renata de Souza Oliveira	Sombra no PDA CRAS Praia do Canto/Vitória
Mylena da Silva Thiengo	Sombra no PDA CRAS Praia do Canto/Vitória
Geane Miranda Pereira	Sombra no PDA CRAS Rio Marinho/Cariacica
Elvis Muller Campos Segades	Sombra no PDA CRAS Vila Nova de Colares/Serra
Marie Elizabeth Barbosa dos Reis Silva	Sombra no PDA Central Cadúnico/Guarapari



Figura 14 - Treinamento "Sombra" – Novos Mobilizadores Sociais



Figura 15 - Treinamento "Sombra" – Novos Mobilizadores Sociais

9.2 DEFINIÇÃO DE LOCAL DOS PDAs

9.2.1 Instalação e Infraestrutura dos PDAs

Nos dias 07 e 10 de julho de 2017, foram realizadas visitas técnicas para reconhecimento e identificação do ponto de maior visibilidade dentro dos CRAS indicados pela Seja Digital, na

sequência foram elaborados relatórios para encaminhamento à empresa Sato Eventos, responsável pela confecção e instalação dos estandes.

Os estandes foram instalados nos dias 13 e 14 de julho e 10 de agosto de 2017, com o acompanhamento do profissional de apoio de campo da equipe.

Cada PDA, contou com um Mobilizador Social para realizar os aconselhamentos e agendamentos para retirada dos kits gratuitos com antena e conversor, e tinha infraestrutura de balcão em MDF e alumínio envelopado com a arte do Programa fornecida pela Seja Digital, cadeira para o mobilizador e tablet com acesso a internet Vivo 4G, conforme figuras e especificações abaixo.



Figura 14 - Balcão em MDF e alumínio envelopado com a arte do Programa



Figura 15 - Galaxy Tab E 7.0" Wi-Fi

Especificações Técnicas:

- ✓ Tamanho (Tela Principal): 7.0" (178,0 mm)
- ✓ Resolução da Câmera Principal: 2.0 MP
- ✓ Peso: 310 g
- ✓ Capacidade Padrão da Bateria: 3600 mAh
- ✓ Tempo de Reprodução de Áudio: até 71 horas

- ✓ Velocidade do Processador: 1.3 GHz

Objetivando suporte constante aos mobilizadores, os apoios administrativos realizam em campo o trabalho diário de distribuição do material disponibilizado pela Seja Digital, conforme fotos abaixo:



Figura 16 - Folder, cardápio e cartaz disponibilizados pela Seja Digital

Em virtude da redução do número de agendamentos nos PDAs, uma nova estratégia foi traçada pela Seja Digital, e houve a extinção de 08 (oito) pontos a partir do dia 11 de setembro com remanejamento de agentes para ações de campo. Os PDAs foram removidos nos dias 11/09 e 12/09 e estão indicados abaixo:

1. PDA Unidade de Saúde Itaquari – Cariacica/ES;
2. PDA Unidade de Saúde Cariacica Sede – Cariacica/ES;
3. PDA Terminal Itacibá – Cariacica/ES;
4. PDA Unidade de Saúde Barra do Jucu – Vila Velha/ES;
5. PDA Terminal São Torquato – Vila Velha/ES;
6. PDA Terminal Itaparica– Vila Velha/ES;
7. PDA Unidade de Saúde José de Anchieta – Serra/ES;
8. PDA Terminal Carapina – Serra/ES.

9.2.2 Alinhamento com Gestores e Equipes

Foram realizadas reuniões de alinhamento com os gestores e equipes das unidades (CRAS/Equipamentos Públicos) para que os mesmos compreendam as ações que realizadas,

bem como possam auxiliar no direcionamento da população para o aconselhamento e agendamento.

Compete ao Instituto Ideias a disponibilização de transporte e o fornecimento de lanches para estes encontros.

9.3 ACONSELHAMENTOS

Os aconselhamentos serão realizados nos PDAs ou durante as ações de sensibilização/mobilização e o seu principal objetivo é atender a população das classes C2, D e E dos municípios da RMGV e informar sobre o benefício de recebimento do Kit para o acesso ao sistema digital. Serão ainda distribuídos pela equipe os materiais que a contratante definir.

9.3.1 Agendamento

O agendamento para retirada dos kits gratuitos com antena e conversor é realizado nos PDAs pelos Mobilizadores Sociais após consulta ao banco de dados disponibilizado pela Seja Digital por meio do site <http://eadtvdigital.irestante.com.br/mobilizador/login>.

A consulta é realizada pelo NIS – Número de Identificação Social do munícipe, número recebido quando se ingressa em algum Programa Social. Caso o munícipe não seja localizado pelo NIS procede-se a consulta pelo número do CPF – Cadastro de Pessoa Física.

Se o munícipe for identificado no sistema significa que ele já foi previamente triado e seu agendamento poderá ser realizado. Compete ao mobilizador social, além do agendamento, reforçar a necessidade de instalação do equipamento e a data prevista para o desligamento do sinal analógico.

9.3.2 Ações de Resposta

Se o agendamento pôde ser realizado o mobilizador reforça as informações referentes ao código de agendamento, data, horário e local de retirada do kit com antena e conversor.

Caso o munícipe não seja localizado no sistema o mobilizador poderá cadastrá-lo como interessado, inserindo os dados do mesmo em formulário digital específico, bem como a foto do Cartão Bolsa Família, ou outros documentos previamente autorizados pela Seja Digital.

9.4 DEFINIÇÃO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

A equipe de coordenação e supervisão de área definiu junto à equipe da contratante as ações de mobilização e sensibilização que foram desenvolvidas ao longo do projeto. As ações objetivaram atingir o maior número de beneficiários possíveis ou em locais definidos como estratégicos.

9.4.1 Realização das Ações

Durante a execução do projeto foram realizadas 62 (sessenta e duas) ações de divulgação, sensibilização e agendamento nos municípios de Serra, Vitória, Fundão, Cariacica, Vila Velha e Guarapari conforme descrito no quadro abaixo e demonstrado em fotos diversas:

MÊS	NÚMERO AÇÕES REALIZADAS	AÇÃO	DATA	HORÁRIO	LOCAL	MOBILIZADOR SOCIAL
Agosto	01	Ação Cultural	05/08	07h30 as 12h00	EMEF De Tempo Integral Profª Eulália Falchetto Gusmann, Vila Nova de Colares (Serra/ES)	Hugo Ferreira Contas
	01	Mutirão de Cadastramento BPC e Atualização		08h00 as 12h00	CRAS Serra Dourada (Serra/ES)	Estevão Meneghel de Andrade
	01	Mini Ação Global, envolvendo atividades do CRAS, Unidade de Saúde e Associação de Moradores		08h00 as 16h00	Centro de Vivência Anna Marozzi Sutil - Maria Niobe, (Serra/ES)	Jéssika Pauli Avila Mesquita
	01	Cadastro BPC e Mutirão de Atualização CadÚnico	12/08	08h00 as 13h00	Pracinha de Bela Aurora (Cariacica/ES)	Michelle Amorim Lyra dos Santos da Silva
	01	Ação de Agendamento		08h00 as 13h00	Casa de Cultura (Centro Fundão/ES)	Matheus Conrado Caversan Marly Rodrigues Gabriel
	01	Mutirão de Agendamento	16/08	08h00 as 13h00	Campo Grande (Cariacica/ES)	Marly Rodrigues Gabriel Rafaela Loyola Barboza
	01	Ação de Agendamento	19/08	08h00 as 13h00	Galpão da Terceira Idade (Timbuí Fundão/ES)	Rone Silva Santana Paula Cristina Simões Pimentel
	01	Mutirão de Cadastramento CadÚnico		08h00 as 12h00	CRAS Maruípe (Vitória/ES)	Gabriella Coutinho Vieira

	01	Ações de Final de Semana		09h00 as 14h00	Central Carapina (Serra/ES)	Marly Rodrigues Gabriel Claudio Tafarel da Silva Santos
	01	Ações de Final de Semana		15h00 as 18h00	Terra Vermelha (Vila Velha/ES)	Marly Rodrigues Gabriel Claudio Tafarel da Silva Santos
	01	Ações de Final de Semana		08h00 as 12h00	1° de Maio (Vila Velha/ES)	Giselly Queiroz Medeiros
	01	Ações de Final de Semana		14h00 as 18h00	Santa Rita (Vila Velha/ES)	Giselly Queiroz Medeiros
	01	Brincar nos Bairros	20/08	08h00 as 13h00	Inhanguetá (Vitória/ES)	Marly Rodrigues Gabriel AnaMaria Rosalia da Cruz
	01	Ação de Agendamento	21/08	08h00 as 17h00	Extracenter (Guarapari/ES)	Chistian Loyola Garcia
	01	Ação de Agendamento	22/08	08h00 as 17h00	Extracenter (Guarapari/ES)	Roney dos Santos Ferreira de Andrade
	01	Ação de Agendamento	23/08	08h00 as 17h00	Extracenter (Guarapari/ES)	Fernanda Alves Machado
	01	Mobilização (Panfletagem e Agendamento)		07h30 as 12h00	Feira de São Torquato (Vila Velha/ES)	Débora Piske de Souza
	01	Varredura Agendamento	24/08	09h00 as 17h00	João Goulart (Vila Velha/ES)	13 Mobilizadores de Vila Velha
	01	Varredura Agendamento		09h00 as 17h00	Vila Nova de Colares (Serra/ES)	13 Mobilizadores de Serra
	01	Varredura Agendamento	25/08	09h00 as 17h00	Morada da Barra (Vila Velha/ES)	13 Mobilizadores de Vila Velha
	01	Mutirão de Agendamento		13h00 as 15h30	Centro de Convivência de Idosos - Serra Sede (Serra/ES)	Cintia de Souza da Silva Alexandre Dantas
	01	Mutirão de Agendamento		09h00 as 17h00	Igreja Betel de São Torquato (Vila Velha/ES)	Débora Piske de Souza
	01	Ação de Agendamento	26/08	08h00 às 13h00	CRAS Praia Grande (Fundão/ES)	Luzimara Monteiro Ana Paula Drumond
	01	Mutirão de Agendamento		09h00 as 14h00	Feu Rosa (Serra/ES)	Débora Piske de Souza Marly Rodrigues Gabriel 09 Mobilizadores de Serra


	01	Brincar nos Bairros	27/08	08h00 as 13h00	Bairro Engenharia (Vitória/ES)	Débora Piske de Souza
	01	Varredura Agendamento	28/08	09h00 as 17h00	João Goulart (Vila Velha/ES)	13 Mobilizadores de Vila Velha
	01	Mutirão de Agendamento		16h00 as 20h00	Condomínio Popular Itanguá (Cariacica/ES).	Mídian de Oliveira Silva Bianca Carvalho Vertuani
	01	Agendamento	31/08	09h00 as 16h00	Belvedere (Serra/ES)	Débora Piske de Souza Marly Rodrigues Gabriel
	01	Mutirão de Atualização Cadastral		07h00 as 17h00	CRAS Morada da Barra - Vila Velha (Vila Velha/ES)	Ana Paula Drumond Ana Paula Santos Sansão Hemilly Cristina Batista Geraldino Mariana Martinelli Laino Yan Carlos Coelho Claudio Tafarel da Silva Santos
Setembro	01	Bolsa Família Conviva - Serra	01/09	09h00 as 13h00	Praça Feu Rosa (Serra/ES)	Jéssika Pauli Avila Mesquita Estevão Meneghel de Andrade José Hilton dos Santos Jorge Felipe Silva de Castro
	01	Mutirão de Agendamento - Vila Velha	02/09	08h00 as 15h00	Terra Vermelha (Vila Velha/ES)	Claudio Tafarel da Silva Santos Yan Carlos Coelho
	01	Patrulha Digital - Vila Velha		07h30 as 14h30	Terra Vermelha (Vila Velha/ES)	Claudio Tafarel da Silva Santos Yan Carlos Coelho
	01	Mutirão de Agendamento Flexal II - Cariacica	03/09	08h00 as 15h00	Flexal II (Cariacica/ES)	Bianca Carvalho Vertuani Jorge Felipe Silva de Castro Rafaela Loyola Barboza Saskia Santiago Ribeiro
	01	Mutirão de Agendamento - Solar de Anchieta/Serra	09/09	08h00 as 14h00	Solar de Anchieta (Serra/ES)	Willian Carneiro de Amorim Rone Silva Santana
	01	Mutirão de Agendamento - Ulisses Guimarães/Vila Velha		08h00 as 14h00	Ulisses Guimarães (Vila Velha/ES)	Hemilly Cristina Batista Geraldino Simon Felipe Suzart Chacon
	01	Mutirão de Agendamento	12/09	09h00 as 16h00	Unidade de Saúde Planalto Serrano, Bloco B (Serra/ES)	Débora Piske de Souza Marly Rodrigues Gabriel
	01	Mutirão de Agendamento		09h00 as 16h00	Assembleia de Deus, em frente a Creche. Planalto Serrano,	Patrícia Silva Willian Carneiro de Amorim

					Bloco C (Serra/ES)	
01	Ação de Agendamento	13/09	09h00 as 16h00	Planalto Serrano, Bloco B (Serra/ES)	Marly Rodrigues Gabriel	
01	Ação de Agendamento	14/09	09h00 as 16h00	Bairro Lagoa, Jacaraípe (Serra/ES)	Patrícia Silva Willian Carneiro de Amorim	
01	Mutirão atualização CadÚnico	15/09	08h00 as 17h00	Bairro Alvorada (Vila Velha/ES)	Giselly Queiroz Medeiros	
01	Ação de Agendamento		09h00 as 16h00	Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe (Serra/ES)	Marly Rodrigues Gabriel	
01	Mutirão de Cadastramento CadÚnico	16/09	08h00 as 14h00	CRAS Rio Marinho (Cariacica/ES)	Mídian de Oliveira Silva Flávio Mendes da Vitória	
01	Mutirão de Agendamento - Ação Cidadã		08h30 as 16h30	Kart Indoor, Praia do Morro (Guarapari/ES)	Chistian Loyola Garcia Roney dos Santos Ferreira de Andrade	
01	Ação de Agendamento - Feira Livre		07h00 as 13h00	Feira Livre do Centro (Guarapari/ES)	Fernanda Alves Machado Tamires Ramos Mendonça	
01	Campanha Vacinação - Ação de agendamento		08h00 as 13h00	Unidade de Saúde São Marcos (Serra/ES)	Thielly Feliciano da Silva	
01	Mutirão de Agendamento	20/09	09h00 as 16h00	Comunidade Católica de São Pedro (R. São Pedro, 6 – Perocão) (Guarapari/ES)	Tamires Ramos Mendonça Roney dos Santos Ferreira de Andrade	
01	Mutirão de Agendamento	21/09	09h00 as 16h00	Comunidade Católica de São Pedro (R. São Pedro, 6 – Perocão) (Guarapari/ES)	Tamires Ramos Mendonça Roney dos Santos Ferreira de Andrade	
01	Ação de Agendamento - com Mini Trio com o boneco da Seja, rodando ruas - Seja Digital	23/09	10h00 as 16h00	Entre Barramares e João Goulart (Vila Velha/ES)	Simon Felipe Suzart Chacon Hemilly Cristina Batista Geraldino	
01	Cadastro BPC e Mutirão de Atualização no CRAS		08h00 as 14h00	Creche Sara Vitalin, Barramares (Vila Velha/ES)	Giselly Queiroz Medeiros	
01	Mutirão de Agendamento - Gincana Esportiva dos Idosos		08h00 as 12h00	Ginásio Reame, Cruzeiro do Sul (Cariacica/ES)	Luzimara Monteiro Cintia de Souza da Silva	
01	Mutirão de Agendamento		08h00 as 14h00	Estação Conhecimento, Cidade Continental (Serra/ES)	Marly Rodrigues Gabriel Hugo Ferreira Contas	

	01	Mutirão de Agendamento - Blitz Rádio Litoral		08h00 as 14h00	Pracinha da Polícia Interativa, Maria Ortiz (Vitória/ES)	Matheus Conrado Caversan Alice dos Santos Souza Carlos Eduardo Pompeu Barbosa
	01	Ação de Agendamento - Bolsa Família Convida	29/09	08h00 as 15h00	CRAS Jardim Carapina (Serra/ES)	Patrícia Silva Willian Carneiro de Amorim Débora Piske de Souza Cleber Vieira Lima Rone Silva Santana Anamaria Rosalia da Cruz
Outubro	01	Mutirão de Atualização do CadÚnico	06/10	08h00 as 16h00	CRAS Paul (Vila Velha/ES)	Ivana Reis Nascimento Giselly Queiroz Medeiros
	01	Ação de Agendamento	07/10	08h00 as 14h00	Praça do bairro Adalberto Simão Nader (Guarapari/ES)	Fernanda Alves Machado
	01	Mutirão de Atualização do CadÚnico		08h00 as 14h00	Mutirão de atualização do CadÚnico - Escola Adalgiza Fernandez – Meaípe (Guarapari/ES)	Tamires Ramos Mendonça
	01	Mutirão de Atualização do CadÚnico		08h00 as 12h00	CRAS Laranjeiras	Emanuelle Silva Pinheiro Miranda
	01	Mutirão de Agendamento	14/10	09h00 as 15h00	Quadra do bairro Romão (Vitória/ES)	Paula Cristina Simões Pimentel
	01	Ação de Agendamento	18/10	14h00 as 19h00	Feira Livre do bairro Rio Marinho (Cariacica/ES)	Flávio Mendes da Vitória
	01	Ação de Agendamento	21/10	09h00 as 16h00	Praça dos Pescadores, Nova Almeida (Serra/ES)	Daianny
	01	Ação de Agendamento		08h00 as 12h00	Centro Comunitário de Guarapari (Igreja Católica) (Guarapari/ES)	Hugo Ferreira Contas Elvis
	01	Ação de Agendamento	28/10	14h00 as 18h00	Bairro Resistência (Vitória/ES)	Hugo Ferreira Contas
TOTAL				62		



Ação Cultural - Vila Nova de Colares/Serra

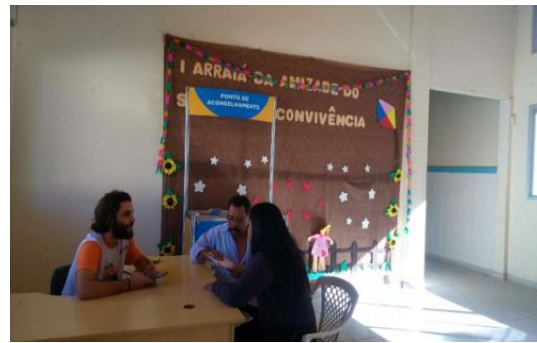

Mutirão de Atualização CadÚnico - Serra Dourada/Serra



Mini Ação Global – Maria Niobe/Serra



Mutirão de Atualização CadÚnico – Bela Aurora/Cariacica



Mutirão de Agendamento – Campo Grande/Cariacica



Ação de Agendamento – Extracenter/Guarapari



Ação de Agendamento – Extracenter/Guarapari



Bolsa Família Convida – Feu Rosa/Serra



Mutirão de Agendamento – Centro/Fundão



Mutirão de Agendamento – Centro/Fundão



Mutirão de Agendamento – Timbúí/Fundão



Mutirão de Agendamento – Timbúí/Fundão



Mutirão de Agendamento – Praia Grande/Fundão



Mutirão de Agendamento – Praia Grande/Fundão



Mutirão de Agendamento – Terra Vermelha/Vila Velha



Mutirão de Agendamento – Morada da Barra/Vila Velha



Varredura de Agendamento – João Goulart/Vila Velha



Varredura de Agendamento – João Goulart/Vila Velha



Ação de Agendamento – Extracenter/Guarapari



Ação de Agendamento – Extracenter/Guarapari



Ação de Agendamento – CRAS Rio Marinho/Cariacica



Mutirão de Agendamento – Cruzeiro do Sul/Cariacica



Mutirão de Agendamento – Perocão/Guarapari



Ação de Agendamento – CRAS Jardim Carapina/Serra



Mutirão de Agendamento – Estação Conhecimento/Serra



Mutirão atualização CadÚnico – Alvorada/Vila Velha



Cadastro BPC e Mutirão de Atualização no CRAS – Barramares/Vila Velha



Mutirão de Atualização do CadÚnico – Paul/Vila Velha



Mutirão de Agendamento – Romão/Vitória



Mutirão de Agendamento – Romão/Vitória

Figura 17 - Fotos Diversas Mutirões e Ações de Agendamento

9.4.2 Realização de Mutirões de Antenistas

Nos dias 02/09, 09/09, 16/09, 30/09, 07/10 e 14/10 foram realizados mutirões de agendamento e instalação dos Kits de conversor e antena digital, respectivamente nos bairros Central Carapina/Serra, Planalto Serrano/Serra, Santa Rita/Vila Velha, Santa Mônica/Guarapari, Carapina Grande/Serra, conforme descrito no quadro abaixo e demonstrado em fotos:

MÊS	NÚMERO MUTIRÕES REALIZADOS	AÇÃO	DATA	HORÁRIO	LOCAL	MOBILIZADOR SOCIAL
Setembro	01	Mutirão de Agendamento e Instalação dos Kits de conversor e antena digital	02/09	08h00 as 14h00	Praça de Central Carapina (Serra/ES)	Débora Piske de Souza Willian Carneiro de Amorim
	01	Mutirão de Agendamento e Instalação dos Kits de conversor e antena digital	09/09	08h00 as 14h00	Praça do Trabalhador em frente ao Centro de Convivência - Planalto Serrano, Bloco A (Serra/ES)	Débora Piske de Souza Marly Rodrigues Gabriel
	01	Mutirão de Agendamento e Instalação dos Kits de conversor e antena digital	16/09	08h00 as 14h00	Centro Comunitário de Santa Rita (Vila Velha/ES)	Ana Paula Drumond Mariana Martinelli Laino Chardson Rodrigues da Silva
	01	Mutirão de Agendamento e Instalação dos Kits de conversor e antena digital	30/09	08h00 as 14h00	Praça Central - Santa Mônica (Guarapari/ES)	Tamires Ramos Mendonça Chistian Loyola Garcia Roney dos Santos Ferreira de Andrade
Outubro	01	Mutirão de Agendamento e Instalação dos Kits de conversor e antena digital	07/10	08h00 as 14h00	Creche Sara Vitalino, Avenida Boa Vista – Barramares (Vila Velha/ES)	Ana Paula Drumond Mariana Martinelli Laino
	01	Mutirão de Agendamento e Instalação dos Kits de conversor e antena digital	14/10	08h00 as 14h00	Praça do bairro Carapina Grande (Serra/ES)	Débora Piske de Souza Marly Rodrigues Gabriel Patrícia Silva
TOTAL					06	



Figura 18 - Mutirão - Central Carapina/Serra



Figura 19 - Mutirão Planalto Serrano/Serra



Figura 20 - Mutirão Santa Rita/Vila Velha



Figura 21 - Mutirão Santa Mônica – Guarapari



Figura 22 - Mutirão Barramares/Vila Velha

MUTIRÃO	DATA	HORÁRIO	ANTENISTA	NÚMERO DE INSTALAÇÕES REALIZADAS
Praça de Central Carapina (Serra/ES)	02/set	08h00 as 14h00	Alexandre Azevedo	9
			Alexandre Marcolino Lirio	10
			Almir Pereira Lima	4
			Carlos Humberto Rodrigues Araújo	15
			Christiano Oliveira dos Santos	1
			Edir Iuri de Abreu	3
			Evandro Pagung	3
			Jair Sperandio Neto	3
			José Barbosa	1
			José Pedro de Aguiar Messmer	10
			Marcos de Oliveira	15
			Paulo Victor Ramos Quevedez	10
			Rafael do Nascimento Antonio	3
			Rafael Magalhães Melo	2
			Raphael Faiolli	9
Reylan Rodrigues da Silva	6			
Selvo Lincon da Rocha Leal	4			

			Sidney Pales de Souza	2
			Thiago Vicente da Cunha	6
			Valdir Lourenço Nunes Junior	10
			Vinicius Vitorino nascimento	6
			Willian de Oliveira Souza	4
Subtotal				136
Praça do Trabalhador em frente ao Centro de Convivência - Planalto Serrano, Bloco A (Serra/ES)	09/set	08h00 as 14h00	Almir Pereira Lima	6
			Daniele Rodrigues da Silva	3
			Edir Iuri de Abreu	3
			Evandro Pagung	6
			Gabriel Chagas Leitão	8
			Jucilene Santos Oliveira	4
			Lana Caroline Andrade do Nascimento Chaves	6
			Rafael Magalhães Melo	4
			Reylan Rodrigues da Silva	12
			Ricardo Ferreira Dias	4
			Romero Pereira Queiroz	4
			Selvo Lincon da Rocha Leal	4
			Vanderson Aparecido Alves	3
			Willian de Oliveira Souza	3
Subtotal				70
Centro Comunitário de Santa Rita (Vila Velha/ES)	16/set	08h00 as 14h00	Alex Júnior Adriano Barcelos	7
			Antônio Carlos Araújo	4
			Bruno Ernesto Suzart Chacon	2
			Daniel Muniz Monteiro	5
			Danilo Quirino	5
			Evandro Pagung	4
			Francisco Vieira dos Santos	3
			Ivanilda Nascimento Santos	6
			Jean Henrique Freitas Monteiro	5
			Jhonatan Francisco Samora	6
			Michelli Pereira do Nascimento	0
			Paulo Vitor Silva Cavalcante	4
			Reylan Rodrigues da Silva	12
			Selvo Lincon da Rocha Leal	3
			Tailane Oliveira Rodrigues	5
Mauro Roberto Martins de Albuquerque	4			
Subtotal				75
Praça Central (Santa Mônica/Guarapari)	30/set	08h00 as 14h00	Leonardo Fambre da Silva	4
			Paulo Sergio Ribeiro Rosa	5
			Raphael da Silva Sá	1
			Alan Ramos de Jesus	10
			Willian de Oliveira Souza	2

			Daniel Muniz Monteiro	3
			Reberth Viana Martins	11
			Paulo Vitor Silva Cavalcante	4
			Selvo Lincon da Rocha Leal	1
			Evandro Pagung	4
			Jhonatan Francisco Samora	4
			Alexander Azevedo	12
Subtotal				61
Creche Sara Vitalino, Avenida Boa Vista – Barramares (Vila Velha/ES)			Carlos Renan Alexandre Matos Junior	5
			Jean Henrique Freitas Monteiro	14
			Paulo Vitor Silva Cavalcante	13
			Jefferson Souza Carlos	7
			Romero Pereira Queiroz	8
			Rafael Magalhães	2
			Selvo Lincon da Rocha Leal	6
			Evandro Pagung	3
			Jhonatan Francisco Samora	6
			Alexander Azevedo	12
			Willian de Oliveira Souza	3
			Daniel Muniz Monteiro	7
			Vinicius Vitorino Nascimento	14
			Sidney Pales de Souza	10
Subtotal				110
Praça do bairro Carapina Grande (Serra/ES)	14/out	08h00 as 14h00	Alexander Azevedo	12
			Carlos Alberto de Souza	3
			Carlos da Silva Cabral	3
			Carlos dos Reis Souza	1
			Cleudiceia Fonseca de Souza	6
			Evandro Pagung	4
			Jefferson Souza Carlos	6
			Jhonatan Francisco Samora	1
			Patrick Laioli Vasconcelos Correa	2
			Rafael Magalhães	1
			Vinicius Vitorino Nascimento	9
			Wanderson Cleiton Rodrigues	2
Subtotal				50
Total				502

9.4.3 Ação Porta a Porta (Antenistas e Veiculação de Carro de Som)

No período de 12 a 24 de outubro, o Instituto Ideias foi responsável pela contratação de antenistas e de empresa para realizar a veiculação de carro de som, bem como toda a

operacionalização da Ação Porta a Porta, que teve por objetivo realizar a instalação dos Kits de conversor e antena digital nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Serra.

As ações desenvolvidas estão apresentadas no quadro abaixo:

DATA	EVENTO	BAIRRO	MUNICÍPIO	HORÁRIO VEICULAÇÃO CARRO DE SOM	ANTENISTAS	Nº DE INSTALAÇÕES REALIZADAS	OBSERVAÇÃO
12/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Barramares	Vila Velha	09h às 13h e 14h às 18h	Jean Daniel	5	Não solicitada veiculação de carro de som.
12/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Castelo Branco	Cariacica	09h às 13h e 14h às 18h	William Selvo	5	Não solicitada veiculação de carro de som.
12/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Feu Rosa	Serra	09h às 13h e 14h às 18h	Almir Romero	6	Não solicitada veiculação de carro de som.
13/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Ulisses Guimarães	Vila Velha	09h às 13h e 14h às 18h	Jean Daniel	8	
13/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Jardim Botânico	Cariacica	09h às 13h e 14h às 18h	William Selvo	5	
13/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Vila Nova de Colares	Serra	09h às 13h e 14h às 18h	Almir Romero	15	
14/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Aribiri	Vila Velha	09h às 13h e 14h às 18h	Jean Daniel	6	
14/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Nova Rosa da Penha I	Cariacica	09h às 13h e 14h às 18h	William Selvo	8	
14/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Novo Horizonte	Serra	09h às 13h e 14h às 18h	Almir Romero	12	
15/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Jabaeté	Vila Velha	09h às 13h e 14h às 18h	Jean Daniel	12	
15/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Nova Rosa da Penha II	Cariacica	09h às 13h e 14h às 18h	William Selvo	6	
15/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Jardim Carapina	Serra	09h às 13h e 14h às 18h	Almir Romero	9	
16/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Santa Rita	Vila Velha	09h às 13h e 14h às 18h	Jean Daniel	2	
16/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Rio Marinho	Cariacica	09h às 13h e 14h às 18h	William Selvo	0	Antenistas foram a campo, mas por questões de segurança a ação foi cancelada.
16/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Planalto Serrano	Serra	09h às 13h e 14h às 18h	Almir Romero	6	
17/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Jardim Guaranhuns	Vila Velha	09h às 13h e 14h às 18h	Jean Daniel	8	

17/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Campo Verde	Cariacica	09h às 13h e 14h às 18h	William Selvo	5	
17/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	José de Anchieta	Serra	09h às 13h e 14h às 18h	Almir Romero	15	
18/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	João Goulart	Vila Velha	09h às 13h e 14h às 18h	Jean Daniel	7	
18/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Flexal II / Rio Marinho	Cariacica	09h às 13h e 14h às 18h	William Selvo	4	O local da ação Porta a Porta foi alterado para Rio Marinho/Cariacica. Mantida a veiculação de carro de som em Flexal II.
18/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Bairro das Laranjeiras	Serra	09h às 13h e 14h às 18h	Almir Romero	11	
19/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Vila Garrido	Vila Velha	09h às 13h e 14h às 18h	Jean Daniel	9	
19/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Nova Carapina	Serra	09h às 13h e 14h às 18h	Almir Romero	13	
19/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Central Carapina	Serra	09h às 13h e 14h às 18h	William Selvo	4	
20/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Morada da Barra	Vila Velha	09h às 13h e 14h às 18h	Jean Daniel	8	
20/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Vale Encantado e Jd do Vale/Vila Velha	Vila Velha	09h às 13h e 14h às 18h	William Selvo	1	
20/out	Porta a Porta - Antenista + Carro de Som	Jardim Tropical	Serra	09h às 13h e 14h às 18h	Almir Romero	10	Realizada 01 instalação em Laranjeiras Velha a pedido da Seja Digital.
TOTAL						200	

9.4.4 Veiculação de Carro de Som

A partir do dia 02 de outubro passou a ser responsabilidade do Instituto Ideias a contratação de empresa para realizar a veiculação de carro de som, visando a mobilização para as ações de agendamento nos municípios abrangidos pelo Projeto.

Segue abaixo quadro demonstrativo:

DATA/HORÁRIO DA VEICULAÇÃO	BAIRRO	BRIEFING PARA SPOT
03/10 - 5h tarde 04/10 - 4h manhã	Universal - Viana	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória.</p> <p>É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV.</p> <p>Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor.</p> <p>Saiba se você tem direito.</p> <p>Nesta quarta-feira, dia 04 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital.</p> <p>Vá até Pracinha de Universal, em frente a Unidade de Saúde, das 9h às 16h.</p> <p>Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF.</p> <p>Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV.</p> <p>Sejadigital.com.br.</p>
04/10 - 4h manhã 04/10 - 4h tarde	Campo Verde - Cariacica	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória.</p> <p>É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital.</p> <p>A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!!</p> <p>Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital.</p> <p>Saiba se a sua família é uma delas.</p> <p>Vá até o CRAS mas próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS.</p> <p>Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV.</p> <p>Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!!</p> <p>Seja Digital.</p>
04/10 - 4h manhã 04/10 - 4h tarde	Novo Horizonte - Serra	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória.</p> <p>É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital.</p> <p>A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!!</p> <p>Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital.</p> <p>Saiba se a sua família é uma delas.</p> <p>Vá até o CRAS mas próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS.</p> <p>Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV.</p> <p>Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!!</p> <p>Seja Digital.</p>
04/10 - 4h manhã 04/10 - 4h tarde 05/10 - 4h manhã	Carapina Grande - Serra	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória.</p> <p>É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV.</p> <p>Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor.</p> <p>Saiba se você tem direito.</p> <p>Nesta quinta-feira, dia 05 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital.</p> <p>Vá até a Sede da Associação de Moradores, na Rádio Patrulha da Polícia Militar, próximo ao supermercado Modelo, das 9h às 16h.</p> <p>Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF.</p> <p>Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV.</p> <p>Sejadigital.com.br.</p>

<p>04/10 - 4h manhã 04/10 - 4h tarde 05/10 - 4h manhã</p>	<p>São Gabriel - Guarapari</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta quinta-feira, dia 05 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a Escola Martha Dalla, em São Gabriel, das 9h às 16h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
<p>05/10 - 4h manhã 05/10 - 4h tarde</p>	<p>Jardim Botânico - Cariacica</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mas próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital.</p>
<p>05/10 - 4h manhã 05/10 - 4h tarde 06/10 - 4h manhã</p>	<p>Divinópolis - Serra</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta sexta-feira, dia 06 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a EMEF de Divinópolis, das 9h às 16h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
<p>05/10 - 4h manhã 05/10 - 4h tarde 06/10 - 4h manhã</p>	<p>Nova Bethânia – Viana⁹</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta sexta-feira, dia 06 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá em frente ao Posto de Saúde, das 9h às 16h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>

⁹ A veiculação do carro de som no bairro Nova Bethânia/Viana, foi cancelada pela Seja Digital no dia 04/10/2017. Como o cancelamento ocorreu com menos de 48 horas da data de início da veiculação, a empresa que realiza a prestação do serviço cobrou o valor referente a uma diária e uma gravação do Spot.

<p>06/10 - 4h manhã 06/10 - 4h tarde</p>	<p>Castelo Branco - Cariacica</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mas próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital.</p>
<p>09/10 - 18h às 21h 10/10 - 18h às 21h</p>	<p>Dentro do condomínio Atlântica Ville - Jardim Camburi</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>09/10 - 13h às 17h 10/10 - 8h às 15h</p>	<p>Serra Sede</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta terça-feira, dia 10 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até Praça de Serra Sede, das 9h às 16h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
<p>10/10 - 4h manhã 10/10 - 4h tarde 11/10 - 4h manhã</p>	<p>Nossa Senhora de Fátima - Guarapari</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a Creche Solzinho, na Rua Dezoito, número 20, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, das 9h às 16h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>

<p>11/10 - 15h às 18h</p>	<p>Vista da Penha – Vila Velha</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>11/10 - 4h manhã 11/10 - 4h tarde</p>	<p>Santa Mônica/Cocal e Boa Vista – Vila Velha</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>13/10 - 4h manhã 13/10 - 4h tarde</p>	<p>Ibes/Santos Dumont e Brisamar – Vila Velha</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>14/10 - 4h manhã 14/10 - 4h tarde</p>	<p>Ilha dos Bentos/Vila Nova e Jardim Asteca – Vila Velha</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>16/10 - 4h manhã 16/10 - 4h tarde</p>	<p>Novo Mexico/Jd Guaranhus/Vila Guaranhus e Araças – Vila Velha</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>

<p>17/10 - 4h manhã 17/10 - 4h tarde</p>	<p>Chacara do Conde/Argolas e Paul – Vila Velha</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>11/10 - 4h manhã 11/10 - 4h tarde</p>	<p>Coroado/Independência e Kubsticheck - Guarapari</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>13/10 - 4h manhã 13/10 - 4h tarde</p>	<p>Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora de Fátima - Guarapari</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>16/10 - 4h manhã 16/10 - 4h tarde</p>	<p>Caxias do Sul/ Viana Centro e Soteco - Viana</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>17/10 - 4h manhã 17/10 - 4h tarde</p>	<p>Canaa e Primavera - Viana</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>

<p>18/10 - 4h manhã 18/10 - 4h tarde</p>	<p>Arlindo Angelo Villaski/Vila Bethania e Eldourado - Viana</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>16/10 - 4h manhã 16/10 - 4h tarde</p>	<p>Vila Nova de Colares - Serra</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>17/10 - 4h manhã 17/10 - 4h tarde</p>	<p>Serra Sede</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>18/10 - 4h manhã 18/10 - 4h tarde</p>	<p>Planalto Serrano - Serra</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>20/10 - 4h manhã 20/10 - 4h tarde</p>	<p>Vista da Serra I e II - Serra</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>

<p>23/10 - 4h manhã 23/10 - 4h tarde</p>	<p>Jardim Carapina - Serra</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>24/10 - 4h manhã 24/10 - 4h tarde</p>	<p>Central Carapina - Serra</p>	<p>A partir de 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital. A sua TV já está preparada? Não? Então corre!!! Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com conversor e antena para a TV Digital. Saiba se a sua família é uma delas. Vá até o CRAS mais próximo do seu bairro ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Dia 25 está chegando!! Ninguém merece ficar sem ver TV!!! Seja Digital!</p>
<p>10/10 - 4h tarde 11/10 - 4h manhã</p>	<p>Taquara II - Serra</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a EMEF Manoel Lopes, das 18h às 20h30. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
<p>11/10 - 4h tarde 12/10 - 4h manhã</p>	<p>Taquara I - Serra</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a Praça do Bairro Taquara I, das 9h às 16h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
<p>11/10 - 4h tarde 12/10 - 4h manhã</p>	<p>Piranema - Cariacica</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a quadra poliesportiva de Piranema, das 9h às 16h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>

<p>11/10 - 4h tarde 12/10 - 4h manhã</p>	<p>Forte São João - Vitória</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a Rua General Calmon, no Bairro Forte São João – Em frente ao telecentro, das 13h às 17h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
<p>12/10 - 4h tarde 13/10 - 4h manhã</p>	<p>Rio Marinho – Vila Velha</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta sexta-feira, dia 13 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até o Centro Comunitário de Rio Marinho, na Rua Santa Julia, número 140 –, das 9h às 16h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
<p>12/10 - 13h às 18h 13/10 - 8h às 14h</p>	<p>Cidade Pomar - Serra</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta sexta-feira, dia 13 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a EMEF de Cidade Pomar, das 9h às 16h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
<p>13/10 - 4h tarde 14/10 - 4h manhã</p>	<p>Carapina Grande - Serra</p>	<p>CARAPINA GRANDE Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Neste sábado, dia 14 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a Pracinha do ponto final do Carapina Grande, das 9h às 16h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>

<p>13/10 - 4h tarde 14/10 - 4h manhã</p>	<p>Padre Gabriel – Cariacica¹⁰</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Neste sábado, dia 14 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até Padre Gabriel, em frente ao CRAS, das 9h às 15h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
<p>13/10 - 4h tarde 14/10 - 4h manhã</p>	<p>Romão - Vitória</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Neste sábado, dia 14 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até à quadra do Bairro, das 9h às 15h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
<p>13/10 - 4h tarde 14/10 - 4h manhã</p>	<p>Cobilândia – Vila Velha</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Neste sábado, dia 14 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a Associação Comunitária de Cobilândia, na Rua Amanary, atrás do Sesi de Cobilândia, das 9h às 15h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
<p>13/10 - 4h manhã 13/10 - 4h tarde 14/10 - 4h manhã</p>	<p>Nova Brasília - Cariacica</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Neste sábado, dia 14 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a Pracinha do Ponto final de Nova Brasília, das 9h às 15h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>

¹⁰ A veiculação do carro de som no bairro Padre Gabriel/Cariacica, foi cancelada pela Seja Digital no dia 11/10/2017, por questões de segurança no bairro. Como o Spot a ser veiculado já havia sido gravado, a empresa que realiza a prestação do serviço cobrou o valor referente a esta gravação.

<p>16/10 - 4h tarde 17/10 - 4h manhã</p>	<p>Nova Almeida - Fundão</p>	<p>Em 25 de outubro o sinal analógico de TV será desligado na região da Grande Vitória. É isso mesmo, em breve só vai existir o sinal digital de TV. Muitas famílias poderão receber um kit gratuito com antena digital e conversor. Saiba se você tem direito. Nesta terça-feira, dia 17 de outubro, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o sinal digital. Vá até a Fundação Metodista de Nova Almeida, das 9h às 16h. Não esqueça de levar o número do seu NIS ou CPF. Aproveite esta oportunidade e prepare agora mesmo a sua TV. Sejadigital.com.br.</p>
--	------------------------------	---

9.4.5 Locação de Van

Foram solicitadas 04 (quatro) locações de van, conforme discriminado no quadro abaixo:

Data	Local (Origem - Destino)	Quantidade	Valor	Total
02/09/2017	SENAI/Vitória - Terra Vermelha/Vila Velha	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
23/09/2017	SENAI/Vitória - Vale Encantado/Vila Velha	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
30/09/2017	SENAI/Anchieta - Santa Monica/Guarapari	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
07/09/2017	SENAI/Vitória - Barramares/Vila Velha	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total		4		R\$ 2.260,00

9.4.6 Fornecimento de Coffee Break

Foram solicitados durante a execução do projeto 03 (três) coffee breaks, conforme discriminado no quadro abaixo:

Data	Local	Quantidade	Valor	Total
14/07/2017	Santa Mônica/Guarapari	200	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
10/08/2017	Terra Vermelha/Vila Velha	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
20/09/2017	Centro/Viana	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
Total		350		R\$ 3.500,00

9.4.7 Fornecimento de Kit Lanche

Foram realizadas 07 (sete) ações, sendo 06 (seis) mutirões de instalação do kit conversor digital nos bairros e 01 (uma) ação de agendamento, onde foram solicitados Kit Lanche para os participantes:

Data	Local	Quantidade	Valor	Total
02/09/2017	Terra Vermelha/Vila Velha	18	R\$ 7,00	R\$ 126,00
02/09/2017	Central Carapina/Serra	32	R\$ 7,00	R\$ 224,00
09/09/2017	Planalto Serrano/Serra	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
16/09/2017	Santa Rita/Vila Velha	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
30/09/2017	Santa Mônica/Guarapari	52	R\$ 7,00	R\$ 364,00
07/10/2017	Barramares/Vila Velha	54	R\$ 7,00	R\$ 378,00
14/10/2017	Carapina Grande/Serra	31	R\$ 7,00	R\$ 217,00
Total		237		R\$ 1.659,00

9.5 GESTÃO E MONITORAMENTO

O IDEIAS prima pelas melhores práticas de gerenciamento de projetos e o mesmo será baseado na metodologia difundidas pelo PMI (Project Management Institute) no que se refere ao seu planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, visando essencialmente à qualidade dos produtos finais a serem entregues, bem como a melhoria contínua dos processos envolvidos no projeto.

Visando alinhamento constante entre contratante e contratada foram realizadas 05 (cinco) reuniões nos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2017. Estas reuniões ocorreram mensalmente até o fim do projeto.

No dia 29 de agosto foram realizadas duas ações de filmagem nos PDAs de Jacaraípe/Serra e Continental/Vitória. Dando continuidade ao projeto, foram realizadas mais três ações de filmagem, sendo uma no dia 14 de outubro no Mutirão de Agendamento e Antenistas no bairro Carapina Grande/Serra e outras duas no dia 27 de outubro nos PDAs localizados nos bairros Itacibá/Cariacica e Areinha/Viana.

As imagens captadas foram posteriormente editadas para registro das atividades realizadas no projeto.

MÊS	NÚMERO REUNIÕES REALIZADAS	DATAS	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	OBJETIVO
Julho	01	03/07	Instituto Ideias	Reunião de alinhamento Coordenação e Supervisão
	01	07/07	Seja Digital e Instituto Ideias	Estabelecer estratégias para instalação dos PDAs e treinamento das equipes
Agosto	01	03/08	Seja Digital e Instituto Ideias	Avaliação de funcionamento dos PDAs, Material de Divulgação, Ações de Agendamento em Fundão e Mutirão
Setembro	01	04/09	Seja Digital e Instituto Ideias	Avaliação de funcionamento dos PDAs, Mutirão de Antenistas, Agendamentos
Outubro	01	10/10	Seja Digital e Instituto Ideias	Ações de Mobilização e Novas Estratégias

	01	16/10	Seja Digital e Instituto Ideias	Revisão de ações e saldo contratual
TOTAL	06	-	-	-

9.5.1 Emissão de Relatórios

Inicialmente foi prevista emissão de relatórios semanais sucintos e objetivos para que as metas fossem constantemente monitoradas e relatórios mensais mais completos com descrição das ações realizadas no período, porém, considerando que o número de agendamentos diários era verificado diretamente pelo sistema Seja Digital, estes dados foram repassados à equipe do Instituto Ideias.

Dessa forma, foram entregues somente os relatórios mensais à contratante, contendo o detalhamento de todas as ações e ocorrências do período bem como apresentação gráfica dos números de agendamentos.

10. FLUXO DO PROCESSO DE AGENDAMENTO

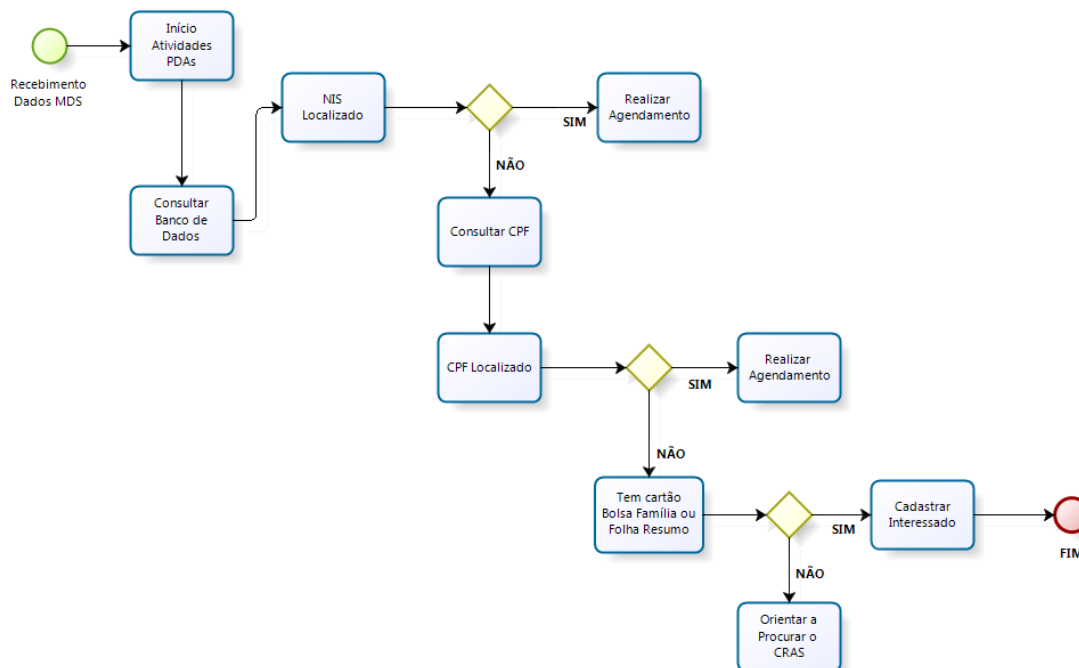


Figura 23 - Fluxograma

11. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Os gráficos a seguir referem-se aos números de agendamentos realizados nos PDAs no período de 17/07 a 31/10/2017.

11.1 AGENDAMENTOS POR MUNICÍPIO

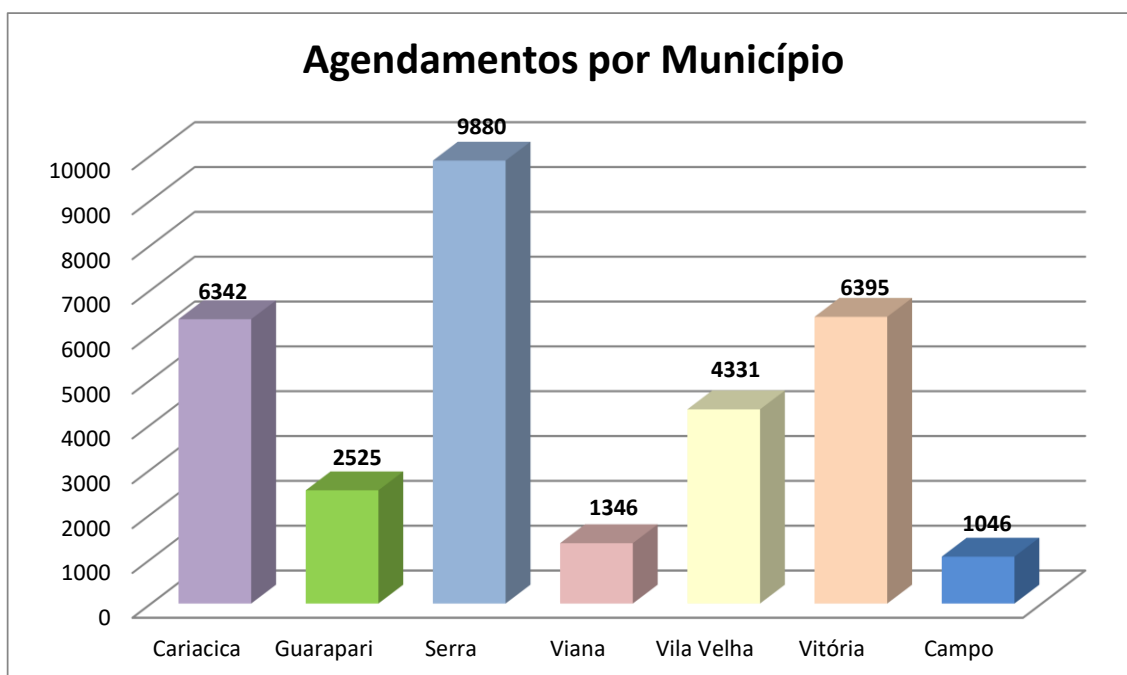


Gráfico 1 - Agendamentos por Município

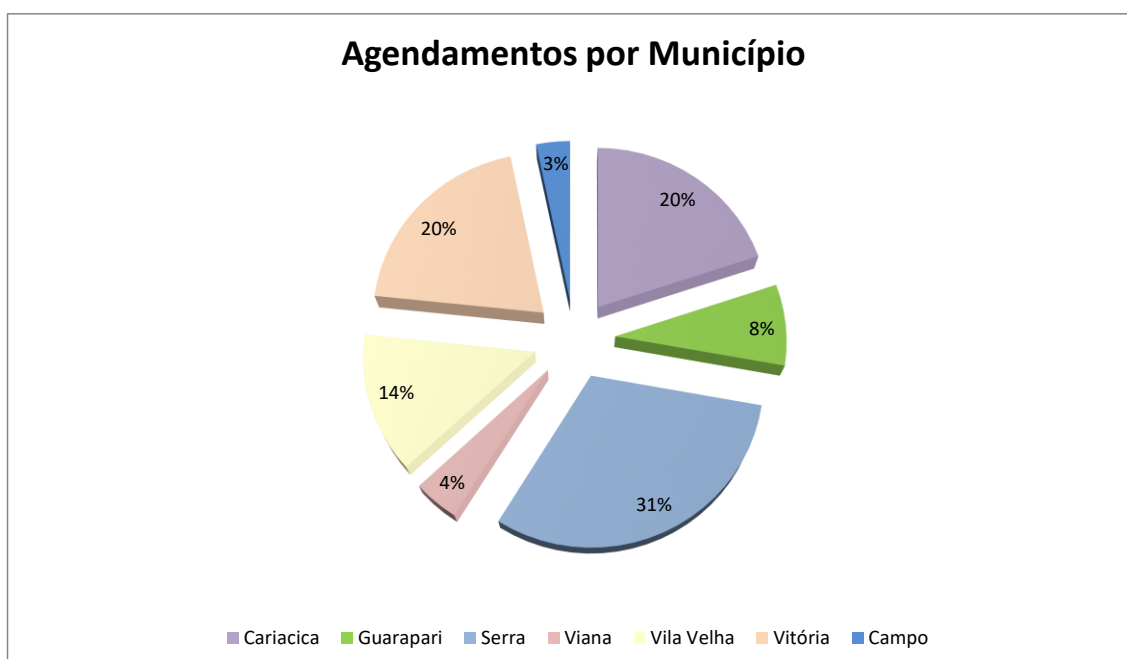


Gráfico 2 - Agendamentos por Município - Percentual

11.2 AGENDAMENTOS POR PDA

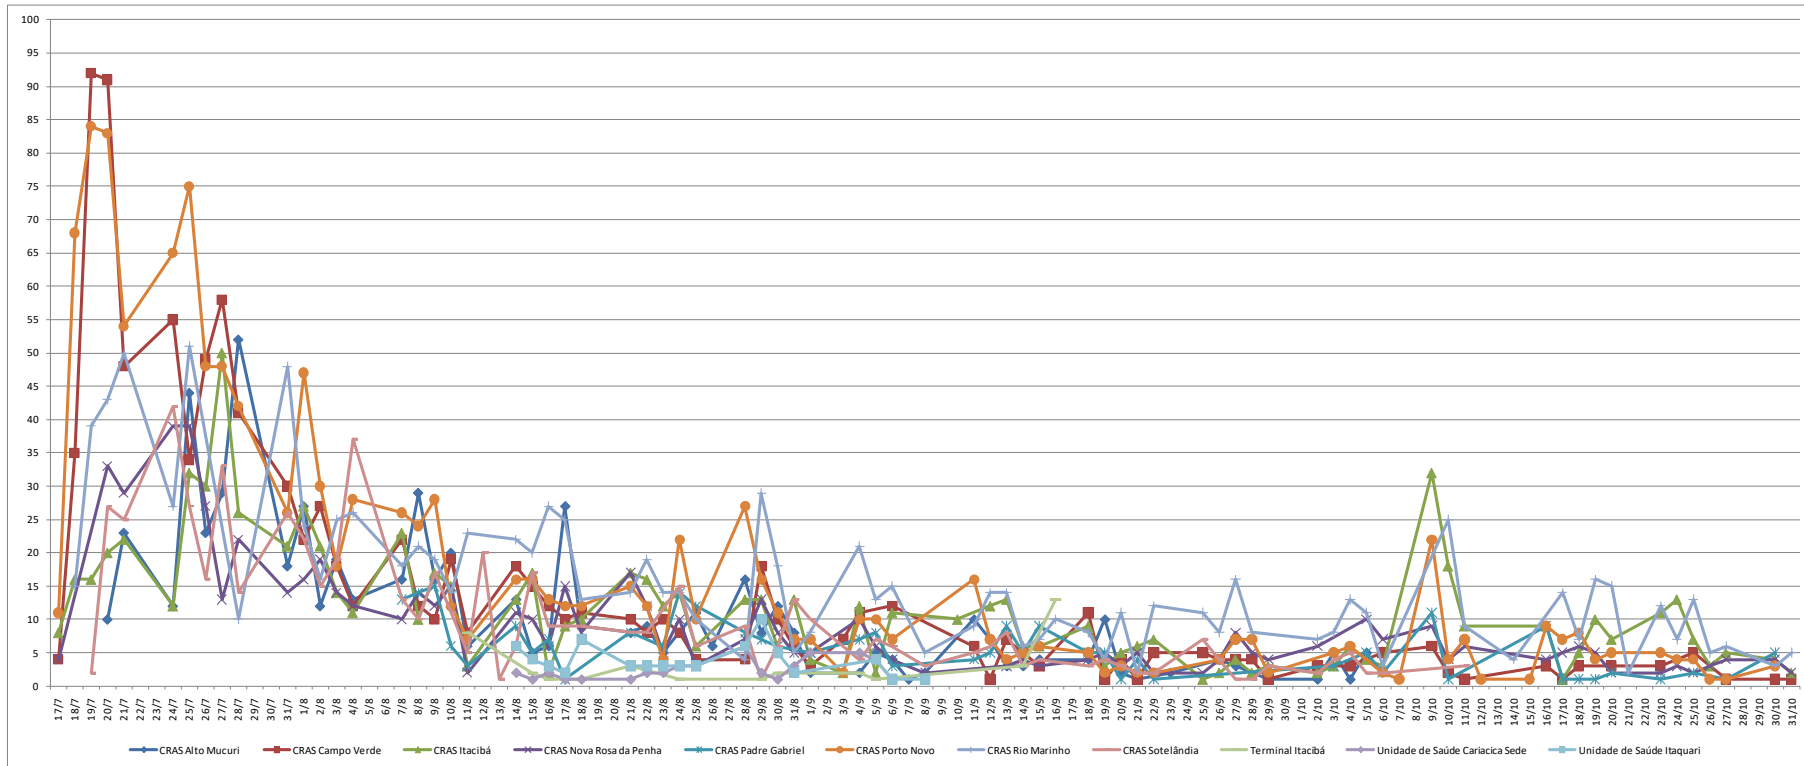


Gráfico 3 - Agendamento por PDA - Cariacica

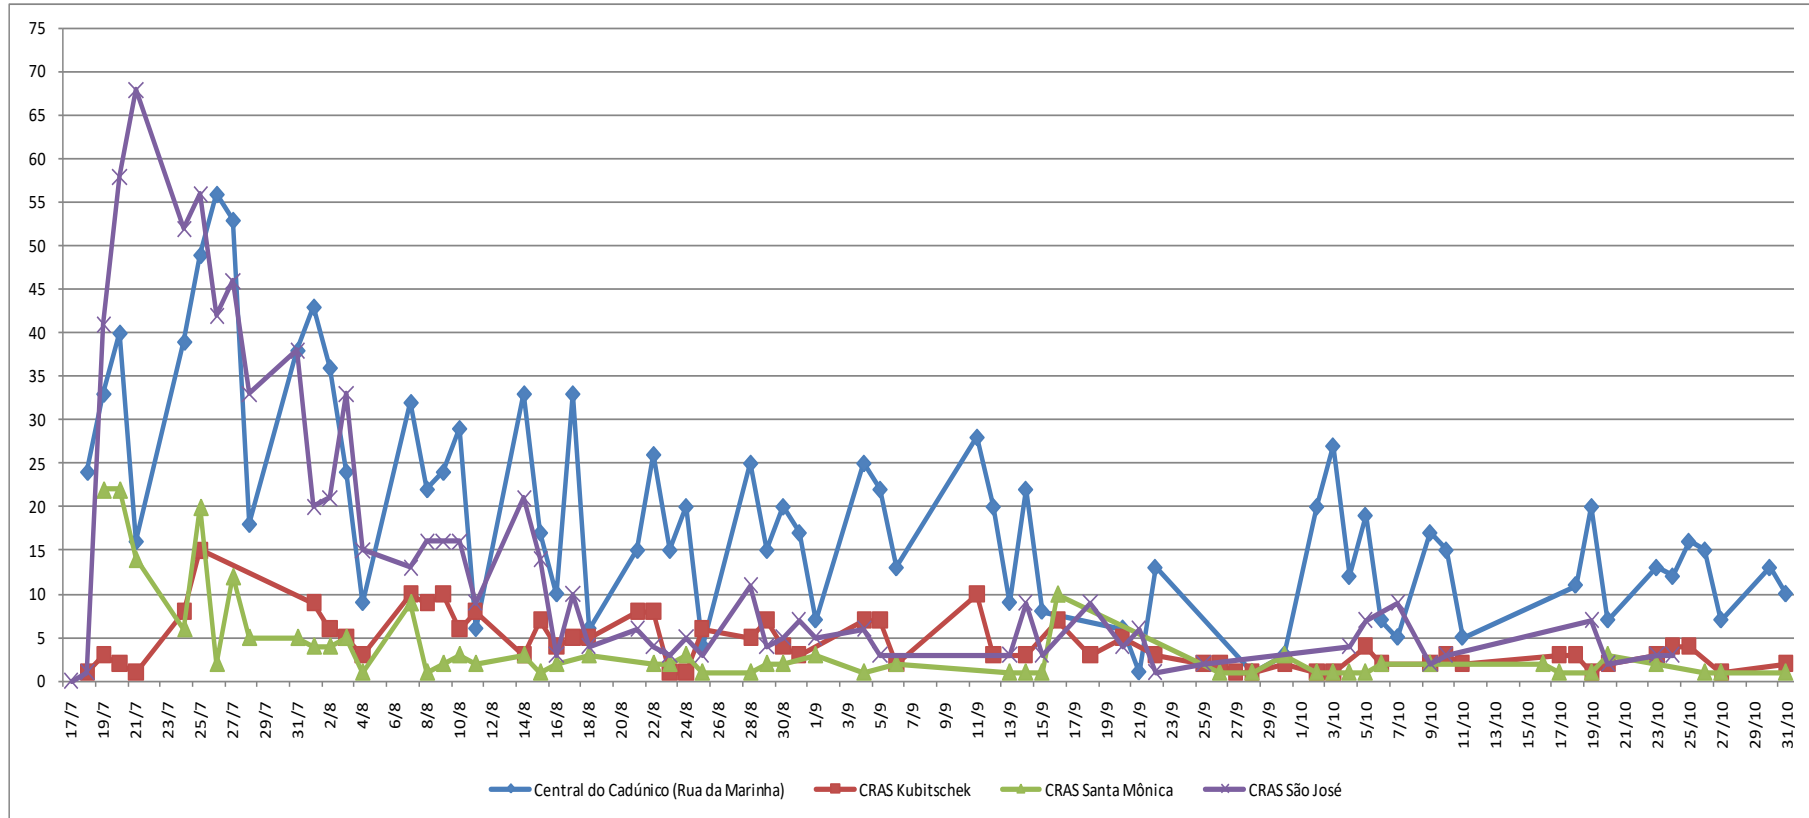


Gráfico 4 - Agendamentos por PDA - Guarapari

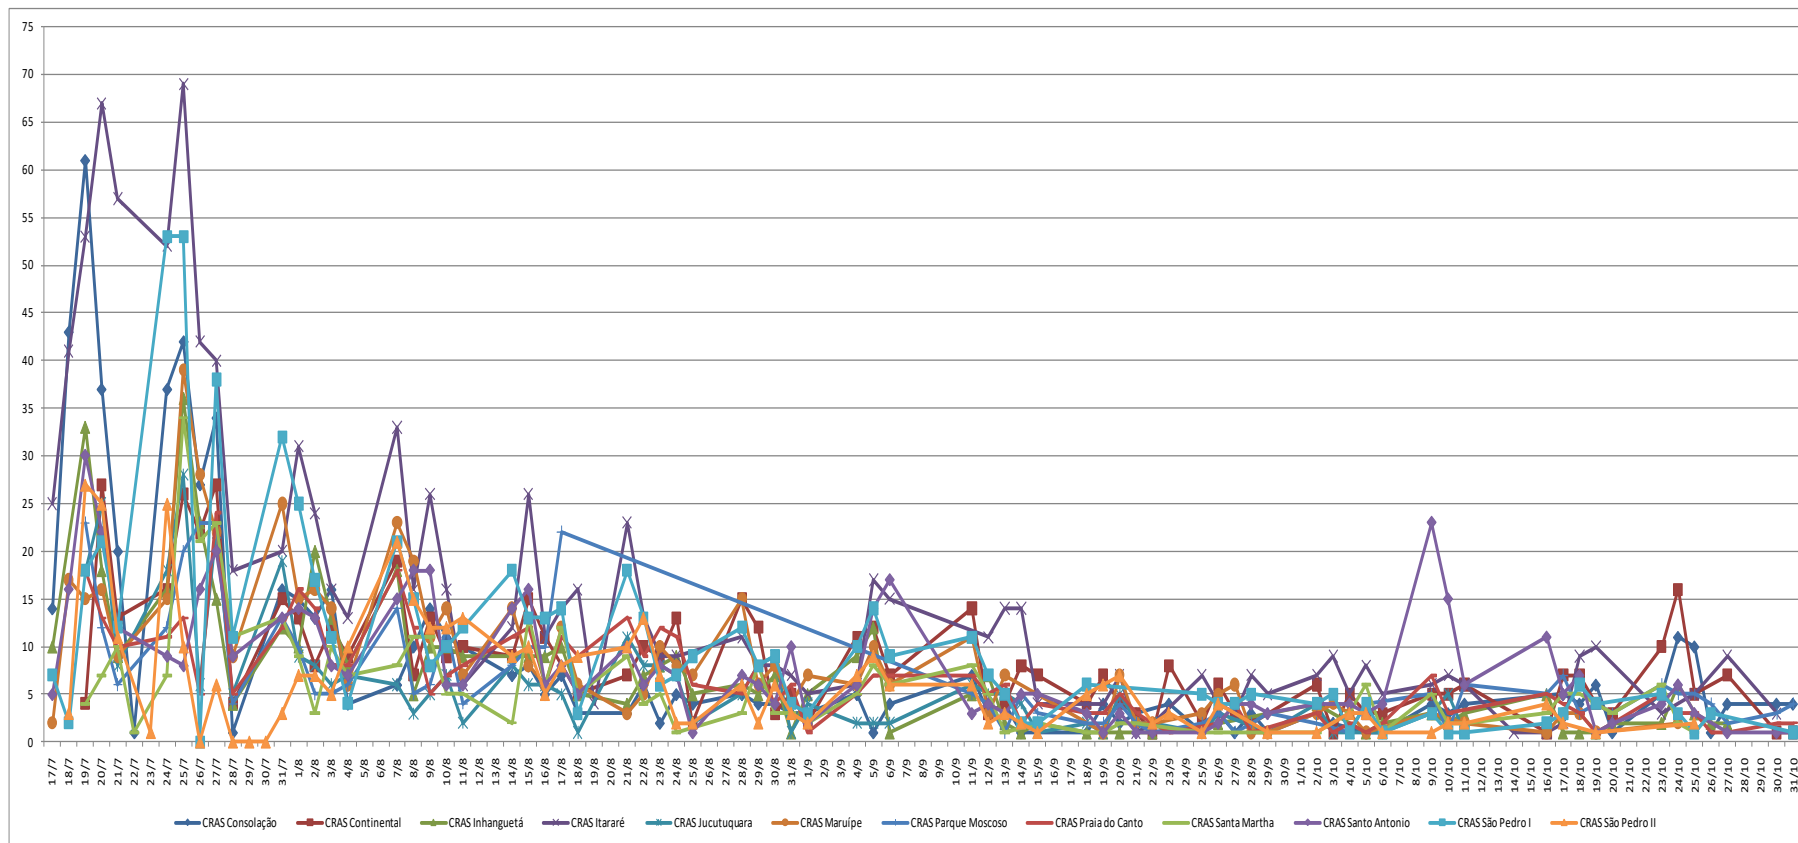


Gráfico 6 - Agendamentos por PDA – Vitória

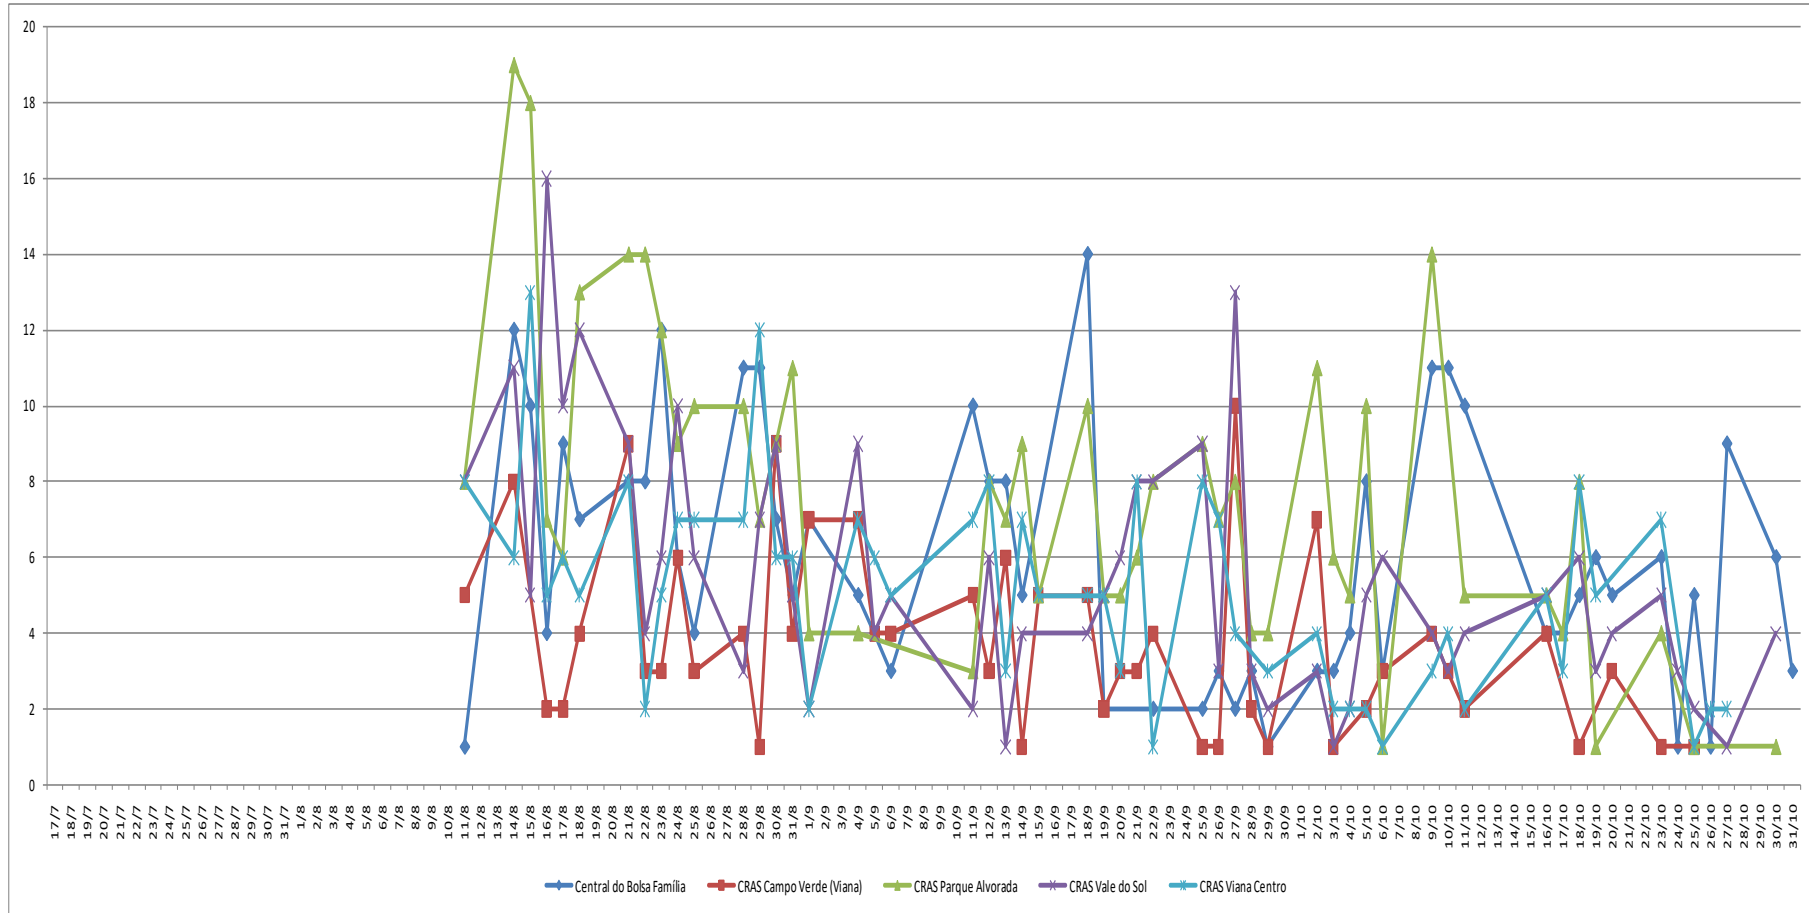


Gráfico 7 - Agendamentos por PDA – Viana

ANEXO 01

Lista Mobilizadores com Unidade de Atendimento

ANEXO 02

Prestação de Contas Financeira
